



全体平面図
(是正変更工事)



	高木植栽 (ヤシヤブシ H=0.5m以上 3,000本/ha)
	植生マット工(2) (亀甲金網併用) 植生マット工(3) (亀甲金網なし)

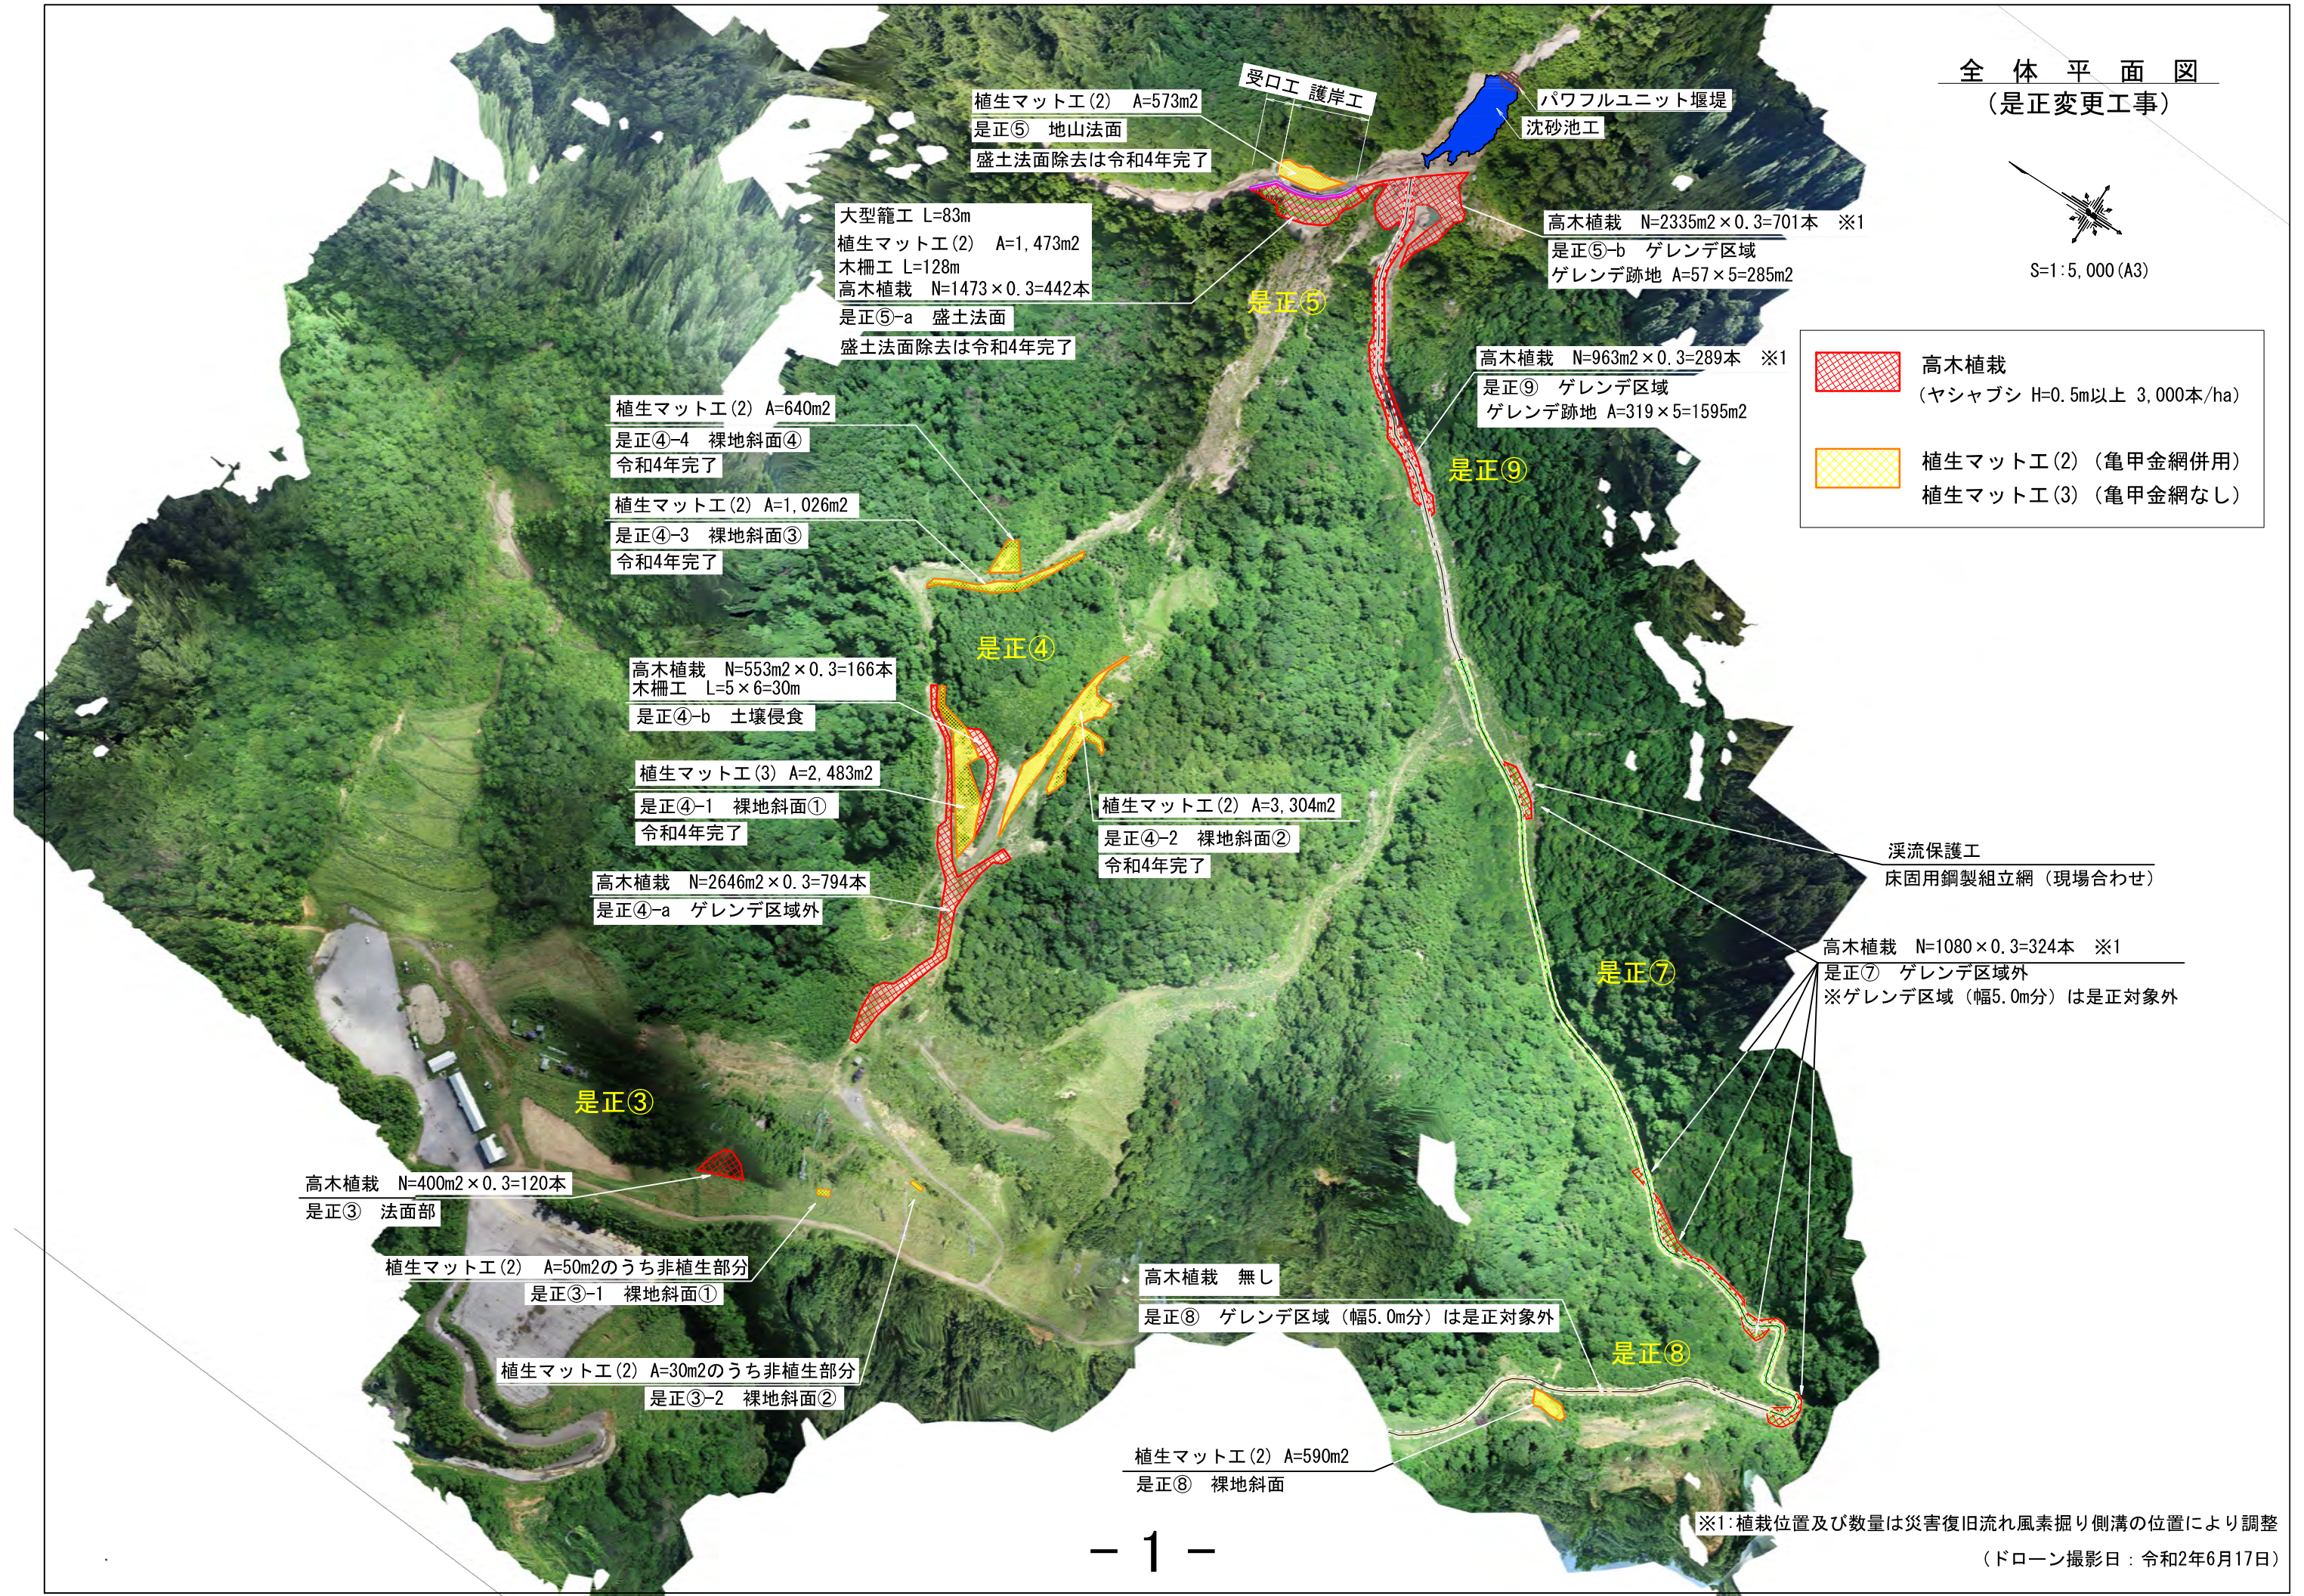

※1: 植栽位置及び数量は災害復旧流れ風素掘り側溝の位置により調整
(ドローン撮影日: 令和2年6月17日)

是 正 工 事 工 程 表 (2024/10/21現在)

■ : 変更是正計画工程

■ : 工事進捗状況

施設工事の種類	2022年(令和4年)												2023年(令和5年)												2024年(令和6年)												進捗 (%)	備考		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
準備工																																							100	
仮設工																																							100	
現地調査及び工法検討																																							100	R4.8月豪雨の影響を受け 工法再検討
スキー場進入路仮復旧工事																																							98	R4.8月豪雨後の復旧実施済 R5.7月豪雨後の仮復旧実施済
仮設道再設置																																							50	ジグザク道～是正工事箇所
床固工																																							100	材料搬入のみ、未施工 床固工①、②取りやめ
沈砂池(パワフルユニット)																																							100	パワフルユニット 10/18完了
大型かご工																																							40	大型かご工 保護工、受口工含む
溪流保護工																																							30	かごマット
法面工																																							30	植生マット
植栽工																																							10	木植栽(H=0.5m以上)
清掃・後片付け他																																							0	

是正工事写真



仮設道



沈砂池（パワフルユニット）



大型かご工
