

《旧RD最終処分場 二次対策工事 工事情報 をお知らせいたします。》

平成26年3月4日作成

工種・作業内容	施工実績											施工予定											備考		
	平成26年 2月							3月							日	月	火	水	木	金	土	日			
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日											
日付	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
廃棄物土・有害物掘削工							現場見学会(南側焼却炉等の基礎撤去後)							休 工									休 工	3月下旬完了予定	
仮設備工 仮囲い設置																									
汚染地下水拡散防止対策工																									
キャッピング工 団地側法面草刈り、防草シート設置																									3月中旬完了予定
仮設備工 周辺環境対策工																									3月中旬より計測開始
解体工事																									
溶融炉建屋解体																									
南側焼却炉ピット解体																						3月下旬完了予定			
その他解体																									


【お知らせ】
 ・3/2(日)に南側焼却炉と防火水槽の基礎砕石撤去後の現場見学会を開催したところ、7名の参加をいただきご確認をいただきました。この結果、深い部分については、特にご意見はありませんでしたので、3/5から埋戻しを開始します。ただし、ご指摘のあった、1m程の深さに存在する黒く見える部分は、性状の確認を行い結果をお知らせします。

【工事施工状況写真】平成26年2月28日撮影

写真撮影位置

① 防火水槽基礎跡

② 事務所、倉庫、廃棄物保管庫、焼却炉基礎跡など

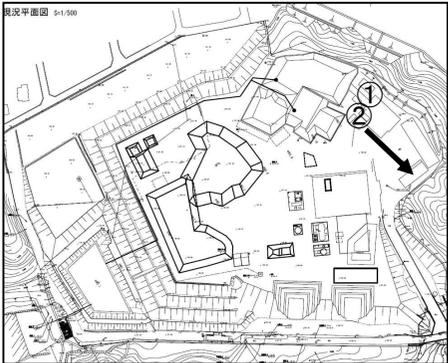

確認する部分(厚さ10cm程度)
