


An aerial photograph of a construction site. In the center, there is a large, white, rectangular building. To the left and around the building, there are several areas of blue, which appear to be excavated soil or water. The site is surrounded by green trees and a road. In the background, there are other buildings and a parking lot.

現場見学会 (A工区廃棄物土掘削)

平成28年4月23日

全体航空写真

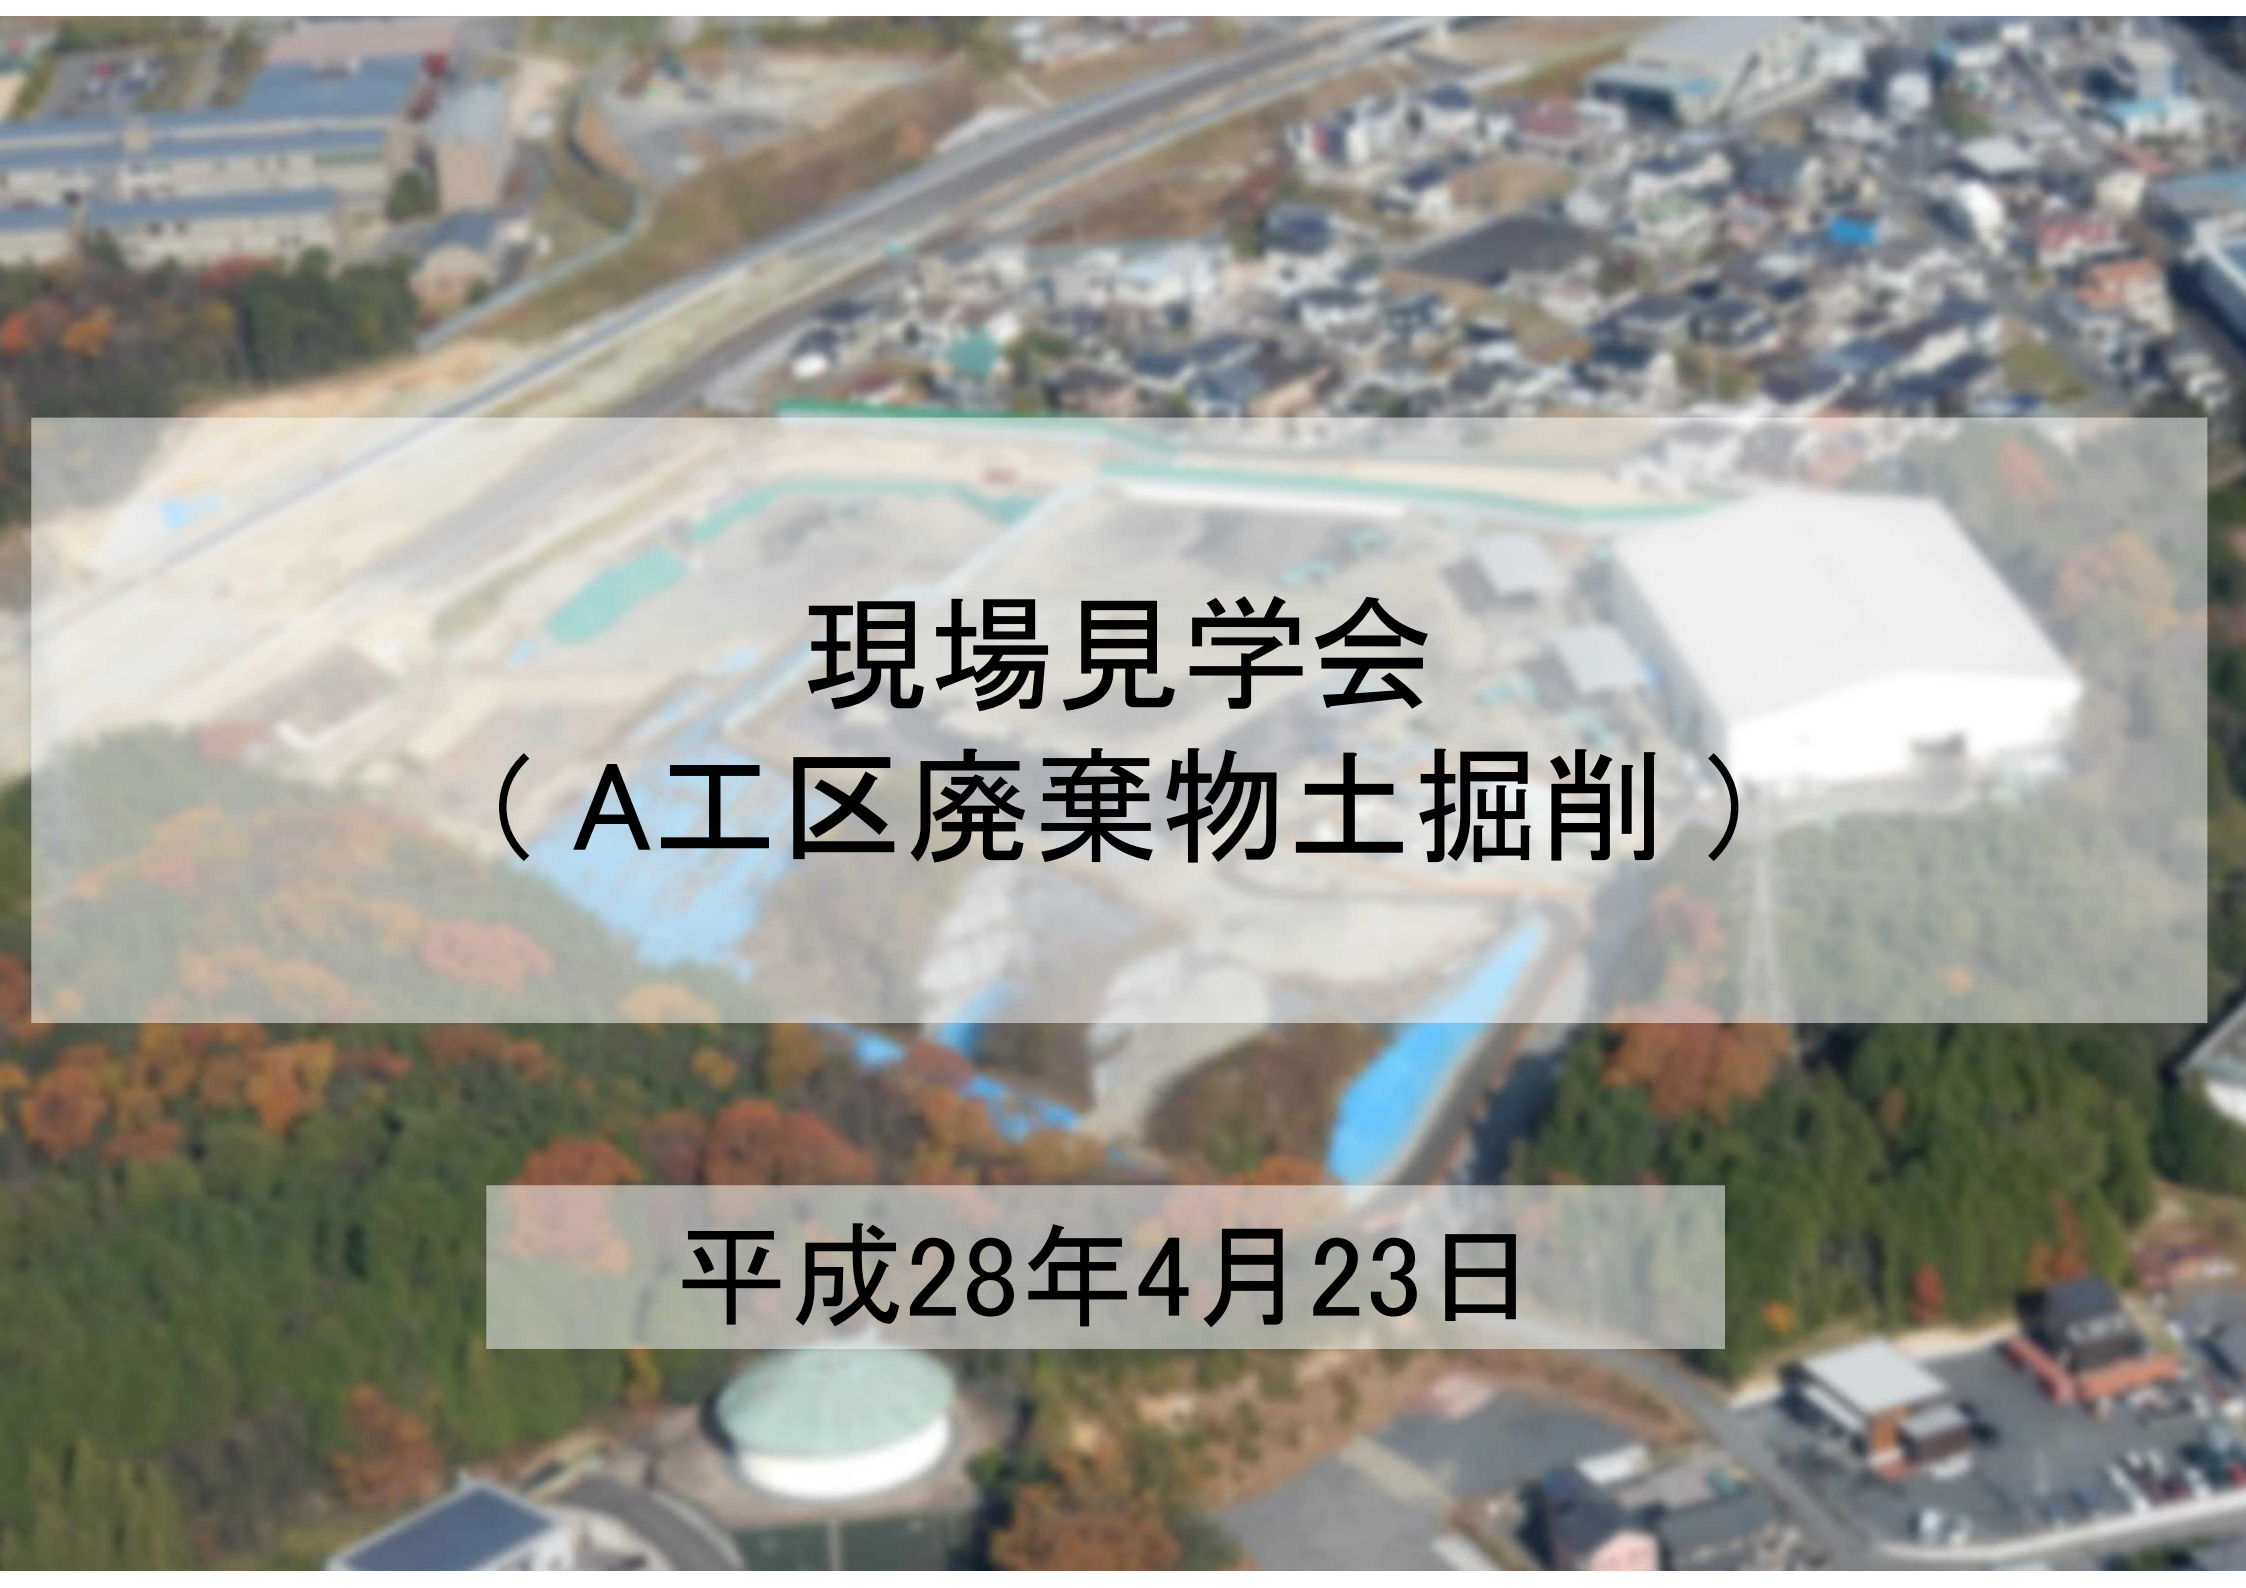

平成28年度 工程表

	工 種	単 位	年 数	月 量	4月 15 30	5月 15 31	6月 15 30	7月 15 31	8月 15 31	9月 15 30	10月 15 31	11月 15 30	12月 15 31	H29.1月 15 31	2月 15 28	3月 15 31
A工区	廃棄物土掘削工	式	1.0		矢板施工基面まで掘削		地山まで掘削									
	矢板工	式	1.0			底面止水矢板の打設										
	底面・側面遮水工	式	1.0						底面遮水工							
	浸透水貯留層工	式	1.0						浸透水貯留層工							
	選別土仮置・盛土	式	1.0						選別土埋戻し							
B工区	廃棄物土掘削工	式	1.0						矢板施工基面まで掘削					地山まで掘削		
	矢板工	式	1.0									底面止水矢板の打設				
	底面・側面遮水工	式	1.0												底面遮水工	
	浸透水貯留層工	式	1.0												浸透水貯留層工	
C工区等	廃棄物土掘削工	式	1.0			C工区等掘削			C工区等掘削							
工事全体	選別土仮置・盛土	式	1.0		選別土仮置き											
	選別処理施設	式	1.0		運転管理											

二次対策工事土工・処分実績(平成28年3月末現在)


項 目			数量	単位	2月末との差
仮置物撤去土量			21,300	m ³	±0
A工区他掘削土量			34,000	m ³	+5,700
埋戻可能物仮置土量			48,400	m ³	+5,100
埋戻再生資源			8,100	m ³	+900
場外への搬出・処分量	廃棄物	可燃物 (主に廃プラスチック類で木くず等が混じるもの)	6,000	t	+600
		不燃物(ガラス陶磁器くず、金属くず)	400	t	+100
		有害物(掘削由来:バッテリー、感染性廃棄物相当物)	4.2	t	+1.3
		有害物(場内残置物:バッテリー、変圧器等)	0.6	t	±0
	廃棄物 混じりの土	有害物(平成26年度 A-1区画他)	2,800	t	±0
		ドラム缶およびその内容物が浸潤した廃棄物土・医療系 廃棄物混じり土	34	t	+0.16
		鋭利なものを含む等、選別に適さない廃棄物土等	590	t	±0
		セメント混合廃棄物土	118	t	±0
	選別土	ふっ素が土壌環境基準を超過したもの	3,000	t	±0
	資源化	金属くず	97	t	±0

廃棄物土掘削(A工区)の概要

目的

浸透水の漏洩防止措置

- ・側面砂層から浸透水の流出を防止
- ・欠如した底面粘土層の遮水

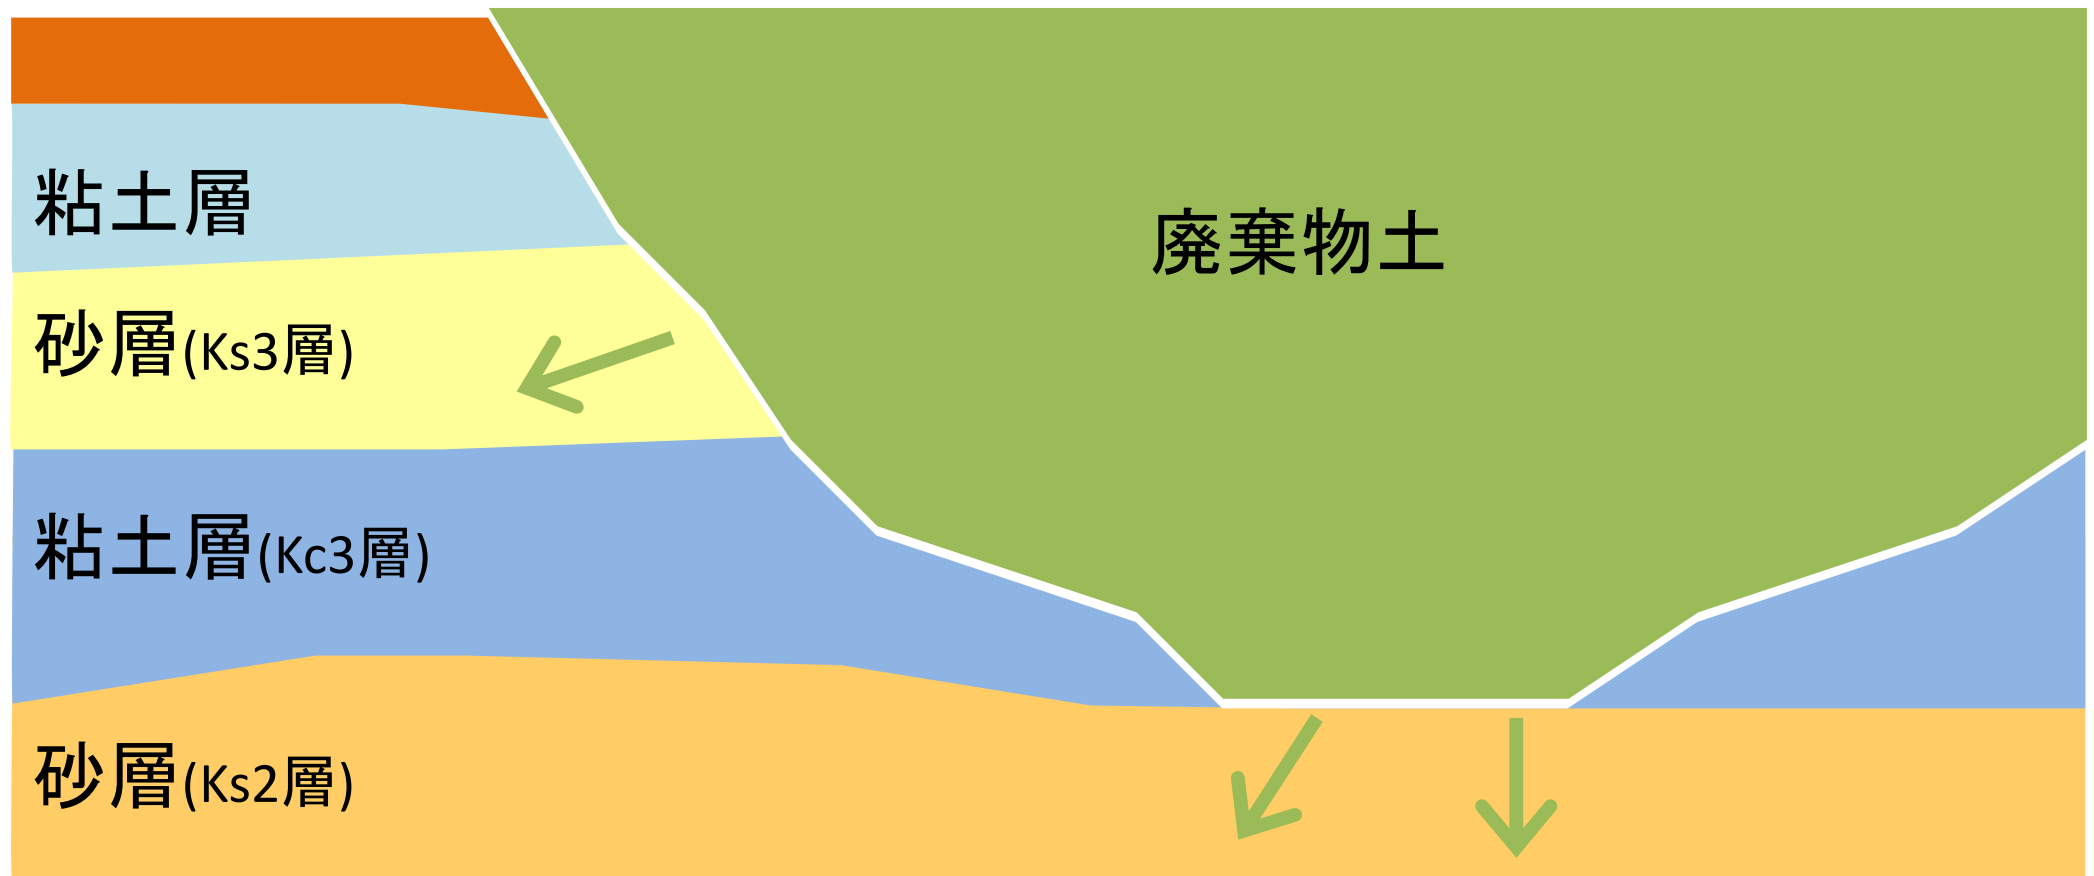


廃棄物土掘削(A工区)の概要


目的

浸透水の漏洩防止措置


- ・側面砂層から浸透水の流出を防止
- ・欠如した底面粘土層の遮水

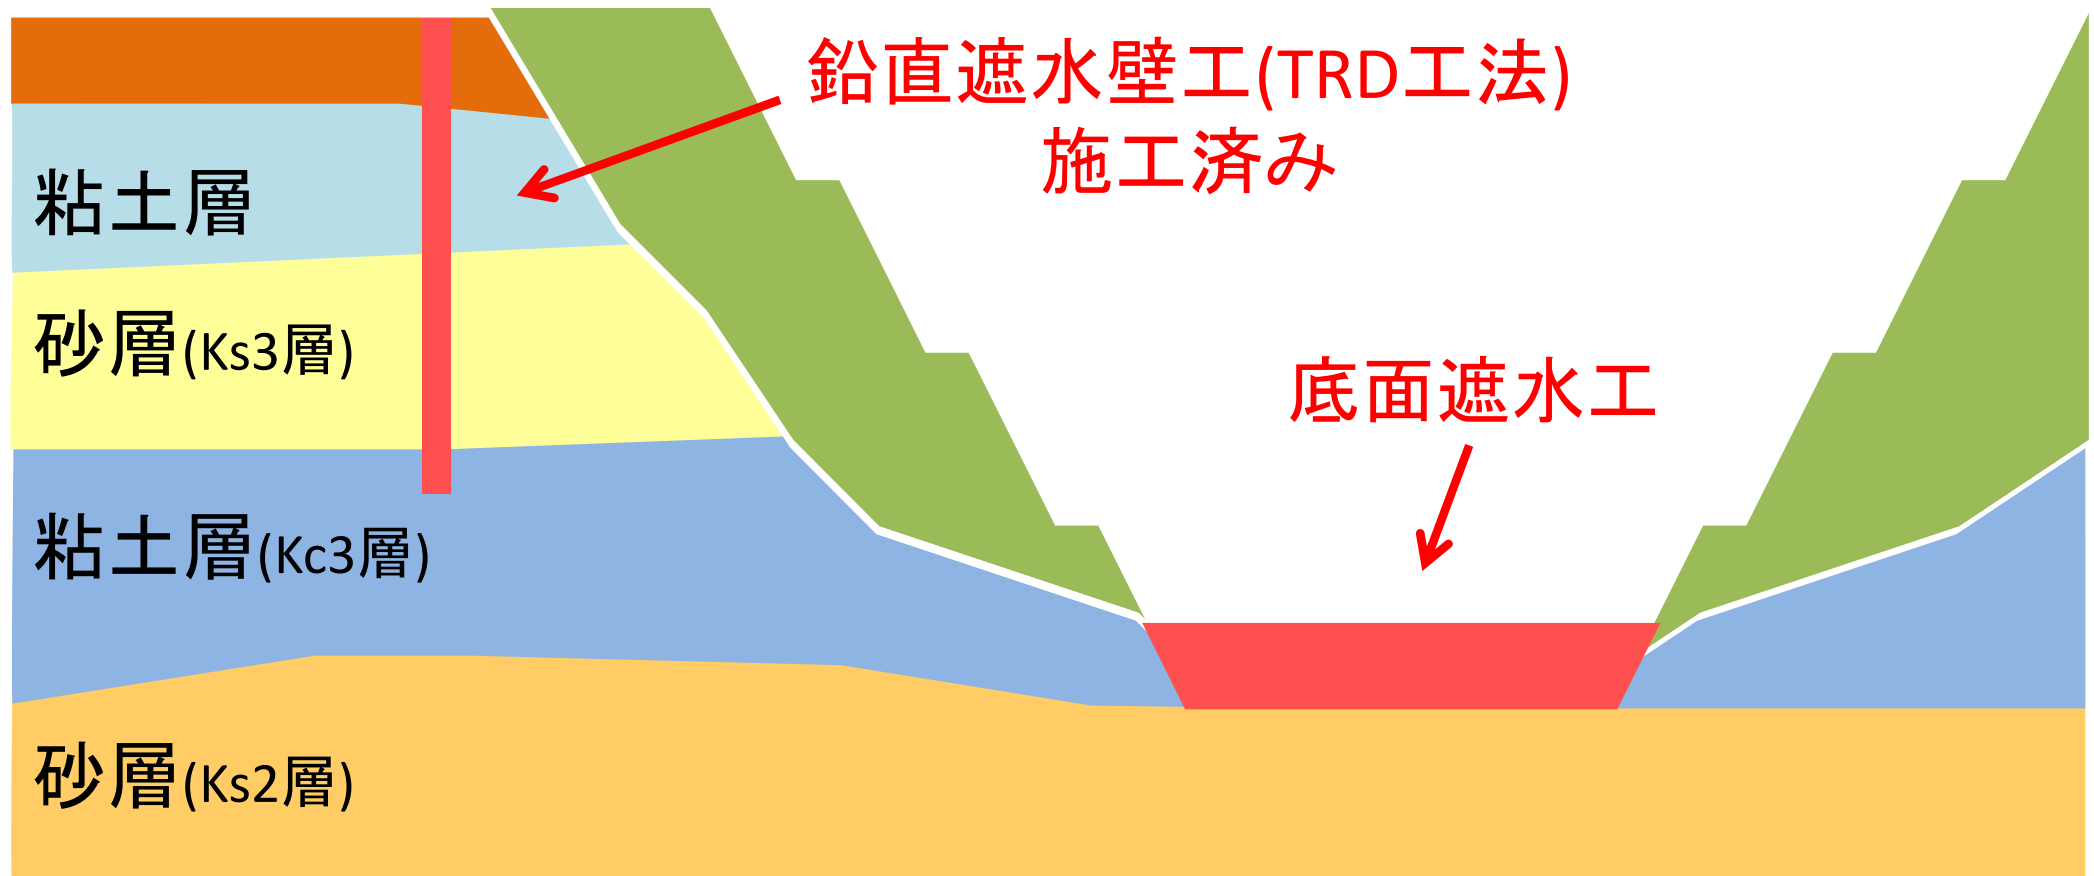

廃棄物土掘削の概要

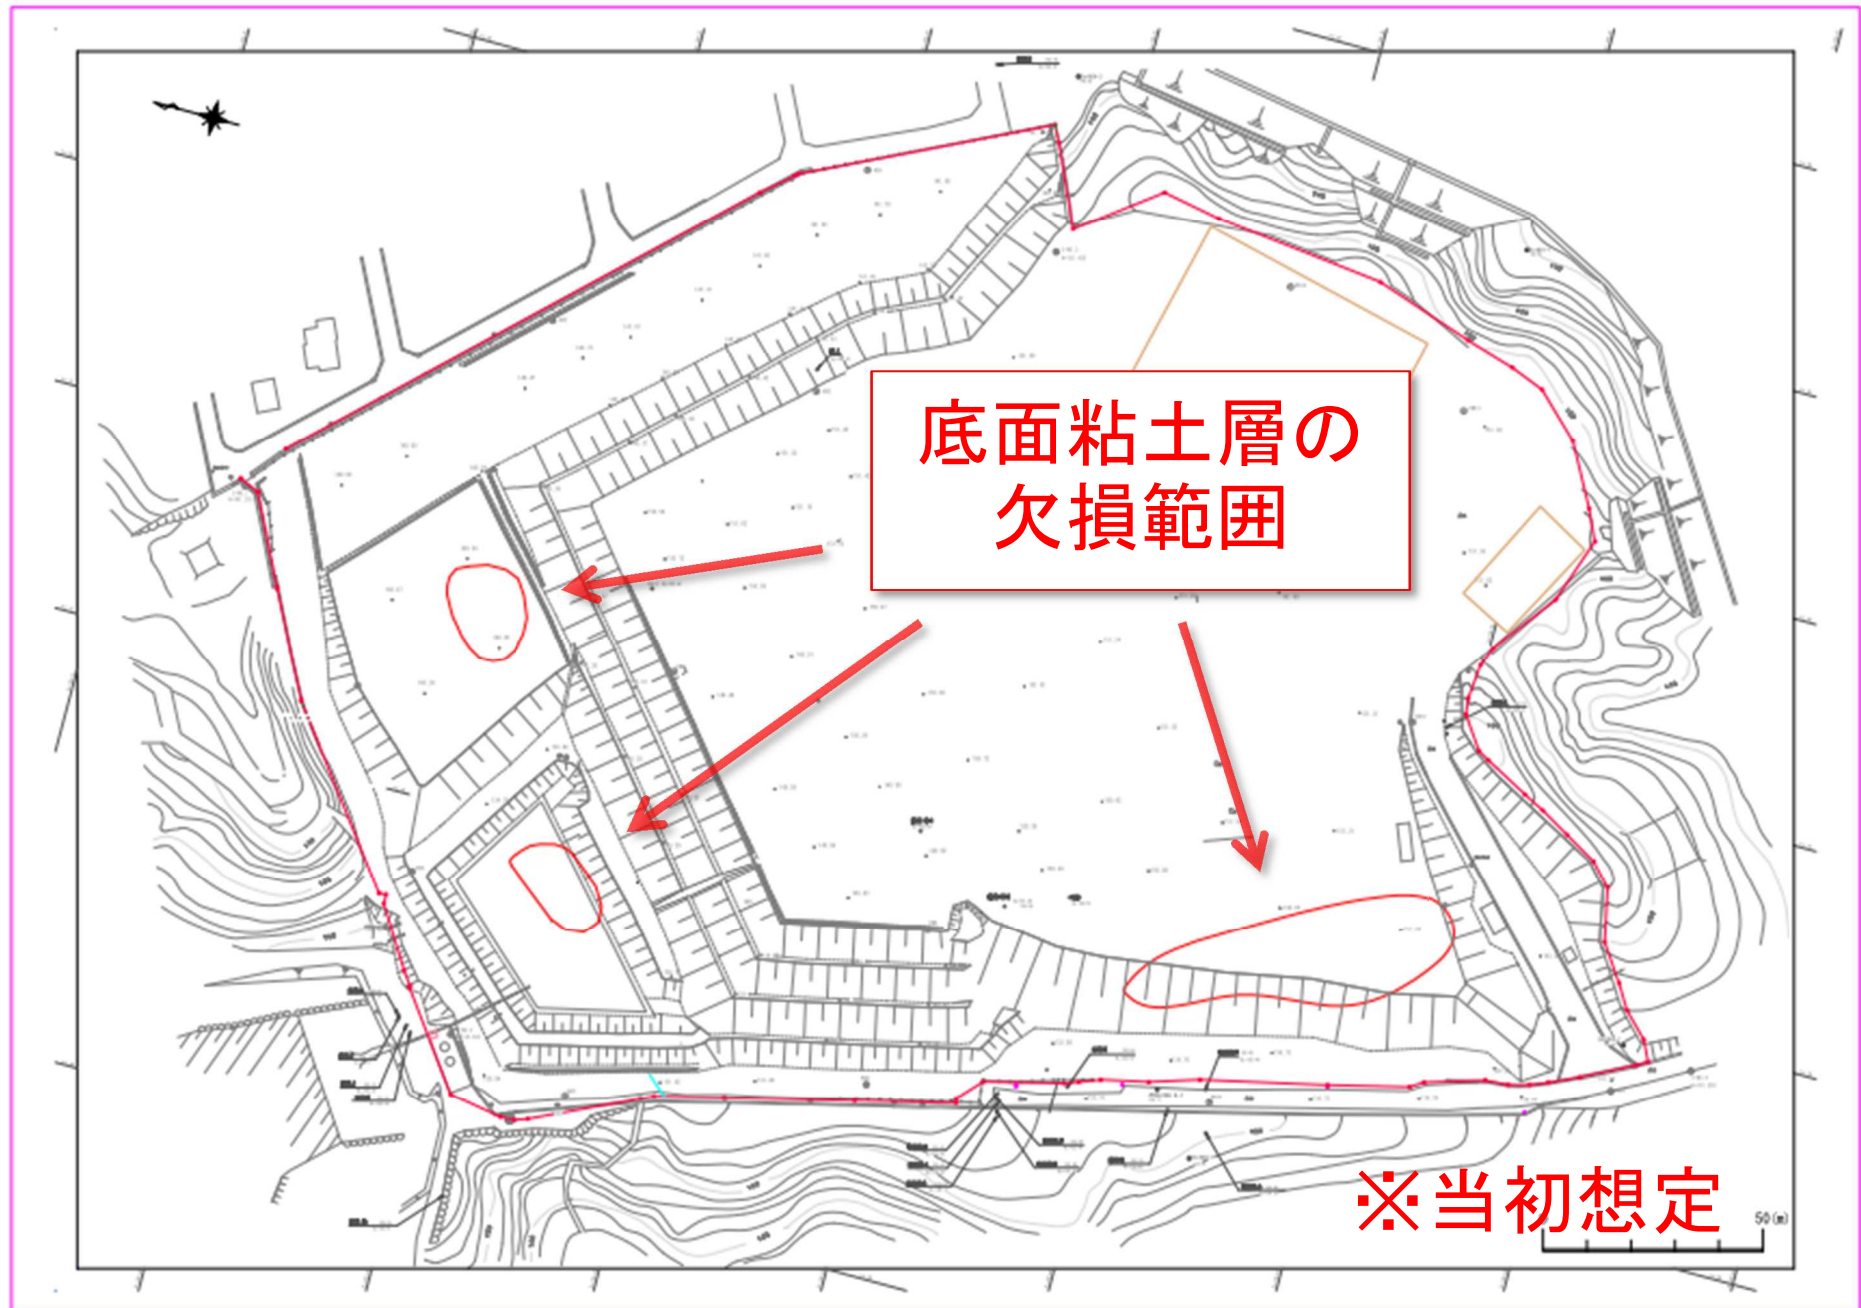


廃棄物土掘削の概要

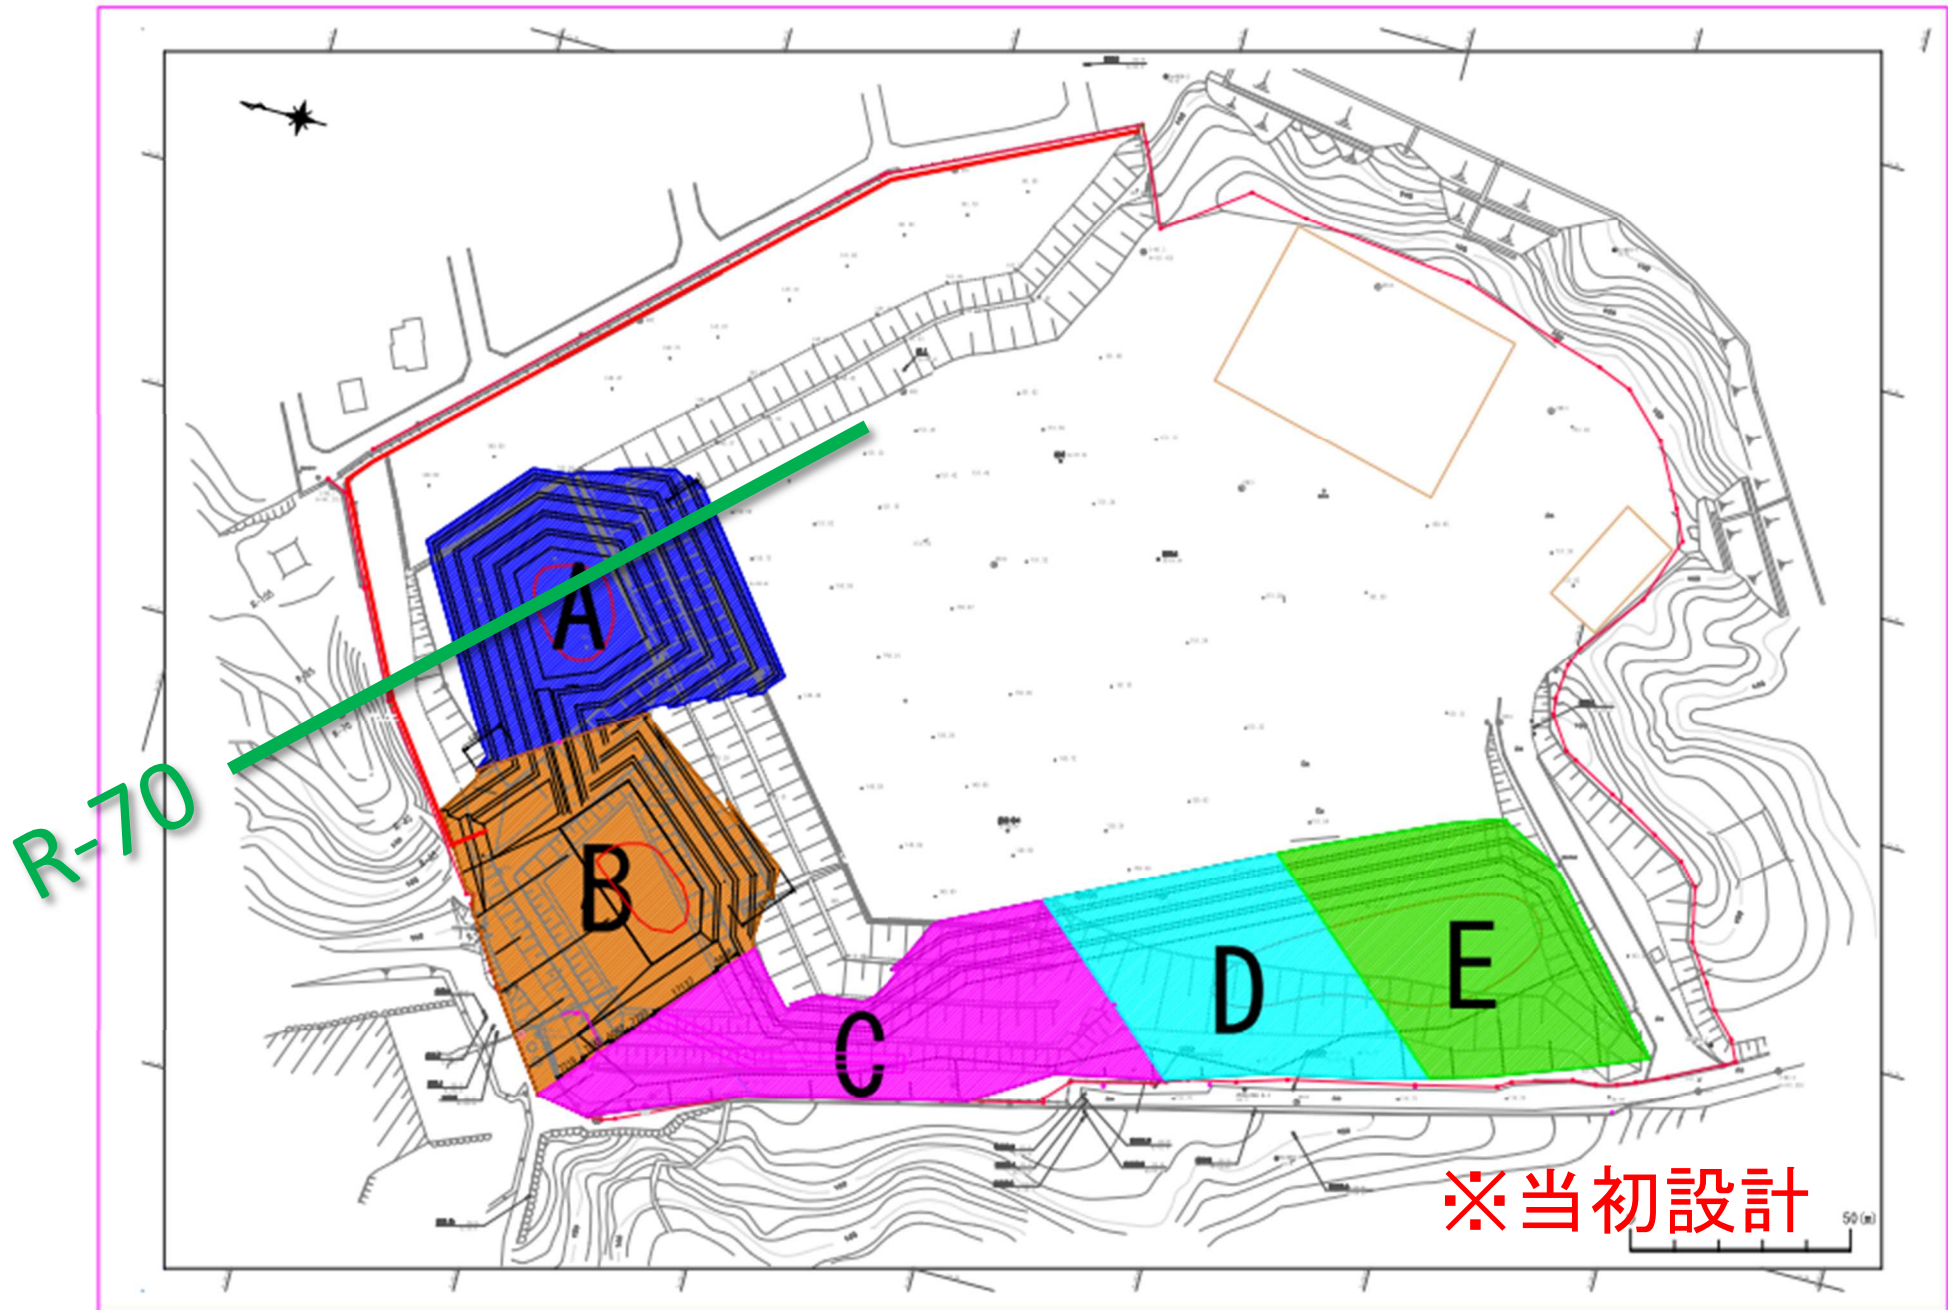

廃棄物土掘削(A工区)の概要

標準断面図 R-70


平成27年7月3日
(第1回目 見学会)

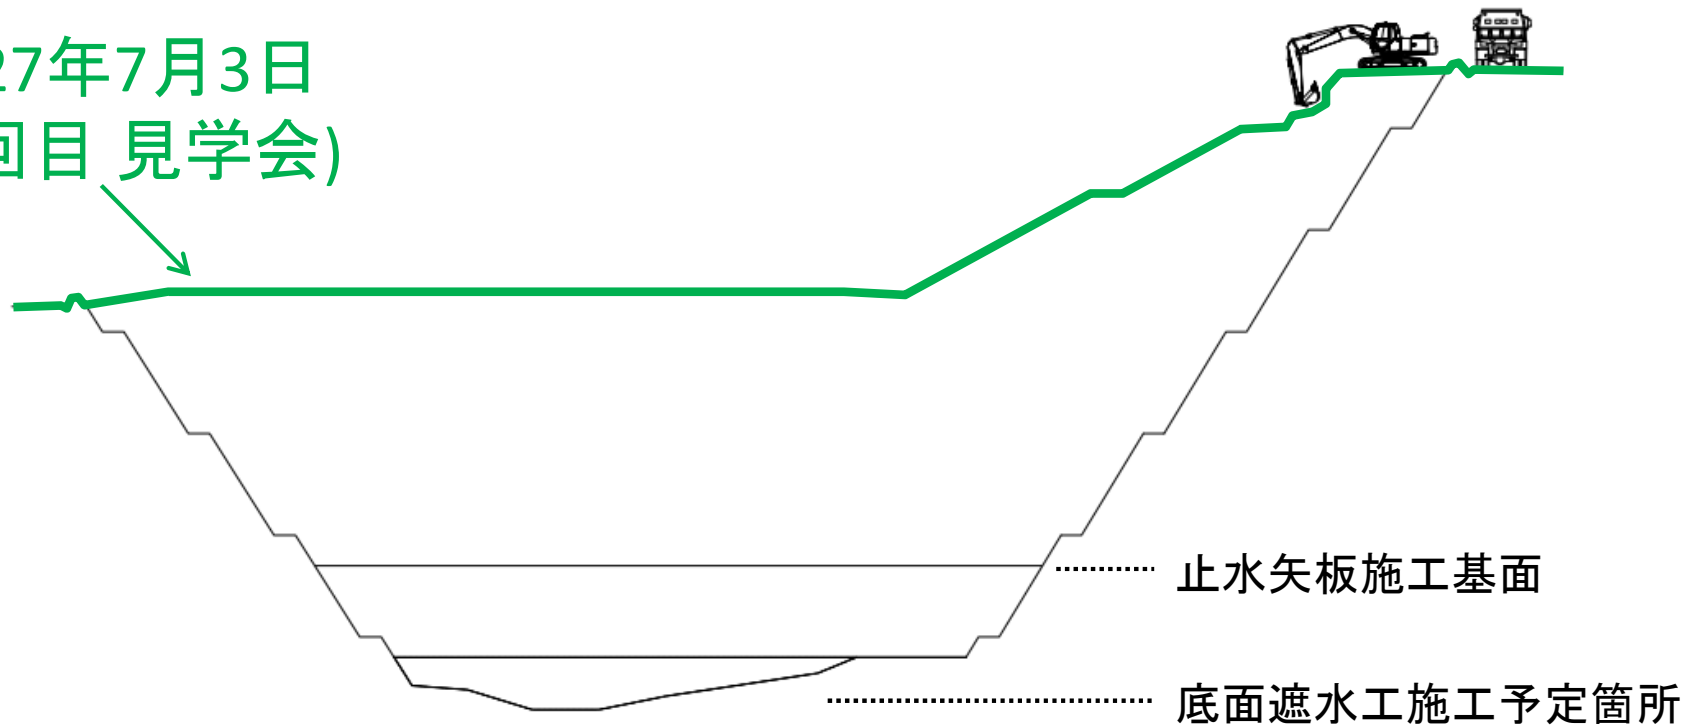

廃棄物土掘削(A工区)の概要

標準断面図 R-70

平成27年11月14日
(第2回目 見学会)

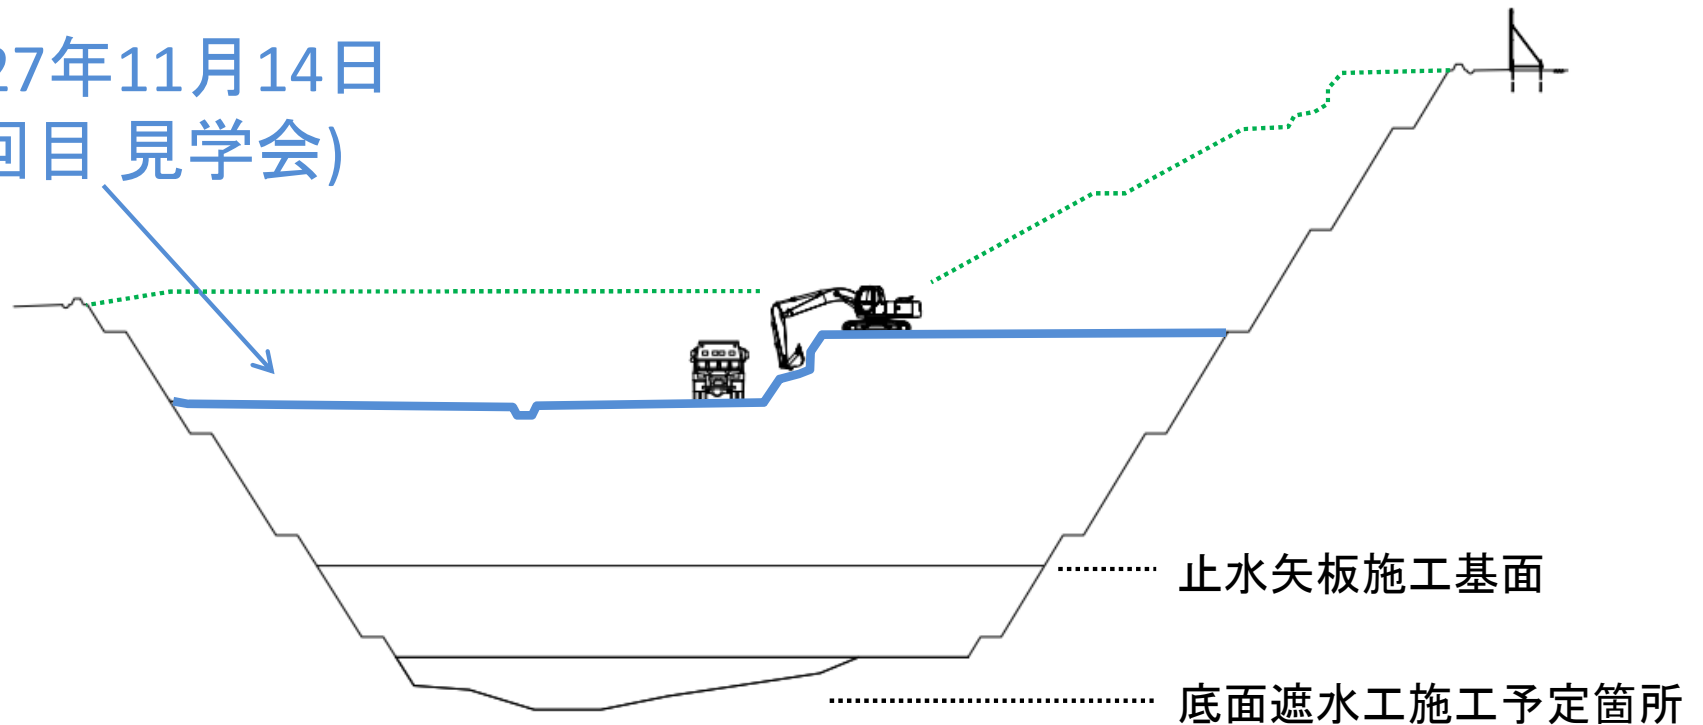

廃棄物土掘削(A工区)の概要

標準断面図 R-70

平成28年4月23日
(第3回目 見学会)

