
### B工区の状況①

#### 進捗状況

- ・止水壁(TRD)の造成完了
- ・底面粘性土層の欠損部分を確認
- •現地見学会 5月25日開催

#### 今後の予定

・底面遮水工、浸透水貯留層工等の施工

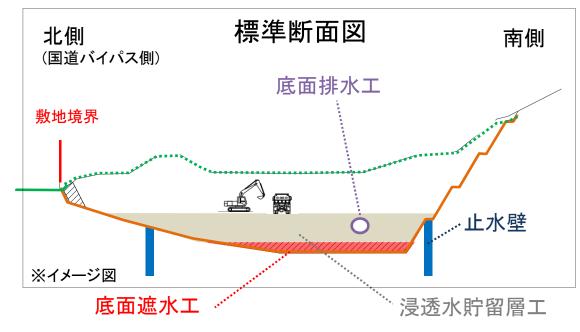





#### 施工写真

- ① 止水壁の施工状況
- ② 止水壁の全景

# B工区の状況②

平成29年5月22日

止水壁

止水壁内を地山の状況が 確認できるまで掘削

EL=125.0mまで掘削完了

#### 施工写真

- ① B工区全景
- ② 止水壁内の掘削状況




## 廃棄物土掘削(B工区)の状況



#### 現在の状況

- ・5月23日時点で止水壁内の廃棄物掘削は完了
- ・全体として長さ約30m×幅約10mの範囲で底面粘性土層の欠損が確認された

止水壁内の地質状況

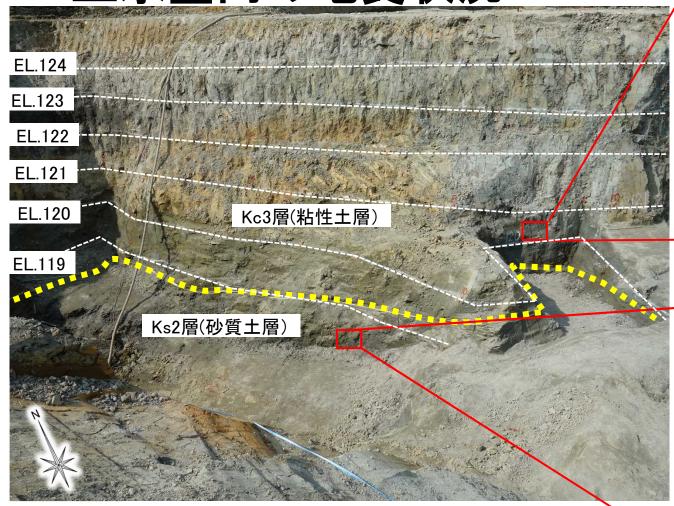


撮影日 平成29年5月23日




細粒で固結度が高く 割れ目等は認められない




砂分を主体とし Kc3層と比較して固結度は低い

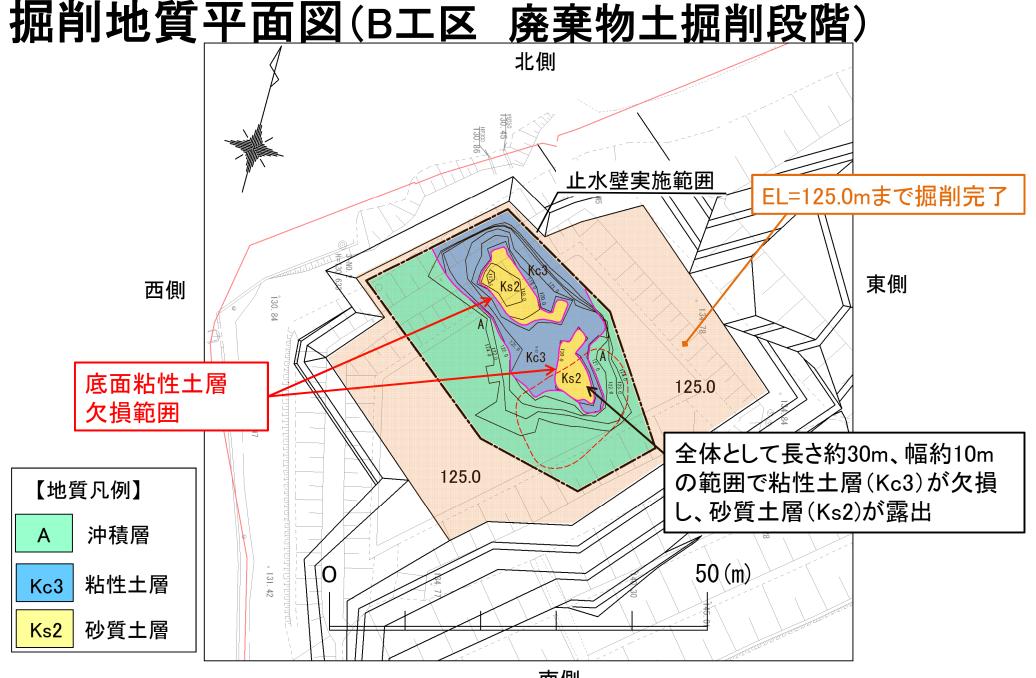

掘削地質平面図(B工区 廃棄物土掘削段階)

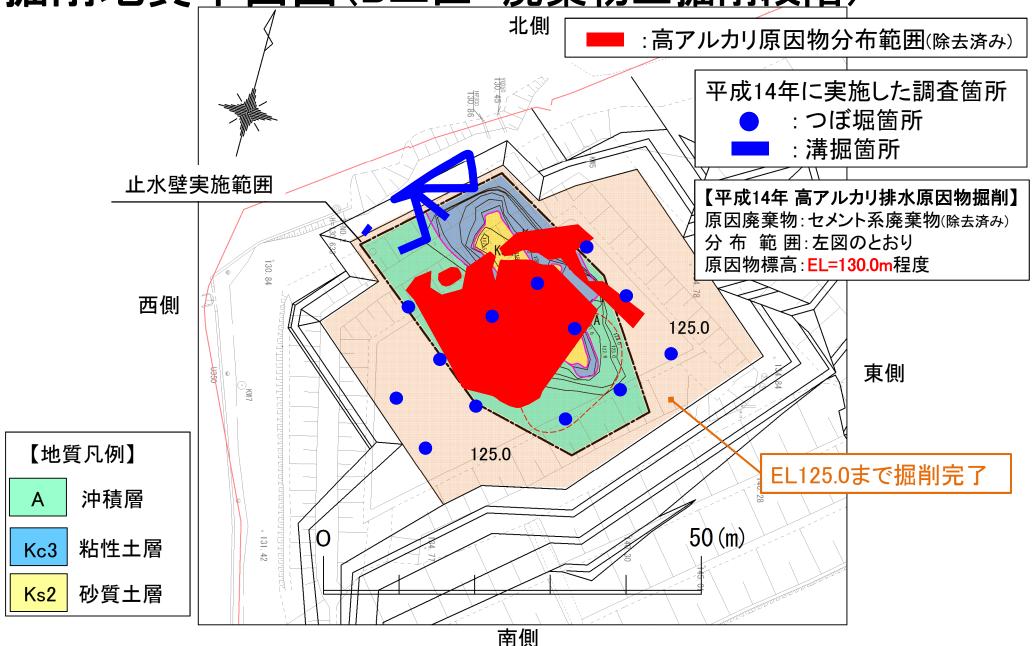

### 掘削地質断面図(B工区 廃棄物土掘削段階)





W 廃棄物土層


B 盛土層

A 沖積層

Ks3 砂質土層

Kc3 粘性土層

Ks2 砂質土層

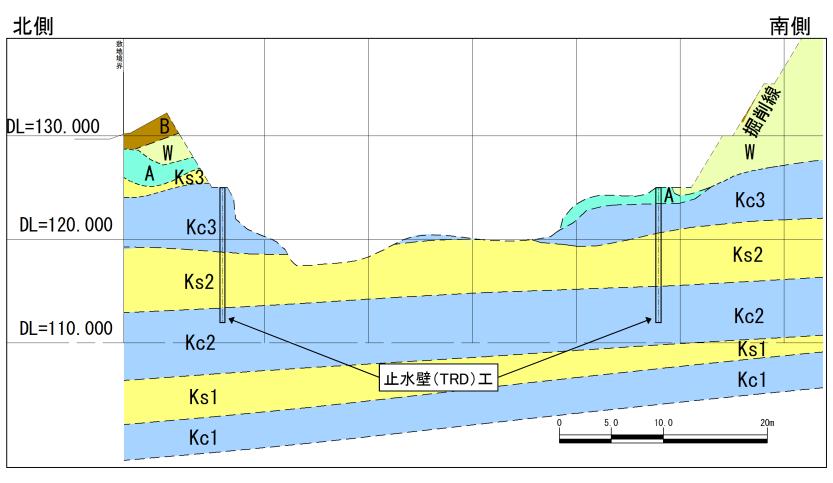

## 現場見学会の開催

#### 概要

• B工区の地山範囲の状況について開催



#### 次回見学会

・工事の進捗に応じてH区画等で開催予定


#### 開催結果

開催日:平成29年5月25日

参加者:6名




### 底面遮水工 断面図(B工区 案)



北側

南側

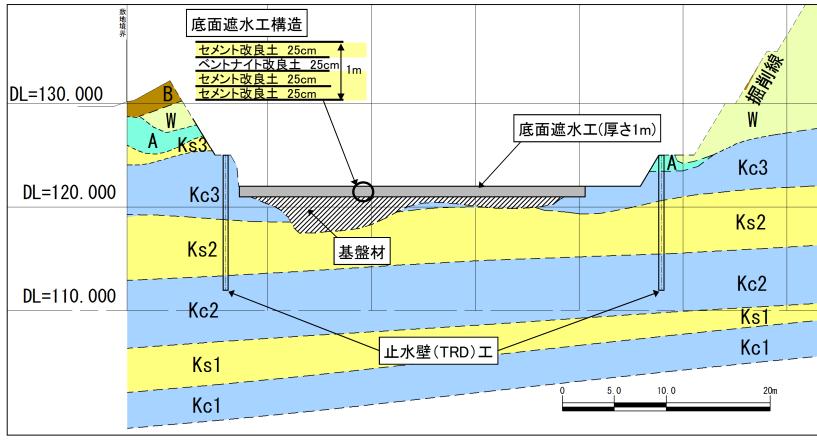

【地質凡例】

W 廃棄物土層


B 盛土層

沖積層

Ks3 砂質土層

Kc3 粘性土層

Ks2 砂質土層

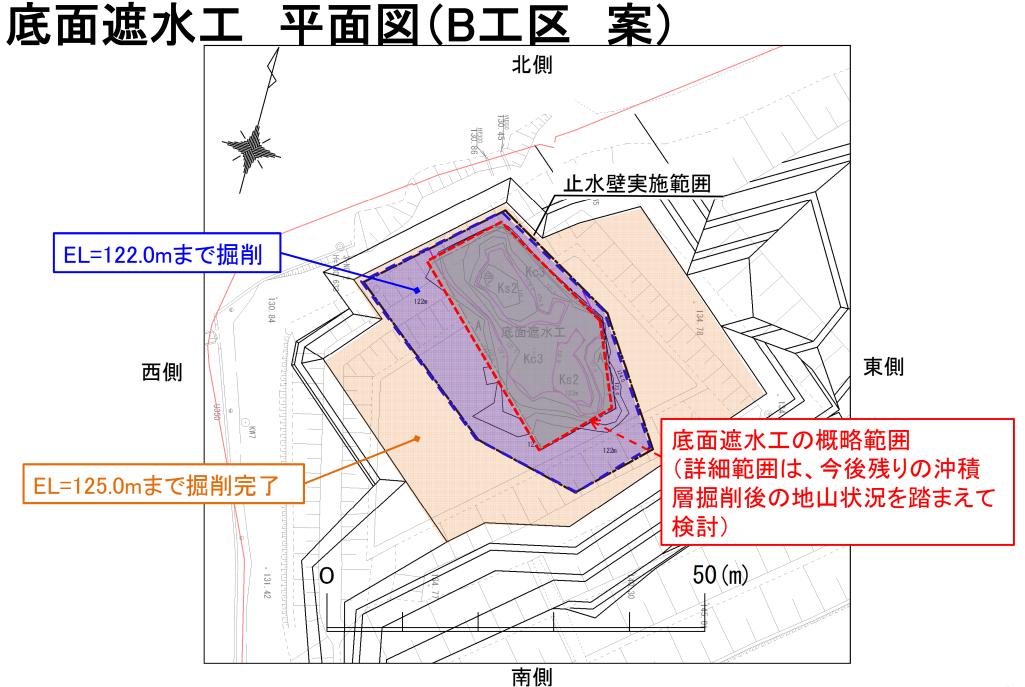


### 揚水ピット(B工区)





撮影日 平成29年6月1日

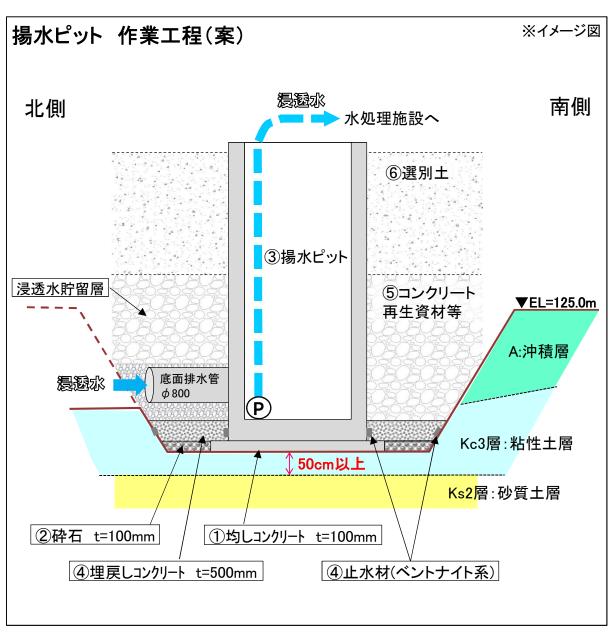

### 掘削した廃棄物

#### 主な廃棄物

• B工区では木片等の可燃物やガラスびん等の不燃物、ドラム缶、廃石綿の他、栗東町銘のごみ袋が出てきました













### 二次対策工事土工・処分実績(平成29年4月末現在)

		一久对水土于土土 吃力大惊\一次207	1/1/1/50	) <u> -</u>  -	
		項目	数量	単位	前回(2月末) との差
仮置	置物撤去土量		21,300	m³	0
掘削土量				m³	+11,100
埋戻可能物仮置土量				m³	+9,800
埋戾再生資源				m³	+1,900
	廃棄物	可燃物(主に廃プラスチック類で木くず等が混じるもの)	16,500	t	+1,300
		不燃物(ガラス陶磁器くず、金属くず)	1,070	t	+90
		有害物(掘削由来:バッテリー、感染性廃棄物相当物)	9.4	t	+0.07
場		有害物(場内残置物:バッテリー、変圧器等)	0.8	t	0
71	廃棄物 混じり の土	有害物(B工区他)	4,500	t	+230
外への搬出・		ドラム缶およびその内容物が浸潤した 廃棄物土・医療系廃棄物混じり土	105	t	+31
処分量		鋭利なものを含む等、選別に適さない廃棄物土等	590	t	0
		セメント混合廃棄物土	118	t	0
	選別土等	ふっ素が土壌環境基準を超過したもの	3,000	t	0
		覆土等で鉛が土壌環境基準を超過したもの	1,400	t	0
	資源化	金属くず	97	t	0 20

# 選別土 および 覆土等 の適合確認分析

#### 適合確認分析

- 300m3毎に分析を実施して埋戻しの可否を判断
- ・分析項目はカドミウム、水銀、鉛、ひ素、ふっ素、ほう素、ダイオキシン類、TOC

(平成29年5月22日現在)

項目	数量	単位	前回(第19回協議会) との差	備 考
選別土 適合確認回数	277	回	+ 28	
うち不適合判定数	6	回	0	不適合項目:ふっ素
<u>覆土等</u> 適合確認回数	54	回	+ 3	
うち不適合判定数	5	回	0	不適合項目:鉛

内容の詳細については別紙「適合確認分析の結果について」をご覧ください
