

《旧RD最終処分場二次対策工事 工事情報 第11号 をお知らせいたします》

平成26年4月30日作成


日付	施工実績														施工予定											備考	
	平成26年4月														平成26年5月												
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日						
工種・作業内容	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
廃棄物土・有害物掘削工																											
仮置き物撤去工	仮置き物撤去			仮置き物搬出				休 工						休 工									仮置き物搬出				休 工
矢板工	A区画矢板打設			鋼矢板打設			機械搬出		残土仮置き、掘削						掘削												
仮設備工	仮囲い設置			仮囲い防音シート(東側)																							
汚染地下水拡散防止対策工																											
仮設備工	浸透水揚水井戸工						井戸資材搬入路設置		井戸資材搬入路設置						井戸資材搬入路設置												
浸透水处理施設工																											
浸透水处理施設設置工	処理設備設置準備			鉄筋・型枠			con打設	鉄筋・型枠・con					脱枠・型枠・con打設								con:コンクリート						

【お知らせ】

- ・ 連休の間においては、場内の資機材の飛散防止対策を行い、入口は施錠し閉鎖します。
また、1日に2回警備員による場内パトロールを行います。
- ・ 有害物掘削除去完了後に現場見学会を開催します。
日程は [5月24日\(土\)](#) を予定していますが工事の進捗状況により変更することがございます。
詳細が決まり次第、随時お知らせいたします。

【工事施工状況写真】

平成26年4月24日撮影

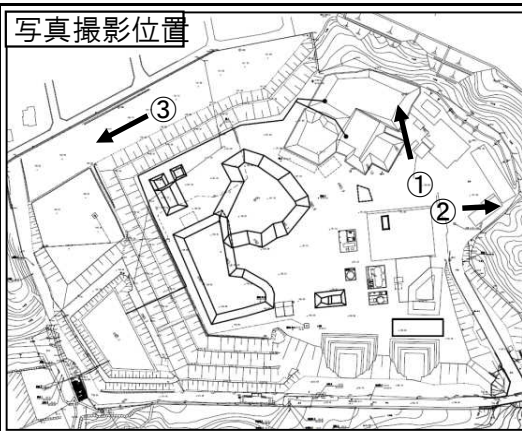

①A-1鋼矢板打設状況



②浸透水处理施設生コン打設状況




③浸透水井戸仮囲い完了



騒音・振動・粉じん・臭気自動計測の週間結果報告（4月18日～4月24日）

■: 休工(休日および夜間)

【位置図】

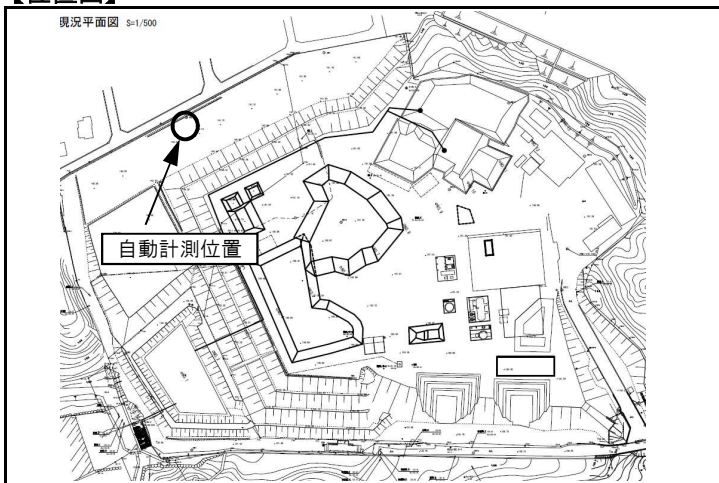

【測定値管理基準】

	騒音	振動	粉じん	臭気
第1管理値	基準値の90%	基準値の90%	基準値の90%	10(センサー値)
第2管理値	基準値	基準値	基準値	参考値
基準値	85dB	75dB	0.2mg/m ³	10(硫化水素臭などの異臭)
	栗東市の特定建設作業(騒音に係る規制基準)	栗東市の特定建設作業(振動に係る規制基準)	環境省『大気汚染に係る環境基準』の「環境上の条件・浮遊粒子状物質」記載基準	草津市「臭気指数規制基準 第1種地域敷地境界線(第1号)」記載基準

第1管理値を超過した場合

騒音・振動・粉じん	作業を一旦中断し注意喚起した後、警戒しつつ作業を行います
臭気	作業を一旦中断し、現場の監督員が直接臭いを確認します

第2管理値を超過した場合

騒音・振動・粉じん	直ちに作業を中断し、周辺7自治会長に連絡し原因究明後、対策を講じ作業を再開します
臭気	臭いの確認により硫化水素臭などの異臭がした場合には、直ちに作業を中断し、周辺7自治会長に連絡し対策を講じたうえで作業を再開します

