

有害物掘削の日報等

《滋賀県職員の日報》

日報

立会日：平成26年 5月16日 金

立会者：北村 室長、村野 副室長、松村 氏


【気付いた事項】

A-1 区画 6.9 ~ 7.9 m 掘削 → 搬出
 ↓
 仮置

部外、浸透水浸潤し、廃棄物土の重量が大変だと思われ
 0.7m³バット 4~5杯で65t積込で車重量計。
 → (P)ポンプを常時稼働させる。
 二日目 (P)を仮置場付近に設置、仮置有害物から浸潤する水にも対応。

○ 1斗缶の発見。いぼも空で潰れていた。異臭、付着物あり
 → 有害物と同等扱いする。

B区画 掘削なし

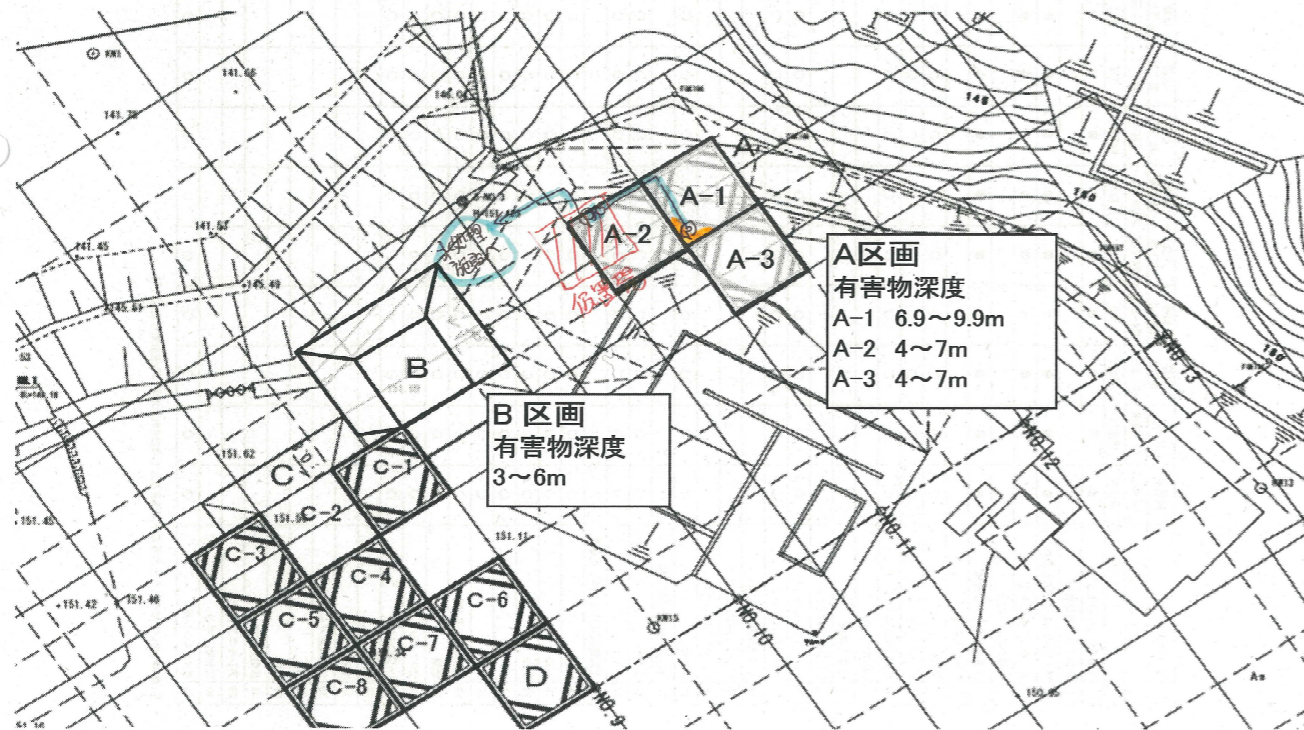

《監理委託業者の日報》

常駐監理日報

1/1 頁

発注者・印	総括	主任	監督員	受注者・印	管理	照査	常駐	担当技術者
	監督員	監督員			技術者	技術者	監理者	
発注者	滋賀県琵琶湖環境部 最終処分場特別対策室				受注者	(株)建設技術研究所		
業務名	平成26年度	第RD-3号 旧産業廃棄物最終処分場二次対策工事施工監理業務委託						
工事名	平成25年度	第RD-3号 旧産業廃棄物最終処分場二次対策工事						
業務箇所	栗東市小野							
日時	平成 26年 5月 16日 (金)				天候	晴れ	報告者	石澤康行
現場監理実施状況	項目	時間	場所	コメント				
	現場観察	8:30 ~ 10:30	掘削現場(A1) 出入口 揚水井戸設置箇所 浸透水处理施設	・A1 有害廃棄物掘削積込搬出 ・伐木搬出 ・搬入道路造成、削孔機材搬入 ・受電設備配線				
	書類整理	10:30 ~ 11:00	監理事務所	・書類作成				
	現場観察	11:00 ~ 12:00	掘削現場(A1)	・A1 有害廃棄物掘削積込搬出				
	打合せ	13:00 ~ 13:20	JV事務所	・作業内容の確認 ・週間工程会議				
	書類整理	13:20 ~ 14:00	監理事務所	・書類作成				
	現場観察	14:00 ~ 17:00	掘削現場(A1) 揚水井戸設置箇所	・A1 有害廃棄物掘削積込搬出 ・搬入道路造成、削孔機材搬入				
	日報等作成	17:00 ~ 18:30	監理事務所	・日報等作成				
項目	作業状況				協議・指示事項等			
A1有害物搬去	・A1区画有害物搬去(有害廃棄物掘削・積込・仮置)				・有害物の仮置きは、継ぎシートでは不可。1枚ものを使用し、端部を浸透水がこぼれないように処理する。浸透水がにじみ出た場合には、ポンプで処理をする事を条件に了承する。 ・有害廃棄物中からの潰れた1斗缶(中身なし)2個を保管ドラムに保管。 ・有害物拡散防止対策として、エアシャワー室の外に防護服を置く場所を設置し、泥落とし用の洗い場を設ける。管理区域とそれ以外の区域での保護衣着用の有無を区分する。			
浸透水揚水井戸	・搬入用道路設置 ・削孔機材搬入				・搬入道路造成。廃棄物掘削中に特記すべき廃棄物なし。			
浸透水处理施設	・受電設備配線							
有害廃棄物搬出	・A1有害廃棄物(4台×3回=12台)搬出				・A1廃棄物を搬出。2台目計量中に重量計不調となる。その後復帰する。原因はコネクタ部への浸水。 ・重量計の位置を水のたまり箇所に変更する			
出入り口	・伐木搬出							
特記事項								
