

工事かわら版 第2号

旧産業廃棄物最終処分場一次対策工事

工事の進捗について

清水建設の現場代理人の山本です。

11/15(木)から、いよいよ掘削が始まりました。

現場では、全身白い防護服を着ているのでなやら異様な雰囲気ですが、不測の事態に備えるためこのような格好で仕事をすすめています。

11/24 現在、ドラム缶などの目立ったものは見つかりません。


●11/24 (土)には、第1回の掘削現場見学会を実施しました。8名の方が防護服を身にまとい、A・C・D区画の掘削途中の状況を間近でご覧いただきました。

●12/1 (土)には第2回を実施し、C区画の完了をご覧いただく予定です。

これからの見学会も毎週の「工事情報」等でお知らせします。

定員がありますのでご予約はお早めに。

(清水建設 TEL077-554-8287)

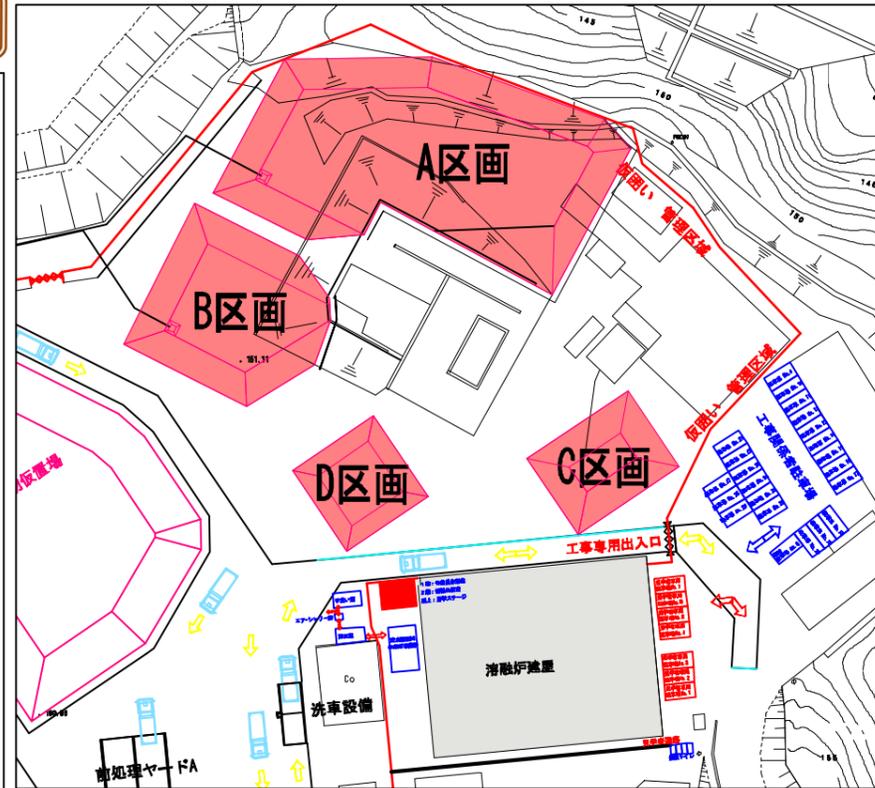

A区画の状況(11/20)



C区画の状況(11/16)



D区画の状況(11/20)



防護服姿



工事の月間工程と、掘削現場見学会の日程

工程表及び見学会の予定は現場の進捗状況によって変わります。詳しくは、毎週の工事情報等でご確認ください。

月間工程表		平成24年12月																																
		日付																																
工種・作業内容	日付	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
廃棄物土掘削工	A区画(5,940m ³)掘削・選別・積込み			掘削・選別・積込み																													1月上旬完了予定	
	B区画(2,230m ³)掘削・選別・積込み																																A又はD区画完了後開始予定	
	C区画(880m ³)掘削・選別・積込み																																埋戻し(予定)	11/30掘削完了予定
	D区画(530m ³)掘削・積込み			掘削・積込み																													12月中旬～下旬完了予定	

第3回 掘削現場見学会 予定



年明けの工事は1/7(月)より再開します
