


# 《旧RD最終処分場二次対策工事 工事情報 第307号 をお知らせいたします》

作成日：令和2年1月20日

| 日付           | 施工実績                 |    |    |    |    |    |    |    | 施工予定 |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 備考 |    |                        |   |   |                       |
|--------------|----------------------|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------------------------|---|---|-----------------------|
|              | 令和2年1月               |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 2月 |                        |   |   |                       |
|              | 月                    | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 日  | 月  | 火    | 水  | 木  | 金  | 土  | 日  | 月  | 火  | 水  | 木  |    | 金  | 土                      | 日 |   |                       |
|              | 13                   | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21   | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1  | 2                      |   |   |                       |
| 工種・作業内容      |                      |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                        |   |   |                       |
| 廃棄物土・有害物掘削工  |                      |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                        |   |   |                       |
| ① 有害物掘削工     | I区画<br>鋼矢板引抜         |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 休  | A~E工区法面整形              |   | 休 | 鋼矢板引抜は令和2年3月から実施予定です。 |
| ② 選別土仮置・盛土工  | D・E工区盛土<br>A~E工区法面整形 |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | A~E工区法面整形              |   |   |                       |
| 廃棄物選別工       |                      |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                        |   |   |                       |
| ③ 選別処理工      | 選別建屋撤去               |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 工  | 選別建屋撤去は令和2年2月から実施予定です。 |   |   |                       |
| 汚染地下水拡散防止対策工 |                      |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                        |   |   |                       |
| ④ キャッピング工    | 覆土受入<br>DE工区法面覆土整形   |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 工  | 覆土受入<br>DE工区法面覆土整形     |   |   |                       |
| ⑤ 雨水排水工      | 雨水排水工                |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 雨水排水工                  |   |   |                       |

## 【工事施工予定位置図】

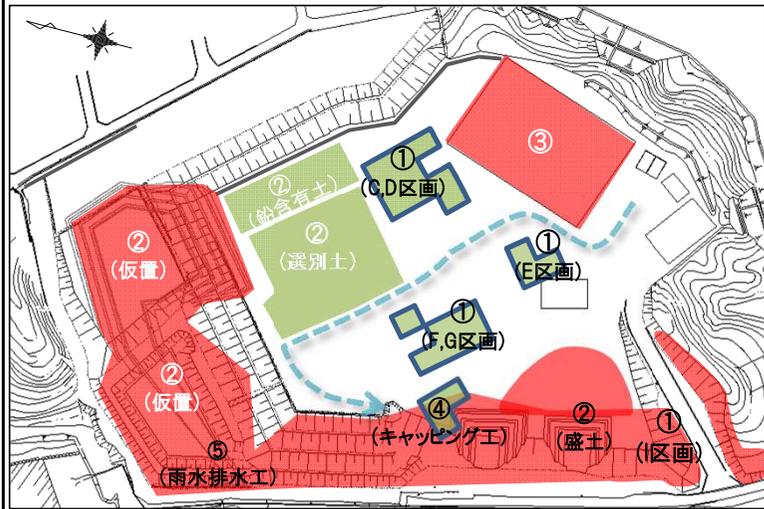

## 【工事施工状況写真】

撮影日：令和2年1月16日



④ キャッピング工  
DE工区の法面覆土整形を行っています。



⑤ 雨水排水工  
西市道側U字型側溝据付状況です。



⑤ 雨水排水工  
北尾団地側工事準備として万能板の撤去を行っています。

## 【お知らせ】

・第32回旧RD最終処分場問題連絡協議会を下記のとおり開催します。

日時：令和2年2月13日(木) 19時00分～  
場所：栗東市コミュニティセンター治田東

・自動計測(騒音、振動、粉じん、臭気)の中止について

北尾団地側に設置しております自動計測器につきまして、北尾団地側の整備に伴い、配線等が支障となるため、1/17(金)に計測を中止し、撤去いたしました。  
1/17以降の計測ができないため、工事情報の裏面の情報の掲載はありません。

# 《騒音・振動・粉じん・臭気自動計測の週間結果報告》

(報告対象期間:1月10日～1月16日)

## 【概要】

二次対策工事による周辺環境への影響を調査するために、IBRD最終処分場と隣接する住宅地との境界に計測器を設置し、「騒音・振動・粉じん・臭気」を連続自動計測しています。

各項目の1週間分の計測結果をグラフにしました。  
※網掛け部は休工の時間帯(休日および夜間)です。

## 【位置図】



## 【測定値管理基準】

|                    | 騒音                            | 振動                            | 粉じん   | 臭気   |
|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|--|
| 第1管理値<br>(基準値の90%) | 76dB                          | 67dB                          | 0.18mg/m <sup>3</sup>   | 10(センサ-値)  |
| 第2管理値<br>(基準値)     | 85dB                          | 75dB                          | 0.2mg/m <sup>3</sup>  | 10   |
| 基準値                | 85dB<br>栗東市の特定建設作業(騒音)に係る規制基準 | 75dB<br>栗東市の特定建設作業(振動)に係る規制基準 | 0.2mg/m <sup>3</sup><br>環境省『大気汚染に係る環境基準』の「環境上の条件・浮遊粒子状物質」記載基準 | 10(硫化水素臭などの異臭)<br>草津市「臭気指数規制基準 第1種地域 敷地境界線(第1号)」記載基準 |

## 第1管理値を超過した場合

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| 騒音<br>振動<br>粉じん | 作業を一旦中断し注意喚起した後、警戒しつつ作業を行います |
| 臭気              | 作業を一旦中断し、現場の監督員が直接臭いを確認します   |


## 第2管理値を超過した場合

|                 |  |
|-----------------|--|
| 騒音<br>振動<br>粉じん | 直ちに作業を中断し、周辺7自治会長に連絡し原因究明後、対策を講じ作業を再開します                         |
| 臭気              | 臭いの確認により硫化水素臭などの異臭がした場合には、直ちに作業を中断し、周辺7自治会長に連絡し対策を講じたうえで作業を再開します |

| 主な実施作業内容     | 令和2年1月 |      |      |      |      |       |            | 備考 |
|--------------|--------|------|------|------|------|-------|------------|----|
|              | 10 金   | 11 土 | 12 日 | 13 月 | 14 火 | 15 水  | 16 木       |    |
| 廃棄物土・有害物掘削工  |        |      |      |      |      |       |            |    |
| (1)選別土仮置・盛土工 | 盛土     |      |      |      |      | 盛土    |            |    |
| 汚染地下水拡散防止対策工 |        |      |      |      |      |       |            |    |
| (2)キャッピング工   | 覆土受入   |      |      |      |      | 覆土準備  | DE工区法面覆土整形 |    |
| 汚染地下水拡散防止対策工 |        |      |      |      |      |       |            |    |
| (3)雨水排水工     | 雨水排水工  |      |      |      |      | 雨水排水工 |            |    |


## 【騒音】

1月15日 17:00、1月16日 9:00に騒音値が大きくなっているのは、測定計器そばで万能板撤去を行ったためです。

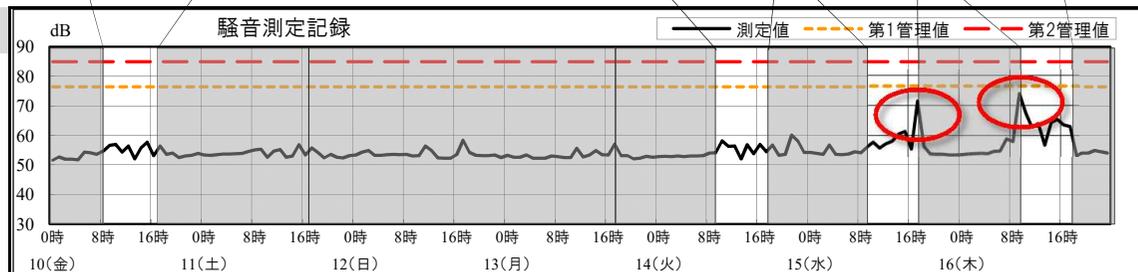


## 【振動】

(特になし)

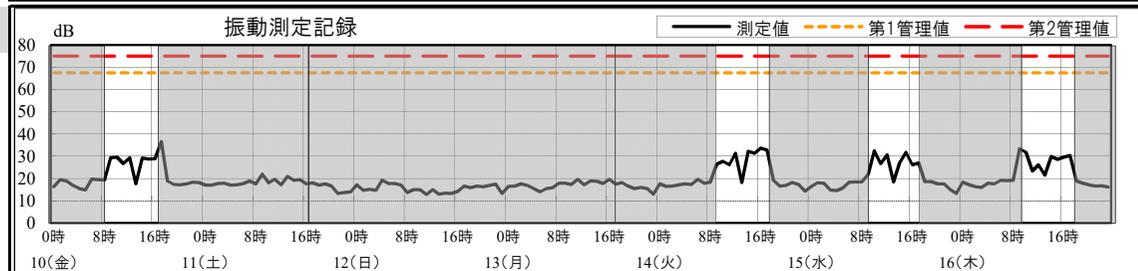

## 【粉じん】

(特になし)

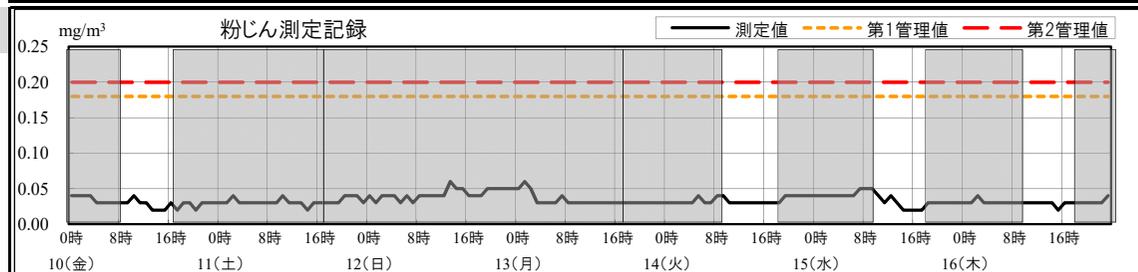

## 【臭気】

(特になし)

