

# 現場見学会 (E工区 廃棄物掘削)

令和元年(2019年)10月11日

## 令和元年度 工程表(案)

| 工 種         | 4月 |    | 5月    |    | 6月 |    | 7月 |    | 8月 |    | 9月 |    | 10月 |    | 11月 |    | 12月 |    | R2.1月 |    | 2月 |    | 3月 |    | 4月 |    |
|-------------|----|----|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-------|----|----|----|----|----|----|----|
|             | 15 | 30 | 15    | 31 | 15 | 30 | 15 | 31 | 15 | 31 | 15 | 30 | 15  | 31 | 15  | 30 | 15  | 31 | 15    | 31 | 15 | 28 | 15 | 31 | 15 | 31 |
| 廃棄物土・有害物掘削工 |    |    | D~E工区 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |       |    |    |    |    |    |    |    |
| 廃棄物土掘削工     |    |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |       |    |    |    |    |    |    |    |
| 有害物掘削除去工    |    |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |       |    |    |    |    |    |    |    |
| 選別土盛土       |    |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |       |    |    |    |    |    |    |    |
| 矢板工         |    |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |       |    |    |    |    |    |    |    |
| 廃棄物選別工      |    |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |       |    |    |    |    |    |    |    |
| 選別処理施設      |    |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |       |    |    |    |    |    |    |    |
| 汚染地下水拡散防止対策 |    |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |       |    |    |    |    |    |    |    |
| 底面・側面遮水工    |    |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |       |    |    |    |    |    |    |    |
| 底面排水工       |    |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |       |    |    |    |    |    |    |    |
| 洪水調整設備工     |    |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |       |    |    |    |    |    |    |    |
| 雨水排水工       |    |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |       |    |    |    |    |    |    |    |
| キャッピング工     |    |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |       |    |    |    |    |    |    |    |


現場見学会(10/11)

現場見学会(6/11)

第29回  
連絡協議会(6/10)

第30回  
連絡協議会(9/13)

# 本日の見学箇所

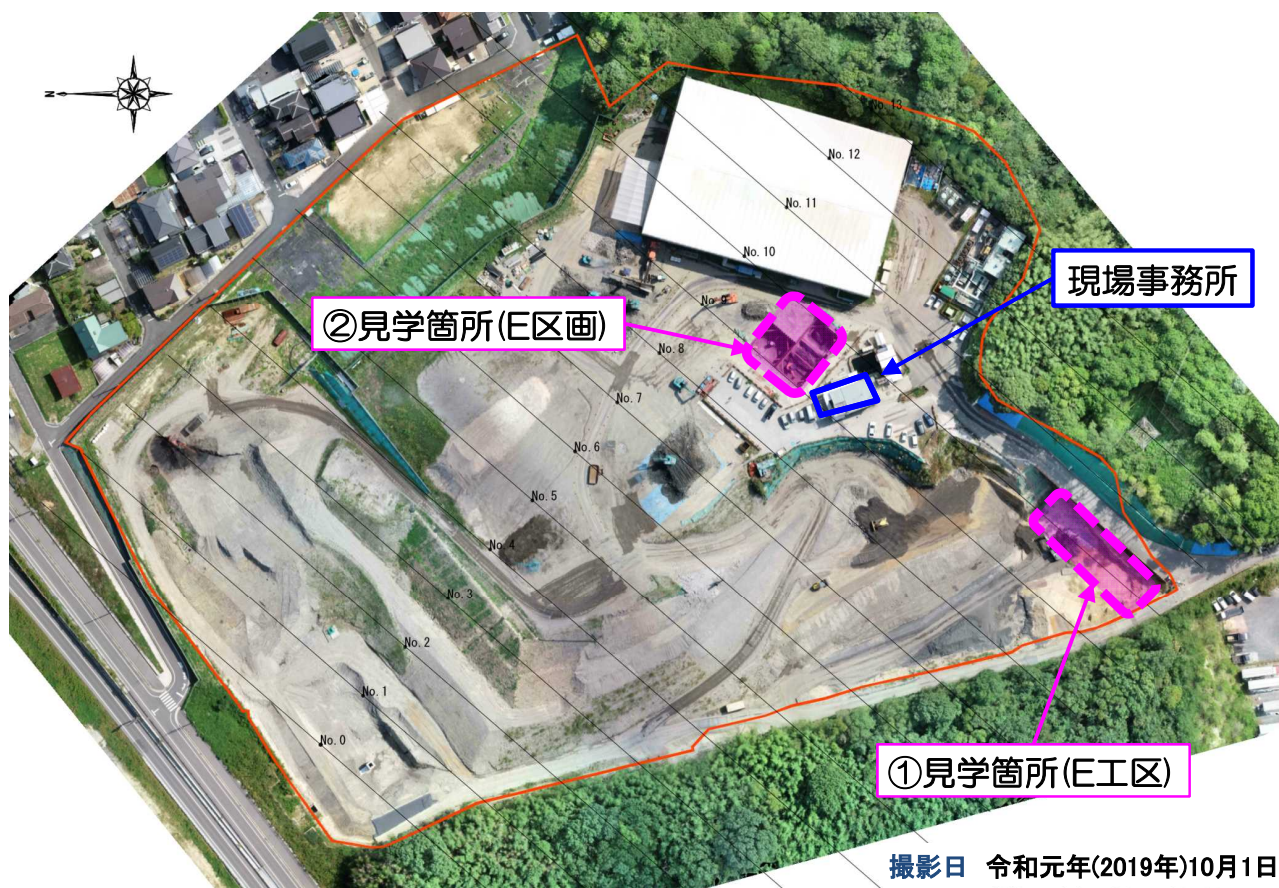

## E工区の掘削状況

(南側)

### 進捗状況

- ・ 進入路側へアンカー・腹起しを設置しながら、廃棄物土・有害物土(I区画)の掘削を実施。



有害物区画(I区画)



# E工区の掘削状況


(南側)

進捗状況 ・ 廃棄物土・有害物土を全て掘削し、掘削完了。




撮影日 令和元年(2019年)9月30日

①

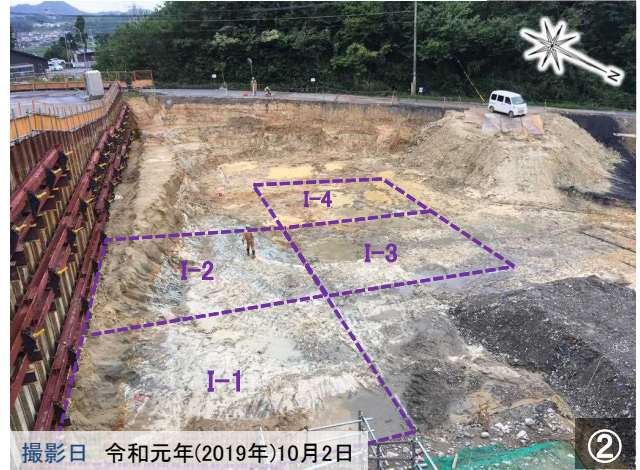

撮影日 令和元年(2019年)10月2日

②

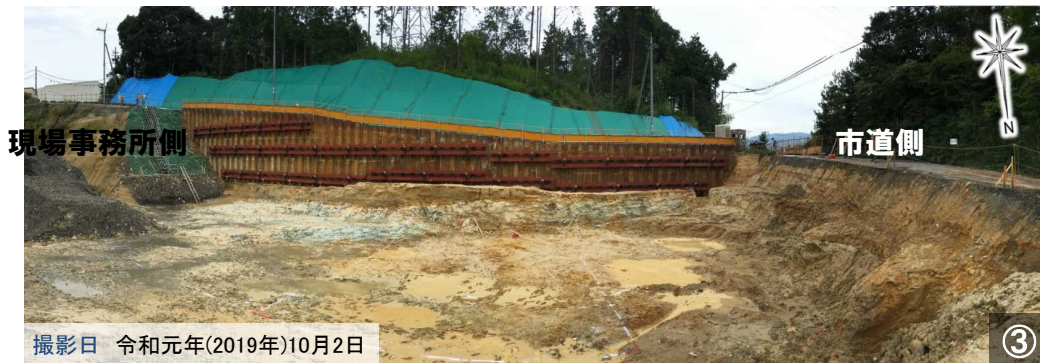

撮影日 令和元年(2019年)10月2日

③

## 底面・側面遮水工

進捗状況


・ 入り口側の廃棄物土の掘削が完了

写真

- ① DE工区 全景
- ② 掘削法面側の掘削状況
- ③ DE工区の地質平面図


Ks2層の周囲にKc3層の分布を確認して掘り止め

(DE工区)

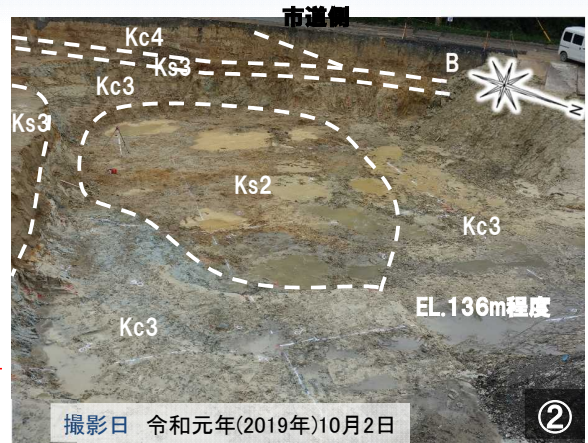


撮影日 令和元年(2019年)10月2日

②

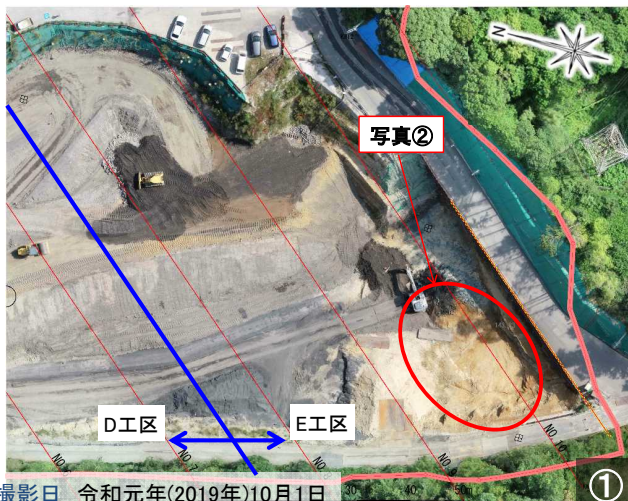

撮影日 令和元年(2019年)10月1日

①

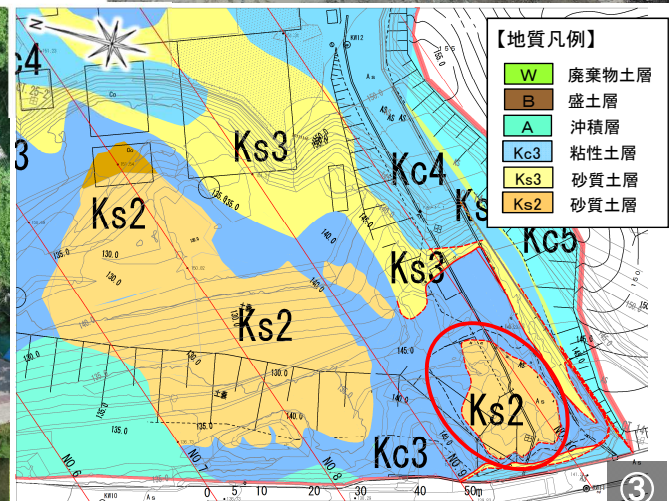

③

【地質凡例】

|     |       |
|-----|-------|
| W   | 廃棄物土層 |
| B   | 盛土層   |
| A   | 沖積層   |
| Kc3 | 粘性土層  |
| Ks3 | 砂質土層  |
| Ks2 | 砂質土層  |




# 底面・側面遮水工

(DE工区)


## 地山確認および底面・側面遮水工の施工範囲

- ・ 廃棄物土を掘削後、地山確認を行った結果、No.9では粘性土層(Kc3層)が厚く分布しており、No.10では粘性土層(Kc3層)の欠損範囲(長さ約25m、幅約15m)で確認できました。
- ・ 底面・側面遮水工は、この欠損範囲を囲む範囲(赤線)で実施する予定です。

平面図(地層図)

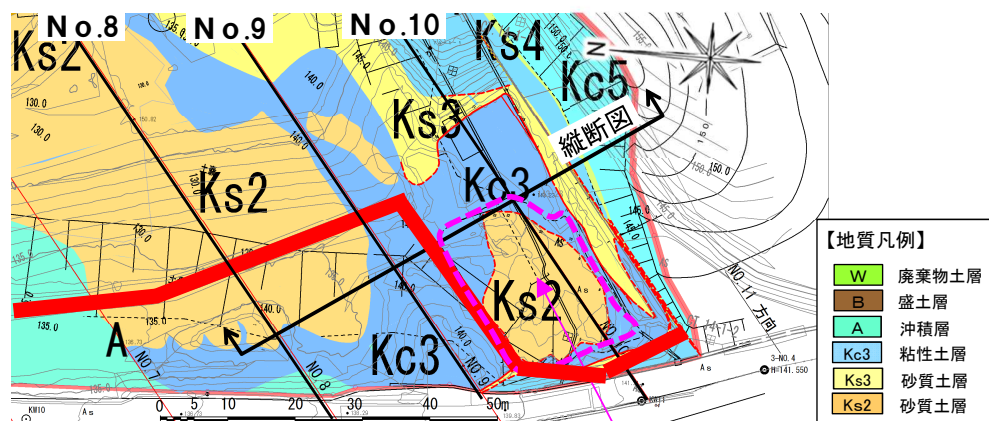

縦断面図(イメージ図)

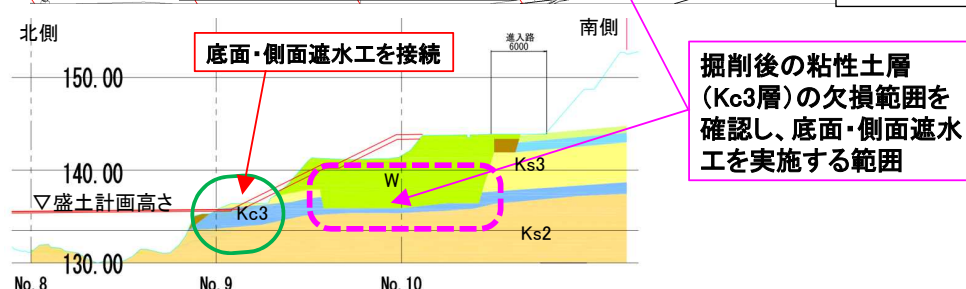

※本資料は、現時点のものであり、今後詳細な設計を行います。

## 現場を見学されるにあたって

### 服装

- ①防塵マスク
- ②ヘルメット
- ③軍手
- ④長靴等

②E区画

見学ルート

現場事務所

①E工区

### 注意事項

見学箇所は掘削法面に隣接しており、足元も悪いため**危険**です。指示に従い安全に行動していただきますようご協力お願いします。
