

## 外来水生植物防除推進事業当初予算分の進捗状況

1. 委託期間：平成 26 年（2014 年）9 月 16 日～平成 27 年（2015 年）1 月 31 日
2. 受託業者：(株) アズマ
3. 駆除方法：
  - a. 駆除想定地域（守山市木浜町～草津市下物町）における群落の生育面積を調査する。
  - b. 実際の駆除対象とする群落を選定する。
  - c. 先端に特製の熊手を装着したワイヤーを建設重機のウィンチで巻き取って岸までたぐり寄せ
  - d. グラップルを使って掴み上げて、除去を行う。

### 4. 進捗状況：

<生育面積の現地調査>

9 月 16 日～9 月 29 日

<駆除作業>

#### A. 木浜内湖

第 1 区域（南部水路部）①

9 月 30 日～10 月 3 日

第 2 区域（東部）②

10 月 7 日～10 月 12 日

#### B. 小津袋（赤野井内湖）内陸側

第 3 区域（中部北岸）③

10 月 16 日～10 月 21 日

第 4 区域（南部東岸）④

10 月 22 日～10 月 24 日

第 5 区域（中部東岸）⑤

10 月 27 日～10 月 30 日

#### C. 本湖「赤野井 2」

第 6 区域⑥

10 月 31 日～11 月〇日


#### D. 小津袋（赤野井内湖）琵琶湖側

11 月 12 日を含む工期（破線部）

<駆除面積>

((株)アズマによる計測値合計)

木浜内湖	4,167 m <sup>2</sup>
小津袋中南部	9,336 m <sup>2</sup>
赤野井湾「赤野井 2」	8,224 m <sup>2</sup>
計	21,727 m <sup>2</sup>

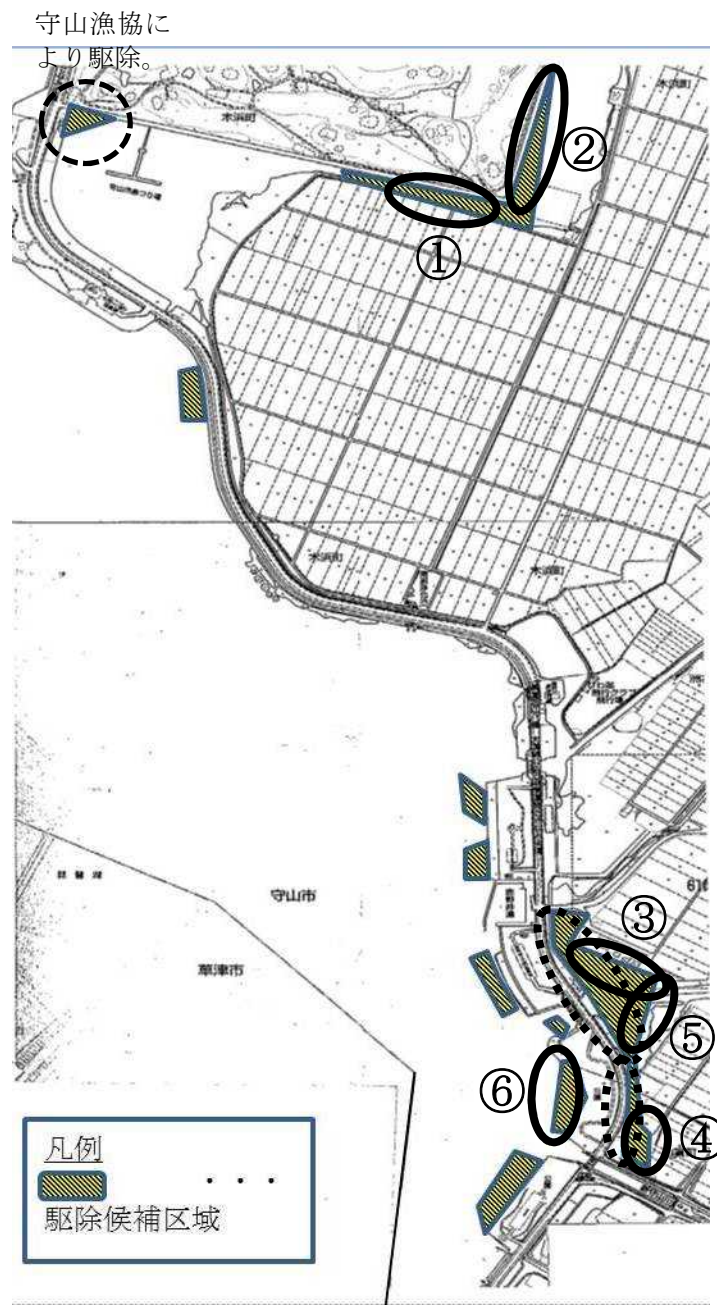

※被度 90%として 19,554 m<sup>2</sup>となり、ほぼ業務設計値の 20,000 m<sup>2</sup>に到達。
