

平成30年度 緑化事業実績報告書

滋賀鋳産株式会社
伊吹鋳山

平成30年度 緑化実績

緑化区域	計画面積 (㎡)		実績面積 (㎡)		工 法	備 考
		緑 化		緑 化		
上部区域		7,500		7,500	吹き付け工法	ソイルシーダーにより吹き付け工法で実施した。 吹き付けを行う種子は、国産在来種のみを使用。 一部、伊吹産ヨモギを使用
下部区域 オープンシュート北面		0		0		
計		7,500		7,500		

緑化工法別の年次緑化面積








単位 m²

年度	下部区域緑化面積								上部区域緑化					上部+下部 合計	上部+下部 累計
	原生植物 移植	植生袋 張	芝	土のう 積み	植樹	吹付け 播種	下部区域 合計	下部区域 累計	原生植物 移植	吹付け 播種	芝	上部区域 合計	上部区域 累計		
46	3,000	250	1,000	150	2,700		7,100	7,100				0	0	7,100	7,100
47	3,600		1,500	3,150	7,350		15,600	22,700				0	0	15,600	22,700
48	4,860		350		3,650	13,600	22,460	45,160				0	0	22,460	45,160
49	8,740					13,400	22,140	67,300				0	0	22,140	67,300
50	34,500						34,500	101,800				0	0	34,500	101,800
51	27,000						27,000	128,800				0	0	27,000	128,800
52	15,000						15,000	143,800				0	0	15,000	143,800
53	15,500					15,200	30,700	174,500				0	0	30,700	174,500
54	8,900					4,000	12,900	187,400	4,810			4,810	4,810	17,710	192,210
55	12,290					600	12,890	200,290	1,790			1,790	6,600	14,680	206,890
56	11,910						11,910	212,200	3,140			3,140	9,740	15,050	221,940
57	8,120						8,120	220,320	3,880			3,880	13,620	12,000	233,940
58	11,000						11,000	231,320	1,630			1,630	15,250	12,630	246,570
59	14,160						14,160	245,480	4,170			4,170	19,420	18,330	264,900
60	15,410						15,410	260,890	1,000			1,000	20,420	16,410	281,310
61	10,000						10,000	270,890	13,680			13,680	34,100	23,680	304,990
62	5,000						5,000	275,890	1,000			1,000	35,100	6,000	310,990
63	4,760		11,300			7,070	23,130	299,020	3,090			3,090	38,190	26,220	337,210
H/ 1			10,650			1,580	12,230	311,250	870			870	39,060	13,100	350,310
2			5,080			280	5,360	316,610	1,870			1,870	40,930	7,230	357,540
3	70		5,020	560		4,500	10,150	326,760	3,450			3,450	44,380	13,600	371,140
4						9,520	9,520	336,280	10,480			10,480	54,860	20,000	391,140
5						6,650	6,650	342,930	20,150			20,150	75,010	26,800	417,940
6						7,000	7,000	349,930	8,880			8,880	83,890	15,880	433,820
7						5,500	5,500	355,430	1,000			1,000	84,890	6,500	440,320
8						4,500	4,500	359,930	0			0	84,890	4,500	444,820
9						6,500	6,500	366,430	6,300			6,300	91,190	12,800	457,620
10			4,520				4,520	370,950	4,000			4,000	95,190	8,520	466,140
11			5,500				5,500	376,450	5,400			5,400	100,590	10,900	477,040
12			4,100				4,100	380,550	7,900			7,900	108,490	12,000	489,040
13			450				450	381,000	3,700			3,700	112,190	4,150	493,190
14			1,400				1,400	382,400	2,850			2,850	115,040	4,250	497,440
15			370				370	382,770	0			0	115,040	370	497,810
16			850				850	383,620	0			0	115,040	850	498,660
17			975			625	1,600	385,220	0			0	115,040	1,600	500,260
18						1,000	1,000	386,220	0	1,500		1,500	116,540	2,500	502,760
19							0	386,220	0	9,000		9,000	125,540	9,000	511,760
20			835			600	1,435	387,655	795			795	126,335	2,230	513,990

21						0	387,655	0			0	126,335	0	513,990
22		849				849	388,504	0			0	126,335	849	514,839
23						0	388,504	0	387	387	126,722	387	515,226	
24						0	388,504	93		93	126,815	93	515,319	
25						0	388,504			0	126,815	0	515,319	
26						0	388,504	200		200	127,015	200	515,519	
27						0	388,504	660		660	127,675	660	516,179	
28						0	388,504	1,000		1,000	128,675	1,000	517,179	
29						0	388,504	10,000		10,000	138,675	10,000	527,179	
30						0	388,504	7,500		7,500	146,175	7,500	534,679	

伊吹鉾山緑化区域

年度別緑化区域 1/5000

昭和46年～平成24年緑化完了区域	
平成26年度 緑化完了区域	
平成27年度 緑化完了区域	
平成28年度 緑化完了区域	
平成29年度 緑化完了区域	
平成30年度 緑化完了区域	
緑化完了後 採掘地	

昭和46年～平成24年緑化完了面積	
上部区域	126,815m ²
下部区域	388,504m ²



オープンシュート緑化地

2019. 5. 22撮影





下部区域緑化地

2019. 5. 22撮影



上部区域緑化地
2019. 5. 22撮影

令和元年度 緑化事業実施計画書


滋賀鋳産株式会社
伊吹鋳山

令和元年度 緑化計画

緑化区域	計画面積 (㎡)		完了時期	工 法	備 考
		緑 化			
上部区域		5,000	6月、11月	吹付け工法	ソイルシーダーにより吹付け工法で実施する。 吹付けを行う種子は、国産在来種のみを使用する。 一部、伊吹産のヨモギ種子を使用予定。
下部区域 オープンシュート南面		0			
計		5,000			

令和元年度 緑化工法

緑化区域により、以下のような工法を主体として緑化を実施する。

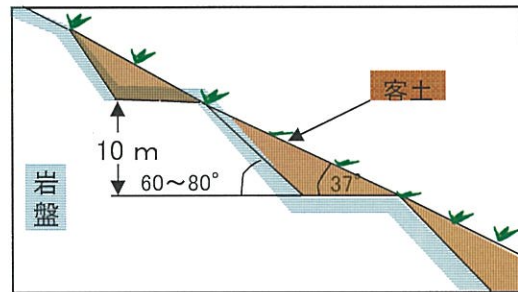

上部区域（原生植物移植、吹き付け工法）
採掘跡地の法面をブルドーザー・ショベルで約 60° ～ 80° に造成し、
ショベルで法面に客土（約 37° ）した後、土羽打ちし、吹き付け工法で行う。
