

<事後評価>

資料2-2
滋賀県公共事業評価監視委員会
令和7年12月22日

緑と賑わいあふれる湖国の都市公園づくり



SHIGAパーク

滋賀県土木交通部都市計画課

◆計画の概要



1. 交付金名 社会資本整備総合交付金
2. 計画名 緑と賑わいあふれる湖国の都市公園づくり
3. 事業主体 滋賀県
4. 事業期間 令和3年度～令和7年度(5年間)
5. 事業数 1事業(金亀公園【彦根総合スポーツ公園】)
6. 目標
 - 令和7年度に開催する国民スポーツ大会を契機として、本格的なスポーツから身近な運動・健康増進の場まで、多様な利用者が多様な楽しみ方のできる場としての都市公園、地域観光の拠点となる都市公園の整備を推進する。
 - 金亀公園において、滋賀県のスポーツ振興に資するとともに、多様なレクリエーション機能を備えた、賑わいの創出につながる施設を整備し、利用促進を目指す
7. 計画の成果目標(定量的指標)

金亀公園の公園利用者数の増加

R2年度0万人 ⇒ R7年度22万人

◆事業の概要




①都市公園事業(金亀公園整備事業)

運動施設および園路等整備 R3～4のみ本交付金を充当



金亀公園
(彦根総合スポーツ公園)

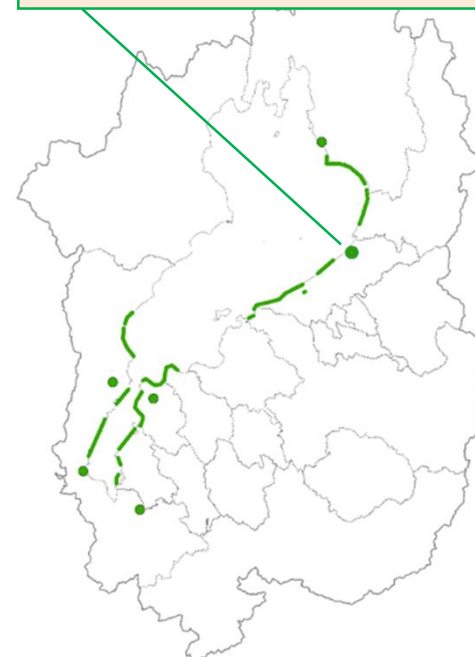

◆事後評価の審議内容



(1) 事業の進捗状況※1

(2) 事業効果の発現状況※1

(3) 評価指標の目標値の実現状況※1

(4) 主要な事業に関する事項※2

1. 事業を巡る社会経済情勢等の変化
2. 事業採択時の費用対効果分析の要因の変化
3. コスト縮減および代替案立案等の可能性
4. その他必要と考えられる事項

全ての事業が完了し、要綱に定める要件に該当する事業がないことから、対象外とした。

※1. 滋賀県公共事業等計画評価実施要綱第3—1

※2. 滋賀県公共事業等計画評価実施要綱第3—2

◆ (1) 事業の進捗状況



■ 計画期間内(～R7)の完了を目標に事業を推進。本交付金の活用終了後も、別交付金で事業を進め、**国スポまでに行う予定であった整備は完了。**

事業主体	事業数	計画期間内 (R7年度末まで) に 完了を予定していた 事業数 (a)	計画完了時点 (R7年度末まで) に 完了した事業数 (b)	進捗率 (b)/(a)
合計	1事業	1事業	1事業	100%

◆ (2) 事業効果の発現状況



◆ (2) 事業効果の発現状況



左上 国スポ開会式

右上 国スポ閉会式


左 レイラック滋賀FC
JFL公式戦

◆ (3) 評価指標の目標値の実現状況



■ R 7 年度の目標 2 2 万人に対して、R 7 年度 2 9 万人となり、**目標を達成**

※10月末時点

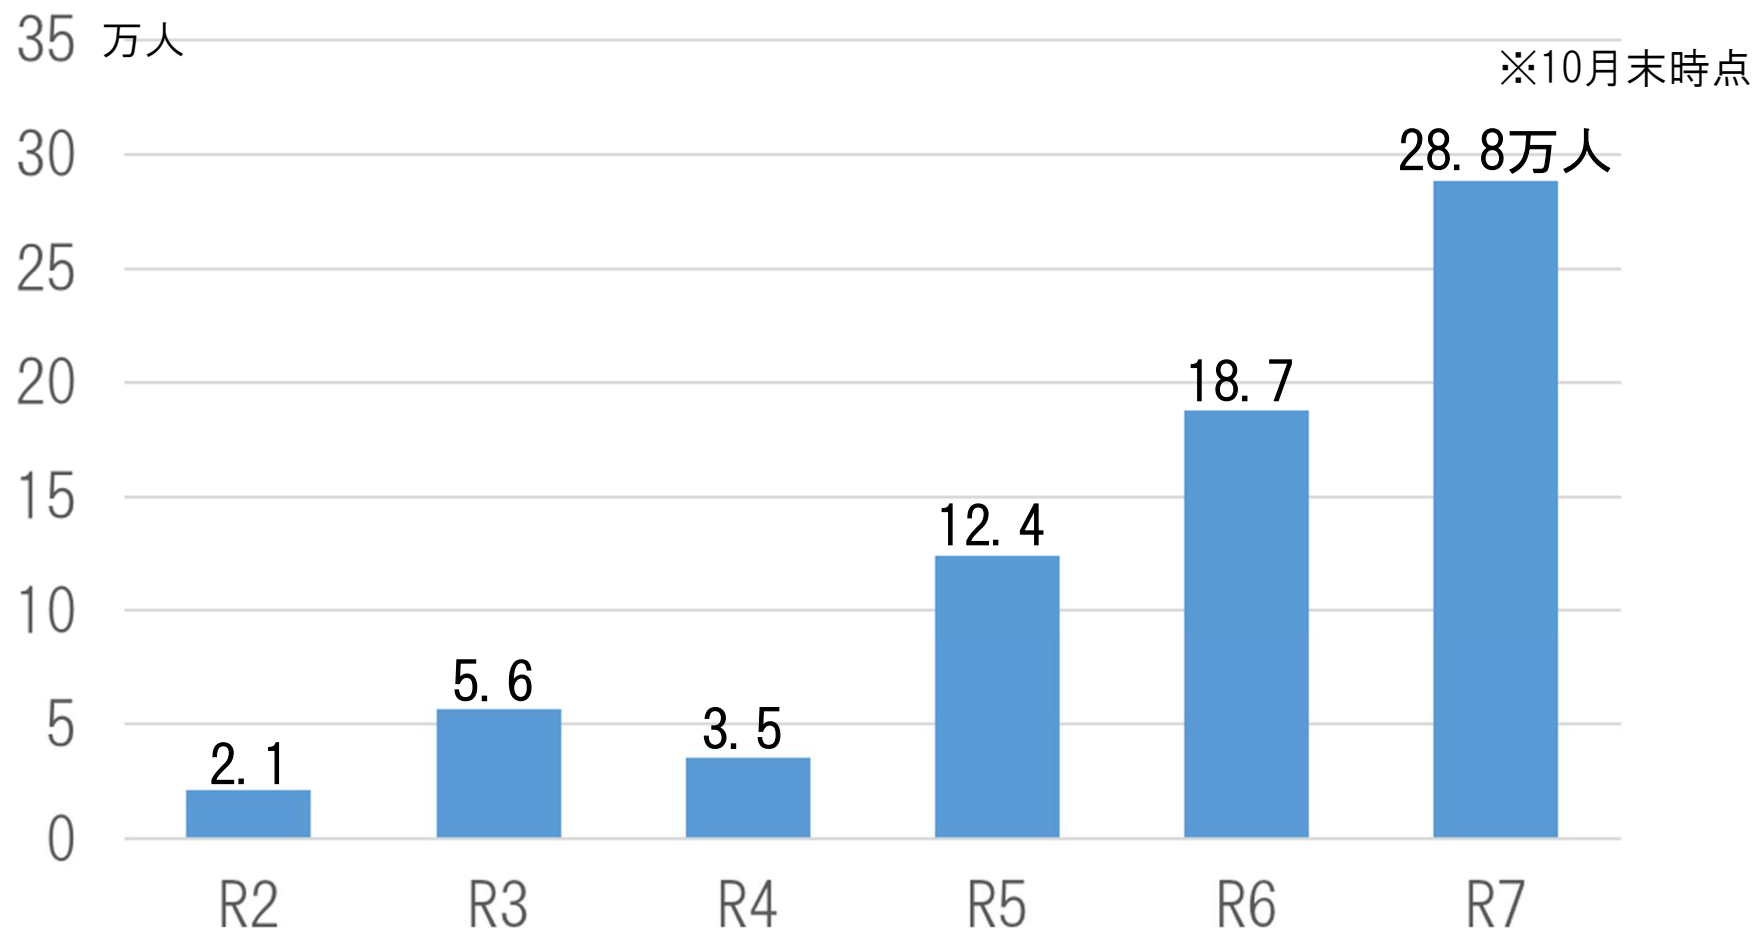

◆まとめ



(1)事業の進捗状況

実施事業は**完了**。

(2)事業効果の発現状況

賑わいの創出につながっていることが確認できた。

(3)評価指標の目標値の実現状況

目標となる公園利用者数が達成されていることが確認できた。

(4)主要な事業に関する事項

要綱の要件に**該当する事業がない**ことから、対象外とした。

◆今後の方針(案)



● 今後は、本格的なスポーツから、身近な運動・健康増進まで、多様な利用者が多様な楽しみ方のできる場として、さらなる利用促進に取り組んでいく。
