

資料2-2  
滋賀県公共事業評価監視委員会  
令和8年3月9日

# 社会資本整備総合交付金の事後評価について

～滋賀県内における災害に強い住まい・まちづくり(第2期計画)～

滋賀県土木交通部建築課建築指導室

## 1:事後評価の対象となる整備計画

### ■整備計画名

滋賀県内における災害に強い住まい・まちづくり(第2期計画)

### (1)事業主体・計画目標

#### ■事業主体


滋賀県および県内8市町(大津市、彦根市、長浜市、近江八幡市、草津市、  
守山市、野洲市、甲良町)

#### ■事業期間

令和3年度～令和7年度

#### ■計画目標

災害に対し被害を最小限に抑え、安心で安全な住まい・まちづくりを目的に、県民に対し災害に備えることの意識向上を図り、住宅・建築物耐震化等の防災・減災対策に取り組む

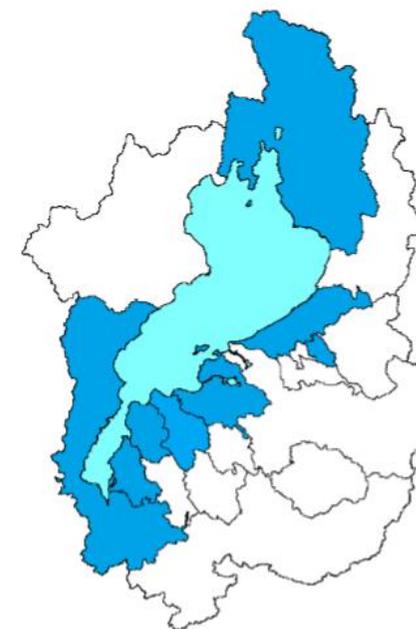

# 1:事後評価の対象となる整備計画

## (2) 定量的指標

定量的指標	当初現況値 (R03年度当初)	最終目標値 (R07年度末)
指定道路図の整備率	88%	100%
狭あい道路拡幅整備率	74%	100%

※指定道路図の整備率＝(調査・判定済の狭あい道路本数)/(県内の狭あい道路本数)

※狭あい道路拡幅整備率＝(拡幅した狭あい道路延長)/(令和7年度までに拡幅を計画する狭あい道路延長)

## (3) 計画事業費

交付対象事業	要素事業名	計画事業費 (単位:百万円)
基幹事業	狭あい道路整備等促進事業	267
全体事業費		267

# 1:事後評価の対象となる整備計画

国土交通省「狭あい道路対策に関するガイドライン」より


## (4)事業概要

### ●「狭あい道路整備等促進事業」について

- ①狭あい道路情報整備等事業(ソフト事業)  
(法42条第2項道路等の指定道路図作成に係る調査およびデータベース作成)
- ②狭あい道路拡幅整備事業(ハード事業)  
(狭あい道路の調査、用地取得等作業および拡幅・整備工事)

### ●「狭あい道路」の定義

- ①建築基準法(以下「法」という。)第42条第2項、第3項の指定を受けた道路
- ②法の指定を受けていない道路
- ③法の種別、位置が明確でない道路  
(都市計画区域外の道路も対象)

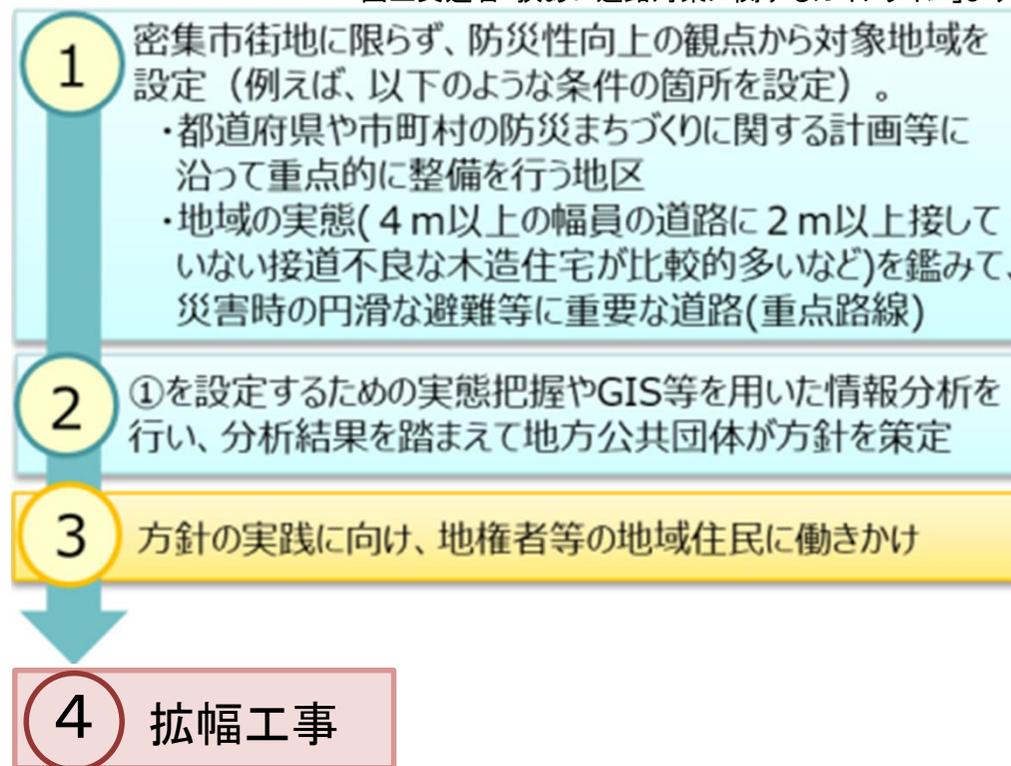

## 2: 整備計画の事後評価 (1)事業効果の発現状況

### ①狭あい道路情報等整備事業

■事業主体: 特定行政庁

■事業費: 71,995千円  
(令和3年度～令和7年度)

■事業概要


狭あい道路(建築基準法第42条第2項、3項の指定を受けた道路および建築基準法の指定を受けていない・明確でない道路)の情報整備。

■整備状況

整備が完了。

### 事業実施例

- 整備箇所: 滋賀県所管管内
- 調査路線数: 1,362本
- 事業期間: 令和3年度～令和7年度
- 事業費: 71,995千円

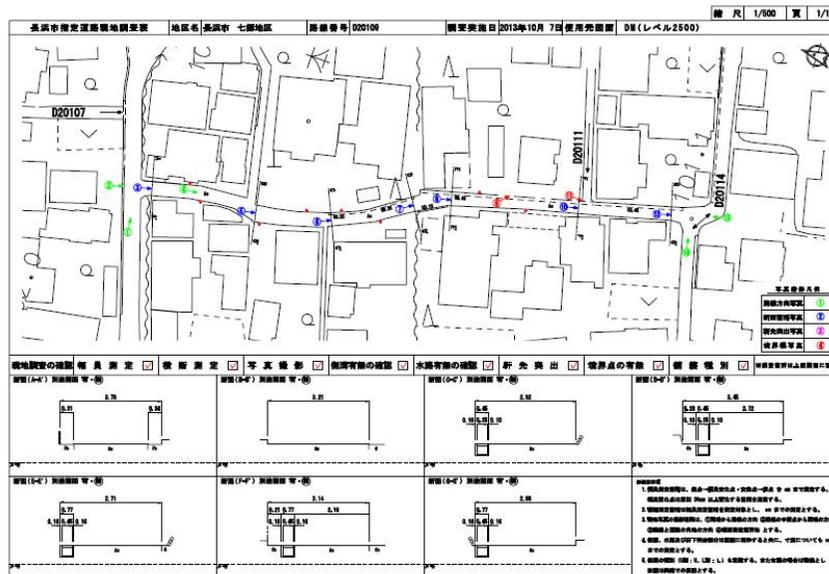

指定道路図現地調査票



指定道路図データベース画面

## 2: 整備計画の事後評価 (1)事業効果の発現状況

### ②狭あい道路拡幅整備事業

■実施主体:各市町

■事業費:195,211千円  
(令和3年度～令和7年度)

■事業概要

狭あい道路の拡幅整備のための調査・測量・用地取得・分筆登記および道路の築造。

■整備状況

令和3年度から令和7年度までの5カ年で拡幅整備を行った道路延長は2,568m。

### 事業実施例

- 整備箇所:大津市真野普門一丁目(市道北1309号線)
- 整備延長:約24m
- 事業費:3,809千円
- 工期:令和4年度～令和5年度
- 道路幅:(工事前):2.0m～2.7m (工事後):3.0m～3.6m

整備前



整備後



## 2: 整備計画の事後評価 (2)計画の成果目標の実現状況

### ■ 計画期間における実績値

定量的指標	当初現況値 (R03年度当初)	最終目標値 (R07年度末)	実績値 (R07年度末)
指定道路図の整備率	88%	100%	100%

最終目標値



※指定道路図の整備率=(調査・判定済の狭あい道路本数)/(県内の狭あい道路本数)

### ■ 計画期間における指定道路図の整備状況

特定行政庁名	対象調査道路本数	現況調査道路本数 (R03年度当初)	実績調査道路本数 (R07年度末)
滋賀県	12,893本	11,531本	12,893本

※大津市、彦根市、長浜市、近江八幡市、草津市、守山市、東近江市、近江八幡市はR03年度以前に整備済

## 2: 整備計画の事後評価 (2)計画の成果目標の実現状況

### ■ 計画期間における実績値

定量的指標	当初現況値 (R03年度当初)	最終目標値 (R07年度末)	実績値 (R07年度末)
狭あい道路拡幅整備率	74%	100%	90%

最終目標値



※狭あい道路拡幅整備率 = (拡幅した狭あい道路延長) / (令和7年度までに拡幅を計画する狭あい道路延長)

### ■ 令和7年度までに拡幅した狭あい道路延長(見込み)

	実施市町	拡幅した道路延長/計画期間 内で整備予定の道路延長		実施市町	拡幅した道路延長/計画期間内 で整備予定の道路延長
1	大津市	1,910m/1,944m	5	守山市	50m/ 50m
2	彦根市	70m/ 250m	6	野洲市	50m/ 150m
3	長浜市	234m/ 330m	7	甲良町	106m/ 106m
4	草津市	149m/ 50m			

### 3: 今後の方針

- ・住宅市街地の安全対策を講じ、被災時の応急対策を迅速に行えるよう狭あい道路の拡幅等を推進する取り組みが必要。

次期計画では引続き、狭あい道路の拡幅整備の目標値を令和12年度末までに100%とし、事業を進めていく。
