


# 《旧RD最終処分場二次対策工事 工事情報 第253号 をお知らせいたします》

作成日：平成31年1月7日

工種・作業内容	日付	施工実績							施工予定												備考			
		12月							平成31年1月															
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金		土	日	
① 廃棄物土掘削工	①-1 D・E工区																						休	
② 有害物掘削工	①-2 廃棄物土乾燥 C区画 掘削 支保工																							工
③ 選別土仮置・盛土工	F、G区画 掘削 支保工																							
④ 選別処理工	選別土仮置・埋戻し																							
⑤ 底面・側面遮水工	一次選別(粗選別) 二次選別(機械選別)																							
⑥ 洪水調整設備工	D工区(全巡回) 底面粘土層修復工No.6付近																							
汚染地下水拡散防止対策工	B工区																							

【工事施工予定位置図】

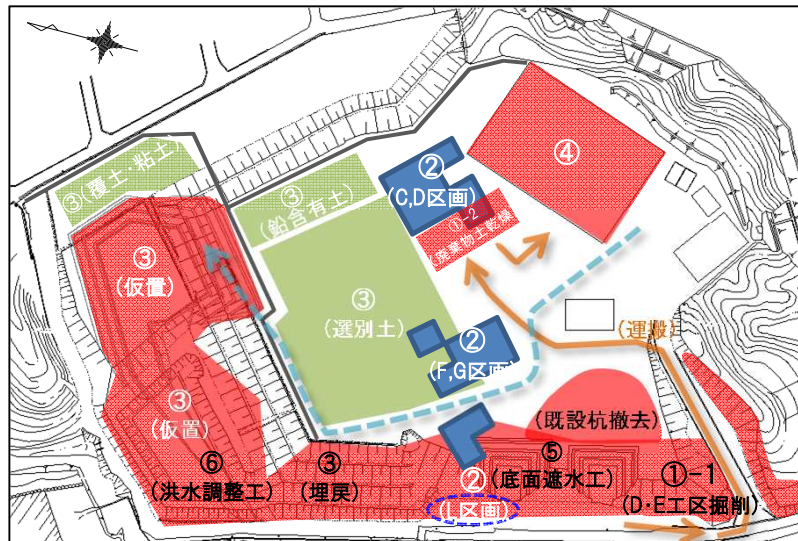

【工事施工状況写真】

撮影日：平成31年1月7日



② 有害物掘削  
C区画の三段目支保工を設置しています。



② 有害物掘削工  
FG区画の二次掘削を行っています。



④ 選別処理工  
選別された25～50mm選別土です。

【お知らせ】

・第27回旧RD最終処分場問題連絡協議会を下記のとおり開催します。

日時：平成31年1月11日(金) 19時00分～  
場所：栗東市コミュニティセンター 治田東

# 《騒音・振動・粉じん・臭気自動計測の週間結果報告》


(報告対象期間: 12月28日 ~ 1月3日)

## 【概要】

二次対策工事による周辺環境への影響を調査するために、旧RD最終処分場と隣接する住宅地との境界に計測器を設置し、「騒音・振動・粉じん・臭気」を連続自動計測しています。  
各項目の1週間分の計測結果をグラフにしました。  
※網掛け部は休工の時間帯(休日および夜間)です。


主な実施作業内容	平成30年12月				平成31年1月			備考
	28 金	29 土	30 日	31 月	1 火	2 水	3 木	
廃棄物土・有害物掘削工	種場内養生備各				休工			
(1)選別土仮置・盛土工 C・D・E工区埋戻								
廃棄物土・有害物掘削工								
(2)廃棄物土掘削工 D・E工区 C区画 F・G区画								
廃棄物選別工								
(3)選別処理施設工								

## 【位置図】

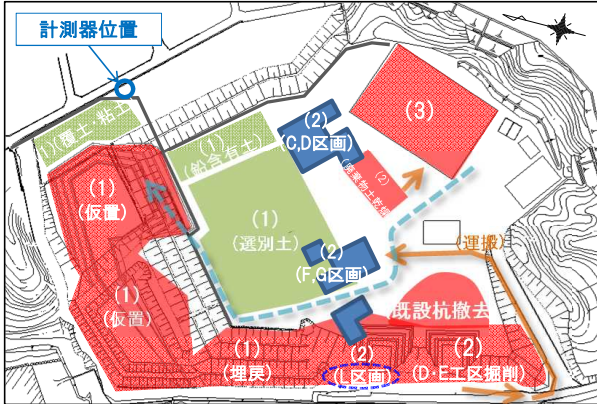


## 【騒音】

(特になし)

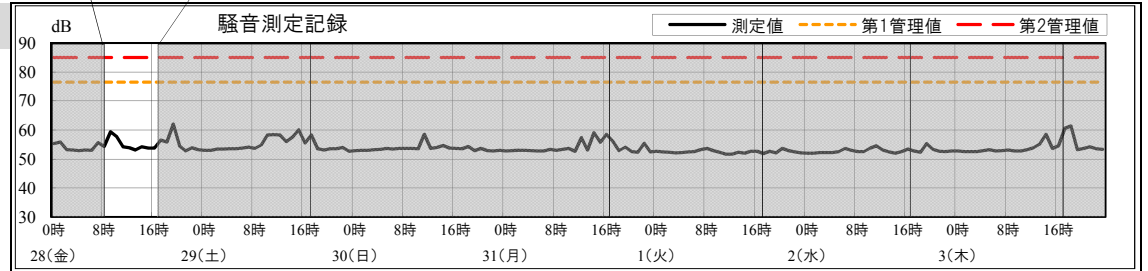

## 【振動】

(特になし)

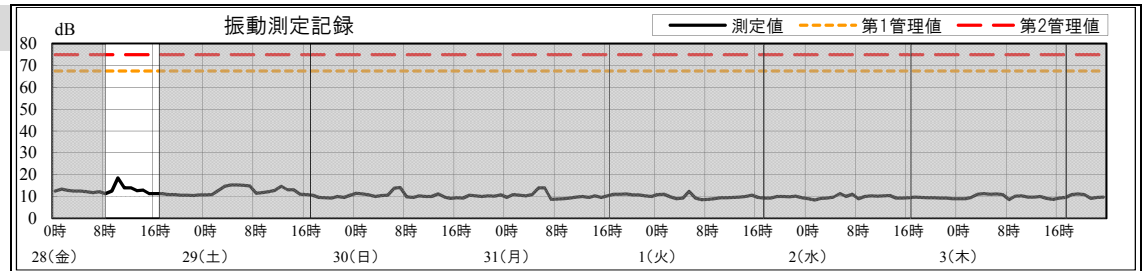


## 【測定値管理基準】

	騒音	振動	粉じん	臭気
第1管理値 (基準値の90%)	76dB	67dB	0.18mg/m <sup>3</sup>	10(センサー値)
第2管理値 (基準値)	85dB	75dB	0.2mg/m <sup>3</sup>	10
基準値	85dB 栗東市の特定建設作業(騒音)に係る規制基準	75dB 栗東市の特定建設作業(振動)に係る規制基準	0.2mg/m <sup>3</sup> 環境省「大気汚染に係る環境基準」の「環境上の条件・浮遊粒子状物質」記載基準	10(硫化水素臭などの異臭) 草津市「臭気指数規制基準 第1種地域 敷地境界線(第1号)」記載基準

## 【粉じん】

(特になし)

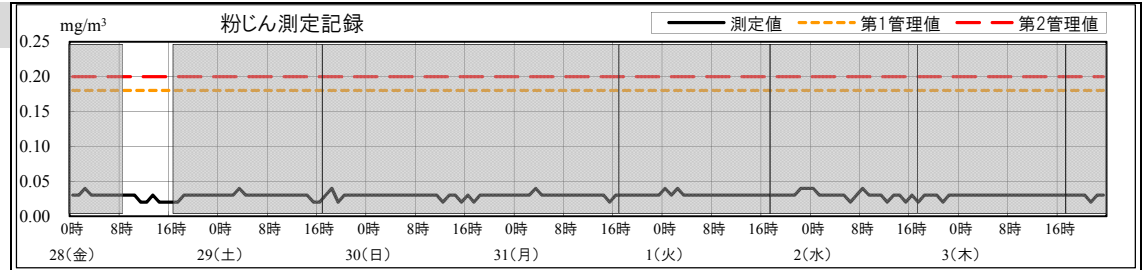

## 第1管理値を超過した場合

騒音 振動 粉じん	作業を一旦中断し注意喚起した後、警戒しつつ作業を行います
臭気	作業を一旦中断し、現場の監督員が直接臭いを確認します

## 第2管理値を超過した場合

騒音 振動 粉じん	直ちに作業を中断し、周辺7自治会長に連絡し原因究明後、対策を講じ作業を再開します
臭気	臭いの確認により硫化水素臭などの異臭がした場合には、直ちに作業を中断し、周辺7自治会長に連絡し対策を講じたうえで作業を再開します

## 【臭気】

(特になし)

