

《旧RD最終処分場二次対策工事 工事情報 第177号 をお知らせいたします》


作成日：平成29年7月18日

工種・作業内容	日付	施工実績							施工予定														備考									
		平成29年7月																														
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日										
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30												
廃棄物土・有害物掘削工																																
① 廃棄物土掘削工	①-1 D・E工区、H区画掘削 ①-2 廃棄物土乾燥 ①-3 B工区掘削	D・E工区、H区画掘削						廃棄物土乾燥						D・E工区、H区画掘削						廃棄物土乾燥												
② 選別土仮置・盛土工	②-1 選別土移動 ②-2 A工区仮置							連壁内掘削																		A工区仮置、B工区一部埋戻し						休
廃棄物選別工																																
③ 選別処理工	一次選別(粗選別) 二次選別(機械選別)	廃棄物土粗選別						連壁内掘削						廃棄物土粗選別						連壁内掘削						廃棄物土粗選別						
汚染地下水拡散防止対策工																																
④ 底面・側面遮水工	B工区																									機材搬入・キャブレション・改良土造成						工
⑤ 浸透水貯留層工	B工区 再生材埋戻し																															
⑥ 浸透水取水設備工	B工区 揚水ピット																															

【工事施工予定位置図】

【工事施工状況写真】

撮影日：平成29年7月13日

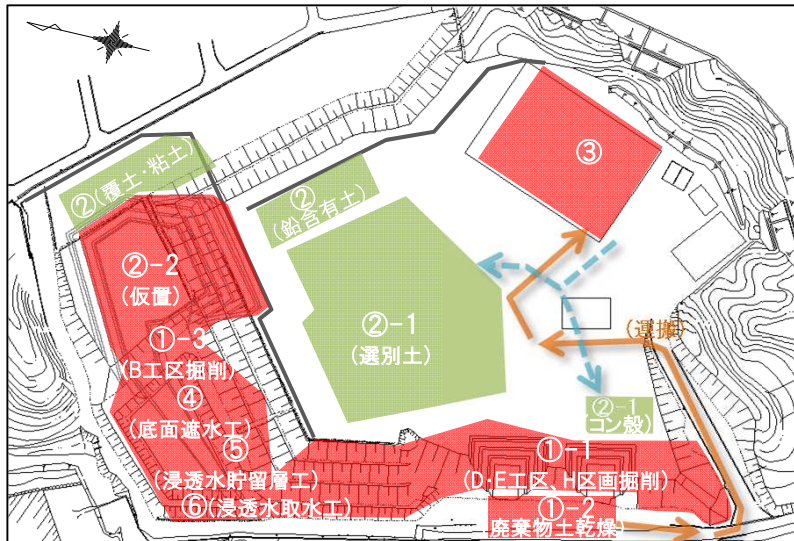

①-1 D・E工区、H区画掘削
H区画の掘削をしています。



①-3 B工区掘削
浸透水貯留層を設置するため、連続壁内の沖積層の土砂を標高122mまで掘削しています。



その他
B工区から掘削し、場内に仮置きしていた家庭系ごみを場外搬出しています。

【お知らせ】

《騒音・振動・粉じん・臭気自動計測の週間結果報告》


(報告対象期間:7月7日～7月13日)

【概要】

二次対策工事による周辺環境への影響を調査するために、旧RD最終処分場と隣接する住宅地との境界に計測器を設置し、「騒音・振動・粉じん・臭気」を連続自動計測しています。
各項目の1週間分の計測結果をグラフにしました。
※網掛け部は休工の時間帯(休日および夜間)です。


主な実施作業内容	平成29年7月							備考
	7 金	8 土	9 日	10 月	11 火	12 水	13 木	
廃棄物土・有害物掘削工								
(1)選別土仮置・盛土工	A工区仮置							A工区仮置
選別土移動								
A工区仮置								
廃棄物土・有害物掘削工								
(2)廃棄物土掘削工	B・D・E工区、H区画掘削							掘削
廃棄物選別工								
(3)選別処理施設工	運転							運転

【位置図】

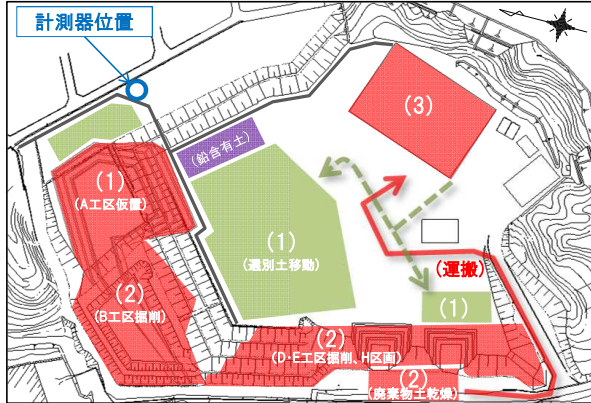


【騒音】

7月10日16時から騒音値が高くなっているのは、雷雨の影響です。

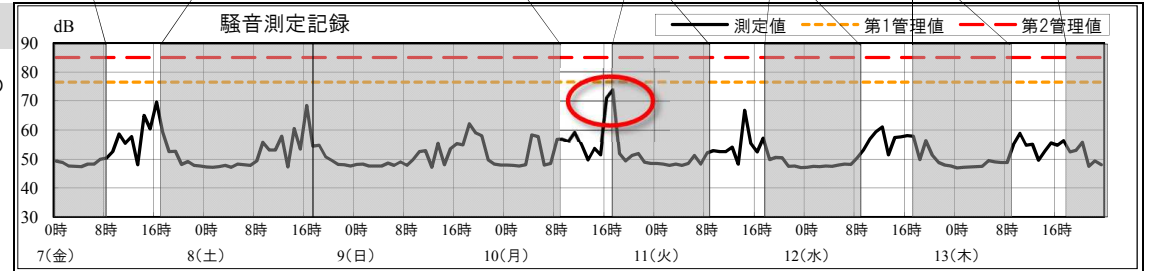

【振動】

(特になし)

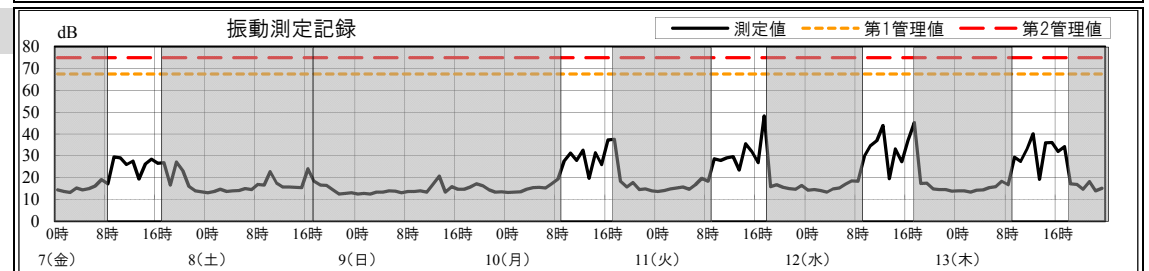


【測定値管理基準】

	騒音	振動	粉じん	臭気
第1管理値 (基準値の90%)	76dB	67dB	0.18mg/m ³	10(センサ-値)
第2管理値 (基準値)	85dB	75dB	0.2mg/m ³	10
基準値	85dB 栗東市の特定建設作業(騒音)に係る規制基準	75dB 栗東市の特定建設作業(振動)に係る規制基準	0.2mg/m ³ 環境省『大気汚染に係る環境基準』の「環境上の条件・浮遊粒子状物質」記載基準	10(硫化水素臭などの異臭) 津津市「臭気指数規制基準 第1種地域 敷地境界線(第1号)」記載基準


【粉じん】

(特になし)

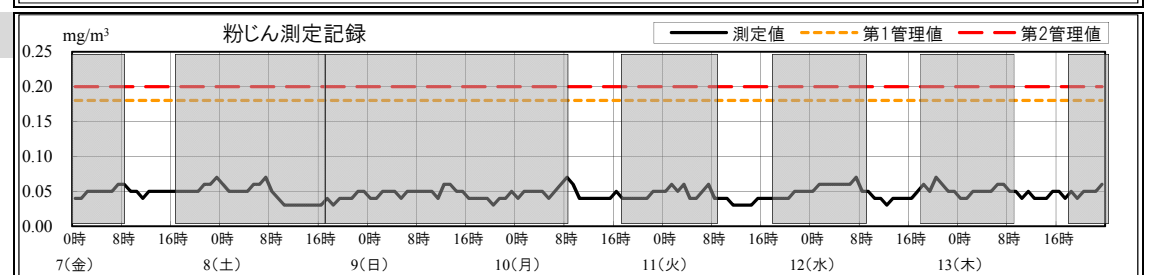

【臭気】

(特になし)

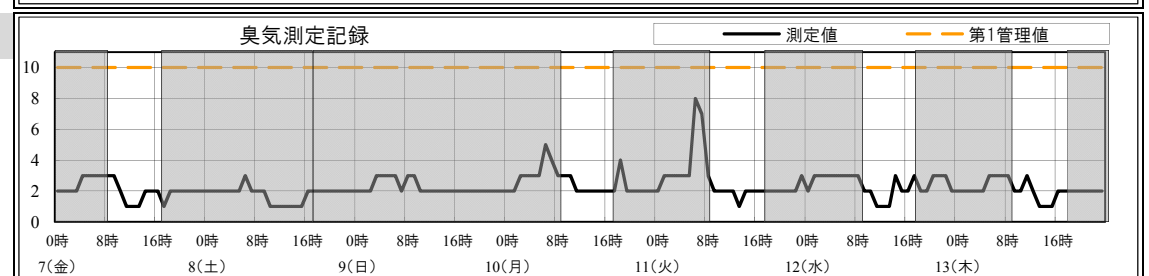

第1管理値を超過した場合

騒音 振動 粉じん	作業を一旦中断し注意喚起した後、警戒しつつ作業を行います
臭気	作業を一旦中断し、現場の監督員が直接臭いを確認します

第2管理値を超過した場合

騒音 振動 粉じん	直ちに作業を中断し、周辺7自治会長に連絡し原因究明後、対策を講じ作業を再開します
臭気	臭いの確認により硫化水素臭などの異臭がした場合には、直ちに作業を中断し、周辺7自治会長に連絡し対策を講じたうえで作業を再開します
