


# 《旧RD最終処分場二次対策工事 工事情報 第162号 をお知らせいたします》

作成日：平成29年4月3日

日付	施工実績							施工予定							備考							
	平成29年3月							平成29年4月														
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日								
工種・作業内容	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
廃棄物土・有害物掘削工																						
① 廃棄物土掘削工	①-1 D・E工区掘削							休	D・E工区掘削							休						
	①-2 廃棄物土乾燥								廃棄物土乾燥													
② 選別土仮置・盛土工	②-1 選別土移動								選別土仮置													
	②-2 A工区埋戻し							A工区埋戻し														
③ 止水連続壁工	止水連続壁工							プラント、機械搬入														
廃棄物選別工																						
④ 選別処理工	一次選別(粗選別)							工	廃棄物土粗選別							工						
	二次選別(機械選別)								運転													

## 【工事施工予定位置図】

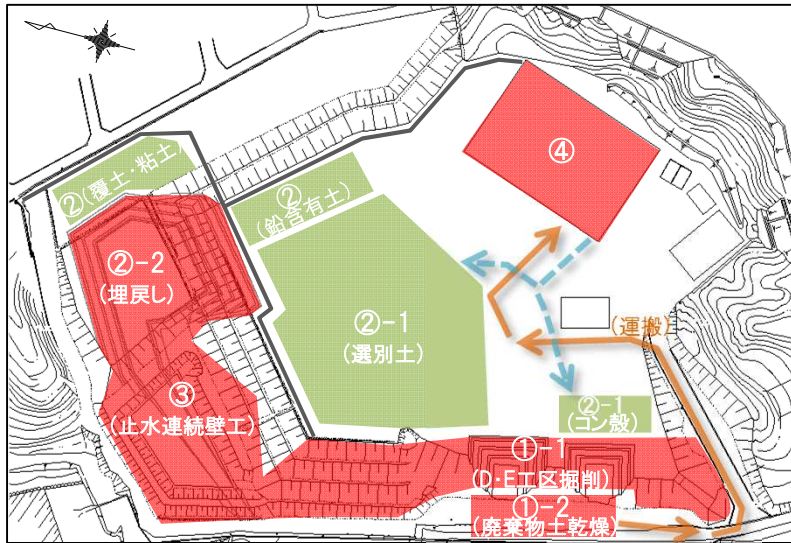

## 【工事施工状況写真】

撮影日：平成29年3月30日



①-1 D・E工区掘削

E工区の掘削状況です。



②-2 A工区埋戻し

A工区を埋め戻しています。



③ 止水連続壁工

止水連続壁工のプラントや機械を搬入し、設置しています。

## 【お知らせ】


# 《騒音・振動・粉じん・臭気自動計測の週間結果報告》

(報告対象期間:3月24日 ~ 3月30日)

## 【概要】

二次対策工事による周辺環境への影響を調査するために、IBRD最終処分場と隣接する住宅地との境界に計測器を設置し、「騒音・振動・粉じん・臭気」を連続自動計測しています。  
各項目の1週間分の計測結果をグラフにしました。  
※網掛け部は休工の時間帯(休日および夜間)です。

## 【位置図】

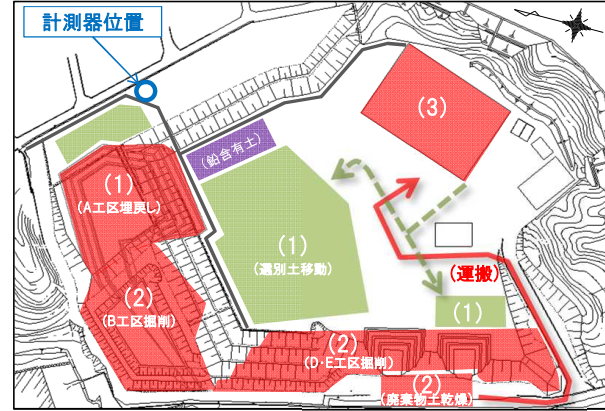

## 【測定値管理基準】

	騒音	振動	粉じん	臭気
第1管理値 (基準値の90%)	76dB	67dB	0.18mg/m <sup>3</sup>	10(センサ-値)
第2管理値 (基準値)	85dB	75dB	0.2mg/m <sup>3</sup>	10
基準値	85dB 栗東市の特定建設作業(騒音)に係る規制基準	75dB 栗東市の特定建設作業(振動)に係る規制基準	0.2mg/m <sup>3</sup> 環境省『大気汚染に係る環境基準』の「環境上の条件・浮遊粒子状物質」記載基準	10(硫化水素臭などの臭気) 草津市「臭気指数規制基準 第1種地域 敷地境界線(第1号)」記載基準

## 第1管理値を超過した場合

騒音 振動 粉じん	作業を一旦中断し注意喚起した後、警戒しつつ作業を行います
臭気	作業を一旦中断し、現場の監督員が直接臭いを確認します


## 第2管理値を超過した場合

騒音 振動 粉じん	直ちに作業を中断し、周辺7自治会長に連絡し原因究明後、対策を講じ作業を再開します
臭気	臭いの確認により硫化水素臭などの異臭がした場合には、直ちに作業を中断し、周辺7自治会長に連絡し対策を講じたうえで作業を再開します

主な実施作業内容	平成29年3月							備考
	24 金	25 土	26 日	27 月	28 火	29 水	30 木	
廃棄物土・有害物掘削工			休 工					
(1)選別土仮置・盛土工	選別土仮置 A工区埋戻			選別土仮置・A工区埋戻				
廃棄物土・有害物掘削工								
(2)廃棄物土掘削工	D・E工区掘削		掘削					
廃棄物選別工								
(3)選別処理施設工			運転					


## 【騒音】

(特になし)

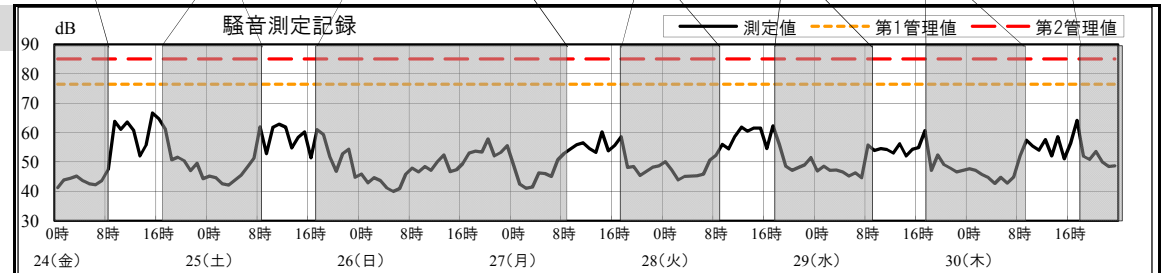


## 【振動】

(特になし)

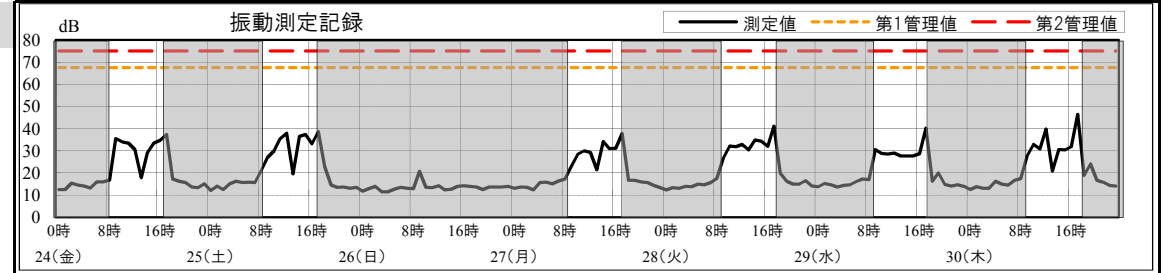

## 【粉じん】

(特になし)

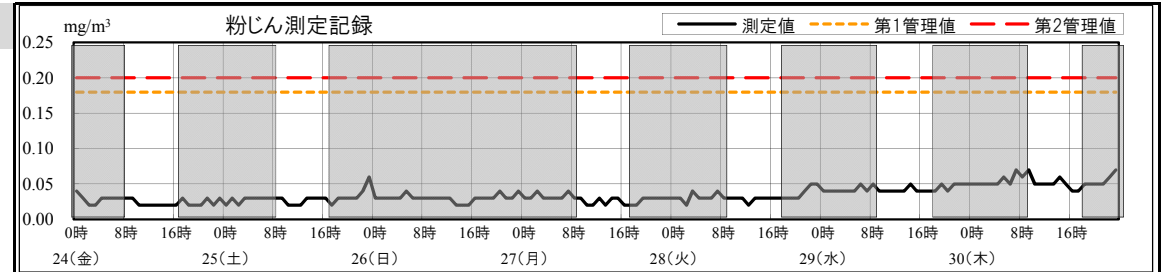

## 【臭気】

(特になし)

