


《旧RD最終処分場二次対策工事 工事情報 第147号 をお知らせいたします》

作成日：平成28年12月12日

日付	施工実績										施工予定										備考	
	平成28年12月										平成28年12月											
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土		日
工種・作業内容	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
廃棄物土・有害物掘削工																						
① 廃棄物土掘削工	①-1 C・D工区掘削										C・D工区掘削										休	休
	①-2 廃棄物土乾燥										C・D工区掘削											
	①-3 B工区掘削										B工区掘削											
② 選別土仮置・盛土工	②-1 選別土移動										選別土仮置										休	休
	②-2 A工区埋戻し										A工区埋戻し											
廃棄物選別工																						
③ 選別処理工	一次選別(粗選別)										廃棄物土粗選別										工	工
	二次選別(機械選別)										運転											

第18回連絡協議会

【工事施工予定位置図】

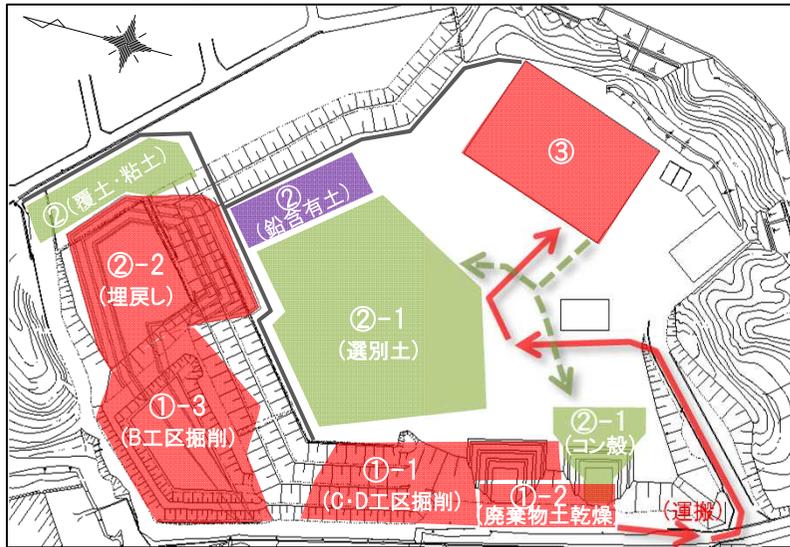

【工事施工状況写真】

撮影日：平成28年12月9日



①-2 廃棄物土乾燥
掘削した廃棄物土を乾燥させています。



①-3 B工区掘削
B工区の廃棄物土を掘削しています。



②-2 A工区埋戻し
A工区の埋戻しを行っています。

【お知らせ】

・ 第18回旧RD最終処分場問題連絡協議会を下記のとおり開催します。
日時：平成28年12月22日(木) 19時00分～
場所：栗東市コミュニティセンター治田東

・ 12月8日(木)にB工区において、袋に梱包された廃石綿 約4m³を発見しました。
全ての袋をそのままフレコンバックに袋詰めしたうえ、現在処分場内で適切に保管しております。
なお、作業による飛散等はありません。
今後、業者を決定し、速やかに場外搬出・処分する予定です。

《騒音・振動・粉じん・臭気自動計測の週間結果報告》

(報告対象期間:12月2日～12月8日)

【概要】

二次対策工事による周辺環境への影響を調査するために、IBRD最終処分場と隣接する住宅地との境界に計測器を設置し、「騒音・振動・粉じん・臭気」を連続自動計測しています。

各項目の1週間分の計測結果をグラフにしました。
※網掛け部は休工の時間帯(休日および夜間)です。

【位置図】



【測定値管理基準】

	騒音	振動	粉じん	臭気
第1管理値 (基準値の90%)	76dB	67dB	0.18mg/m ³	10(センサ-値)
第2管理値 (基準値)	85dB	75dB	0.2mg/m ³	10
基準値	85dB 栗東市の特定建設作業(騒音)に係る規制基準	75dB 栗東市の特定建設作業(振動)に係る規制基準	0.2mg/m ³ 環境省『大気汚染に係る環境基準』の「環境上の条件・浮遊粒子状物質」記載基準	10(硫化水素臭などの異臭) 草津市「臭気指数規制基準 第1種地域 敷地境界線(第1号)」記載基準

第1管理値を超過した場合

騒音 振動 粉じん	作業を一旦中断し注意喚起した後、警戒しつつ作業を行います
臭気	作業を一旦中断し、現場の監督員が直接臭いを確認します


第2管理値を超過した場合

騒音 振動 粉じん	直ちに作業を中断し、周辺7自治会長に連絡し原因究明後、対策を講じ作業を再開します
臭気	臭いの確認により硫化水素臭などの異臭がした場合には、直ちに作業を中断し、周辺7自治会長に連絡し対策を講じたうえで作業を再開します

主な実施作業内容	平成28年12月								備考
	2 金	3 土	4 日	5 月	6 火	7 水	8 木		
廃棄物土・有害物掘削工			休 工						
(1)選別土仮置・盛土工	選別土仮置 A工区埋戻	選別土仮置・A工区埋戻		選別土仮置・A工区埋戻					
廃棄物土・有害物掘削工									
(2)廃棄物土掘削工	B工区掘削 C・D工区掘削	掘削		掘削					
廃棄物選別工									
(3)選別処理施設工				運転					


【騒音】

(特になし)

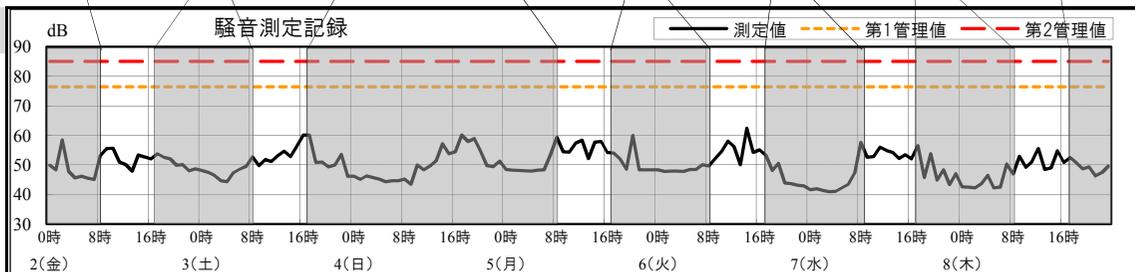


【振動】

(特になし)

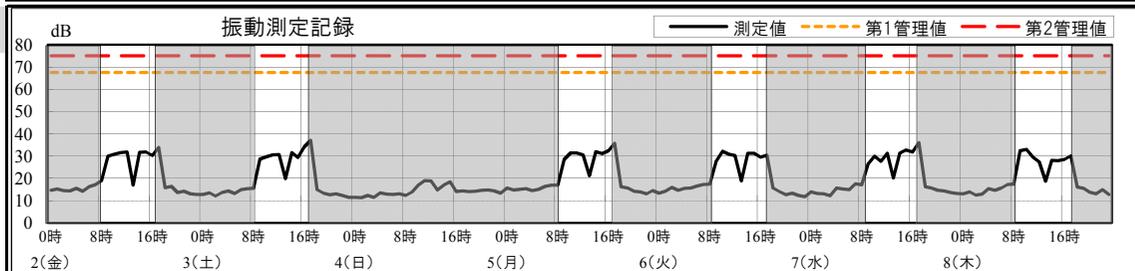

【粉じん】

(特になし)

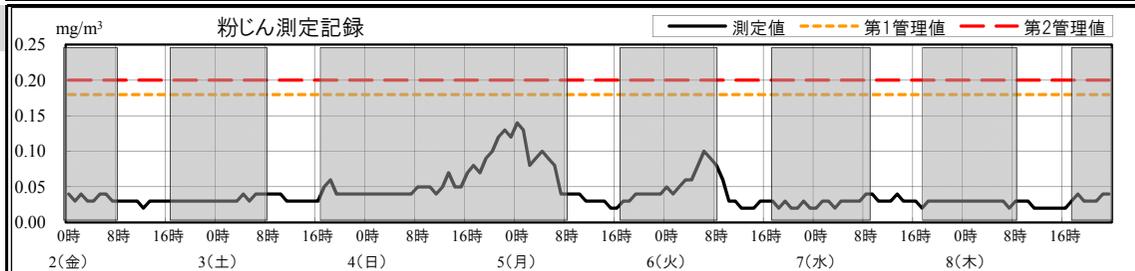

【臭気】

(特になし)

