


《旧RD最終処分場二次対策工事 工事情報 第129号 をお知らせいたします》

作成日：平成28年8月8日

| 日付 | 施工実績 | | | | | | | 施工予定 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|-------------|---------|---|---|---|---|---|---|------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 平成28年8月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 工種・作業内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 廃棄物土・有害物掘削工 | | | | | | | | 休 | | | | | | | 休 | | | | | | | |
| ① 廃棄物土掘削工 | 現場見学会 | | | | | | | 休 | | | | | | | 休 | | | | | | | |
| ② 選別土仮置・盛土工 | 現場見学会 | | | | | | | 休 | | | | | | | 休 | | | | | | | |
| ③ 選別処理工 | 現場見学会 | | | | | | | 休 | | | | | | | 休 | | | | | | | |
| ④ 底面・側面遮水工 | 現場見学会 | | | | | | | 休 | | | | | | | 休 | | | | | | | |

【工事施工予定位置図】

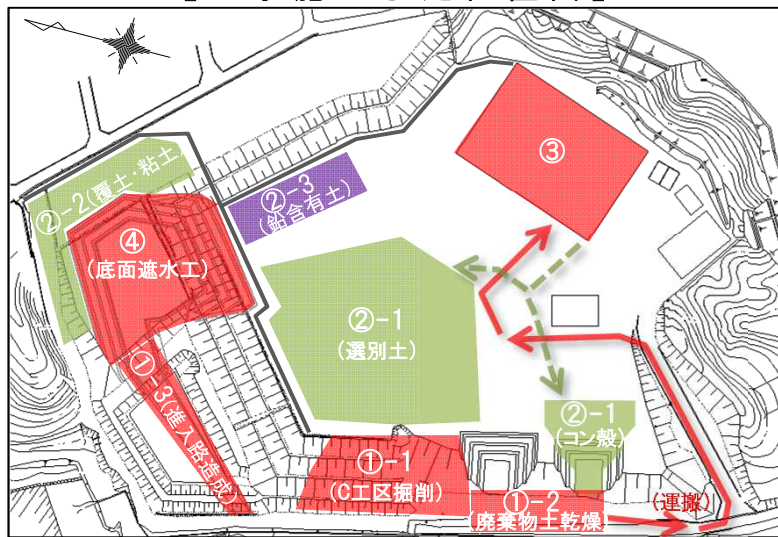

【工事施工状況写真】

撮影日：平成28年8月5日



①-2 廃棄物土乾燥

A工区で掘削した廃棄物土を乾燥させたあと選別ヤードへ運搬しています。



①-3 進入路造成

A工区での底面遮水工に先立ち、進入路の造成を行っています。



③ 選別処理工

自走式スクリーン + 重機 + 人力にて一次選別(粗選別)を行っています。

【お知らせ】

・平成28年8月11日(木)～平成28年8月16日(火)の間は休工します。

休工中は場内を閉鎖し、1日に2回の巡回・点検を行います
万が一異状を発見されましたら、お手数ですが下記の番号までご連絡ください。

[休工中の連絡先] 発注者：滋賀県 最終処分場特別対策室 090-1441-7108
受注者：鴻池・不動テトラ・八田建設JV 090-5034-6832

・第17回旧RD最終処分場問題連絡協議会を下記のとおり開催します。

日時：平成28年9月5日(月) 19時00分～
場所：栗東市コミュニティセンター 治田東


《騒音・振動・粉じん・臭気自動計測の週間結果報告》

(報告対象期間:7月29日～8月4日)

【概要】

二次対策工事による周辺環境への影響を調査するために、IBRD最終処分場と隣接する住宅地との境界に計測器を設置し、「騒音・振動・粉じん・臭気」を連続自動計測しています。
 各項目の1週間分の計測結果をグラフにしました。
 ※網掛け部は休工の時間帯(休日および夜間)です。

【位置図】

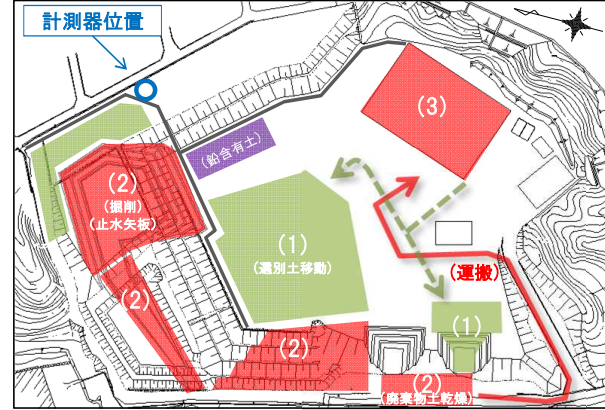

【測定値管理基準】

| | 騒音 | 振動 | 粉じん | 臭気 |
|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|--|
| 第1管理値 (基準値の90%) | 76dB | 67dB | 0.18mg/m ³ | 10(センサ-値) |
| 第2管理値 (基準値) | 85dB | 75dB | 0.2mg/m ³ | 10 |
| 基準値 | 85dB 栗東市の特定建設作業(騒音)に係る規制基準 | 75dB 栗東市の特定建設作業(振動)に係る規制基準 | 0.2mg/m ³ 環境省『大気汚染に係る環境基準』の「環境上の条件・浮遊粒子状物質」記載基準 | 10(硫化水素臭などの異臭) 草津市「臭気指数規制基準 第1種地域 敷地境界線(第1号)」記載基準 |

第1管理値を超過した場合

| | |
|-----------------|------------------------------|
| 騒音 振動 粉じん | 作業を一旦中断し注意喚起した後、警戒しつつ作業を行います |
| 臭気 | 作業を一旦中断し、現場の監督員が直接臭いを確認します |


第2管理値を超過した場合

| | |
|-----------------|--|
| 騒音 振動 粉じん | 直ちに作業を中断し、周辺7自治会長に連絡し原因究明後、対策を講じ作業を再開します |
| 臭気 | 臭いの確認により硫化水素臭などの異臭がした場合には、直ちに作業を中断し、周辺7自治会長に連絡し対策を講じたうえで作業を再開します |

| 主な実施作業内容 | 平成28年7月 | | | 平成28年8月 | | | | 備考 |
|--------------|---------------------------|------|------|---------|-------|-----|-----|----|
| | 29 金 | 30 土 | 31 日 | 1 月 | 2 火 | 3 水 | 4 木 | |
| 廃棄物土・有害物掘削工 | | | | | | | | |
| (1)選別土仮置・盛土工 | 選別土仮置 | | | | 選別土仮置 | | | |
| 廃棄物土・有害物掘削工 | | | | | | | | |
| (2)廃棄物土掘削工 | A工区掘削、B工区(A工区進入路掘削)、C工区掘削 | 掘削 | | | 掘削 | | | |
| 廃棄物選別工 | | | | | | | | |
| (3)選別処理施設工 | | | | | 運転 | | | |


【騒音】

(特になし)

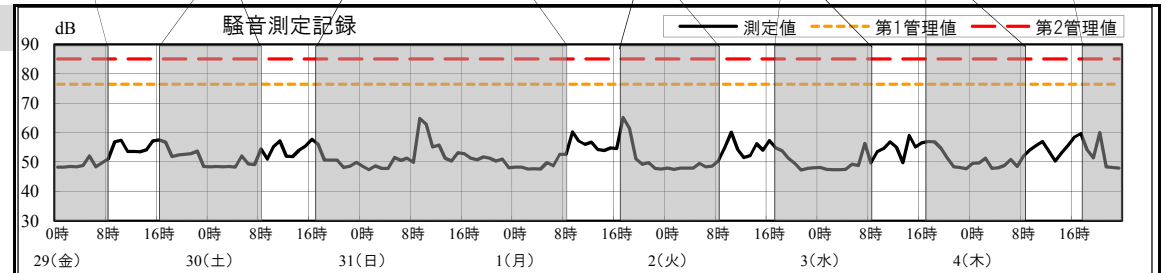


【振動】

(特になし)

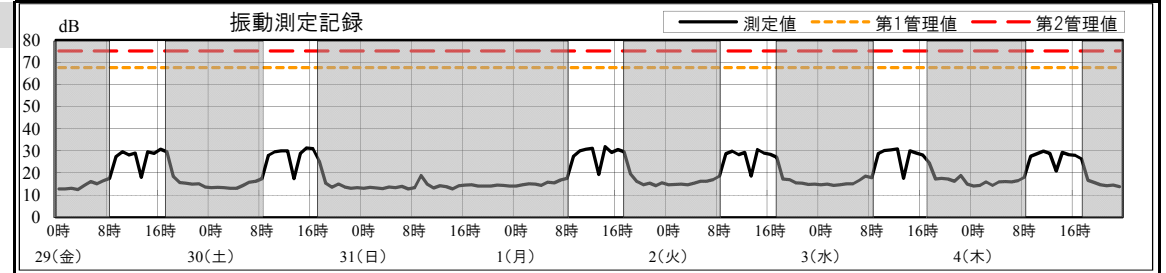

【粉じん】

(特になし)

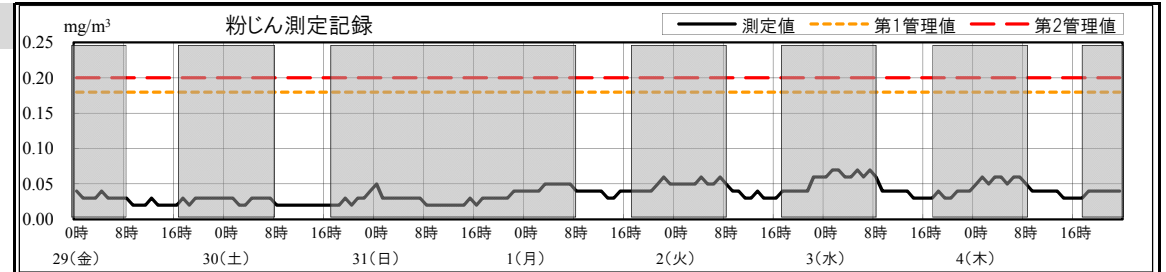

【臭気】

(特になし)

