


# 《旧RD最終処分場二次対策工事 工事情報 第128号 をお知らせいたします》

作成日：平成28年8月1日

| 工種・作業内容      | 日付  | 施工実績<br>平成28年7月 |    |    |    |    |    |                                      | 施工予定<br>平成28年8月 |   |   |   |   |   |             | 備考 |   |   |    |    |    |             |    |
|--------------|---|-----------------|----|----|----|----|----|--------------------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|-------------|----|---|---|----|----|----|-------------|----|
|              |   | 月               | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 日                                    | 月               | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日           |    |   |   |    |    |    |             |    |
|              |   | 25              | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31                                   | 1               | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7           |    | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13          | 14 |
| 廃棄物土・有害物掘削工  |   |                 |    |    |    |    |    |                                      |                 |   |   |   |   |   |             |    |   |   |    |    |    |             |    |
| ① 廃棄物土掘削工    | ①-1 A工区掘削<br>①-2 廃棄物土乾燥<br>①-3 進入路造成<br>①-4 C工区掘削 | 掘削(矢板内側)        |    |    |    |    |    | 休<br>工<br>日<br>現<br>場<br>見<br>学<br>会 |                 |   |   |   |   |   | 休<br>工<br>日 |    |   |   |    |    |    | 休<br>工<br>日 |    |
| ② 選別土仮置・盛土工  | 選別土移動   | 選別土仮置き          |    |    |    |    |    |                                      |                 |   |   |   |   |   |             |    |   |   |    |    |    |             |    |
| 廃棄物選別工       |   |                 |    |    |    |    |    |                                      |                 |   |   |   |   |   |             |    |   |   |    |    |    |             |    |
| ③ 選別処理工      | 一次選別(粗選別)<br>二次選別(機械選別)                           | 廃棄物土粗選別<br>運転   |    |    |    |    |    |                                      |                 |   |   |   |   |   |             |    |   |   |    |    |    |             |    |
| 汚染地下水拡散防止対策工 |   |                 |    |    |    |    |    |                                      |                 |   |   |   |   |   |             |    |   |   |    |    |    |             |    |
| ④ 底面・側面遮水工   | A工区   |                 |    |    |    |    |    |                                      |                 |   |   |   |   |   |             |    |   |   |    |    |    |             |    |

※点線は施工期間が未確定です。

## 【工事施工予定位置図】

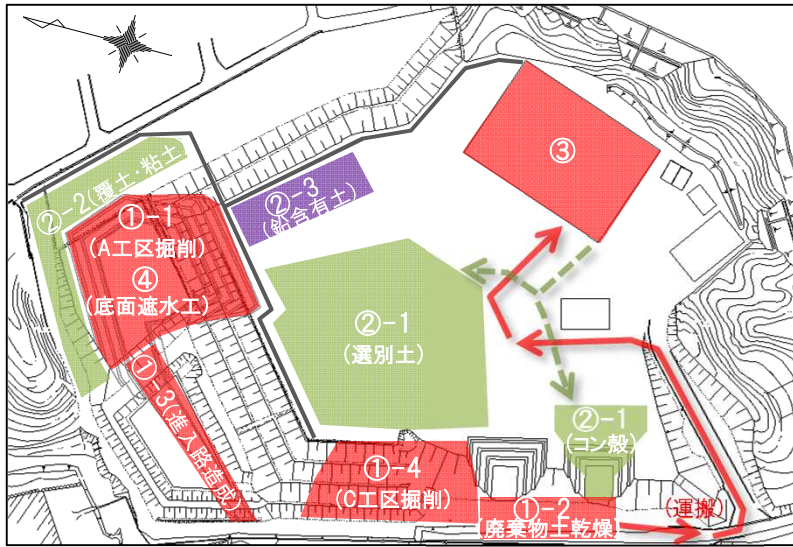

## 【工事施工状況写真】

撮影日：平成28年7月29日



①-1 A工区掘削  
止水矢板の内側を掘削しています。



③ 選別処理工  
トラックスケールにて重量を計測し過積載にならないようにしています。



現場見学会  
A工区の現場見学会を開催しました。

## 【お知らせ】

平成28年8月11日(木)～平成28年8月16日(火)の間は休工します。  
休工中は場内を閉鎖し、1日に2回の巡回・点検を行いますが、万が一異状等を発見されましたら、お手数ですが右記の番号までご連絡ください。

[休工中の連絡先]  
発注者：滋賀県 最終処分場特別対策室 090-1441-7108  
受注者：鴻池・不動テトラ・八田建設JV 090-5034-6832

# 《騒音・振動・粉じん・臭気自動計測の週間結果報告》

(報告対象期間:7月22日 ~ 7月28日)


## 【概要】

二次対策工事による周辺環境への影響を調査するために、IBRD最終処分場と隣接する住宅地との境界に計測器を設置し、「騒音・振動・粉じん・臭気」を連続自動計測しています。

各項目の1週間分の計測結果をグラフにしました。

※網掛け部は休工の時間帯(休日および夜間)です。

## 【位置図】

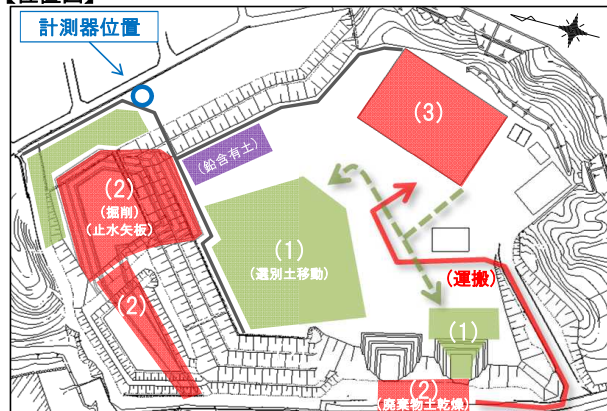

## 【測定値管理基準】

|                    | 騒音                            | 振動                            | 粉じん   | 臭気   |
|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|--|
| 第1管理値<br>(基準値の90%) | 76dB                          | 67dB                          | 0.18mg/m <sup>3</sup>   | 10(センサ-値)  |
| 第2管理値<br>(基準値)     | 85dB                          | 75dB                          | 0.2mg/m <sup>3</sup>  | 10   |
| 基準値                | 85dB<br>栗東市の特定建設作業(騒音)に係る規制基準 | 75dB<br>栗東市の特定建設作業(振動)に係る規制基準 | 0.2mg/m <sup>3</sup><br>環境省『大気汚染に係る環境基準』の「環境上の条件・浮遊粒子状物質」記載基準 | 10(硫化水素臭などの異臭)<br>草津市「臭気指数規制基準 第1種地域 敷地境界線(第1号)」記載基準 |

## 第1管理値を超過した場合

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| 騒音<br>振動<br>粉じん | 作業を一旦中断し注意喚起した後、警戒しつつ作業を行います |
| 臭気              | 作業を一旦中断し、現場の監督員が直接臭いを確認します   |


## 第2管理値を超過した場合

|                 |  |
|-----------------|--|
| 騒音<br>振動<br>粉じん | 直ちに作業を中断し、周辺7自治会長に連絡し原因究明後、対策を講じ作業を再開します                         |
| 臭気              | 臭いの確認により硫化水素臭などの異臭がした場合には、直ちに作業を中断し、周辺7自治会長に連絡し対策を講じたうえで作業を再開します |

| 主な実施作業内容     | 平成28年7月                   |       |      |       |      |      |      | 備考 |
|--------------|---------------------------|-------|------|-------|------|------|------|----|
|              | 22 金                      | 23 土  | 24 日 | 25 月  | 26 火 | 27 水 | 28 木 |    |
| 廃棄物土・有害物掘削工  |                           |       | 休工   |       |      |      |      |    |
| (1)選別土仮置・盛土工 | 選別土仮置                     | 選別土仮置 |      | 選別土仮置 |      |      |      |    |
| 廃棄物土・有害物掘削工  |                           |       |      | 掘削    |      |      |      |    |
| (2)廃棄物土掘削工   | A工区掘削、B工区(A工区進入路掘削)、C工区掘削 | 掘削    |      |       |      |      |      |    |
| 廃棄物選別工       |                           |       |      |       |      |      |      |    |
| (3)選別処理施設工   |                           |       | 運転   |       |      |      |      |    |


## 【騒音】

(特になし)

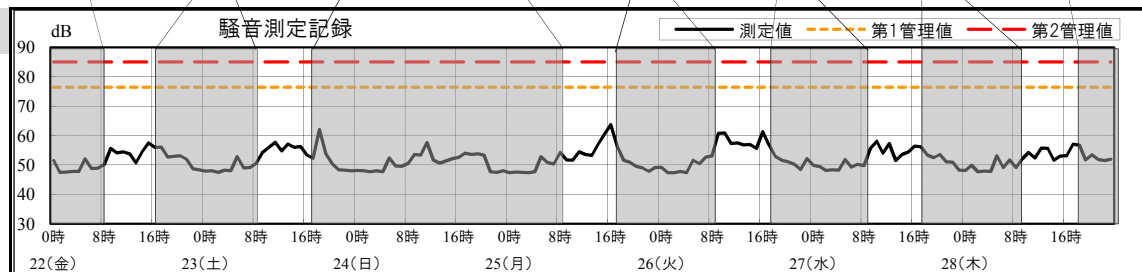


## 【振動】

(特になし)

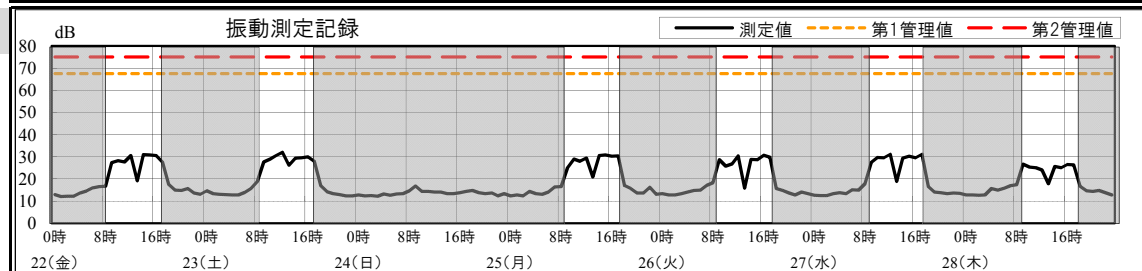

## 【粉じん】

(特になし)

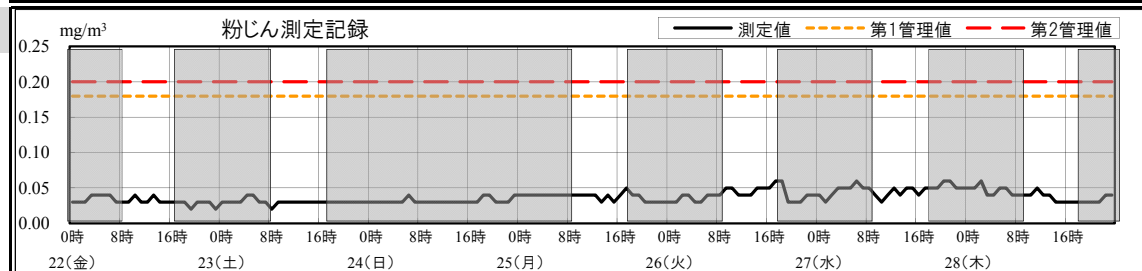

## 【臭気】

(特になし)

