


《旧BRD最終処分場二次対策工事 工事情報 第77号 をお知らせいたします》

作成日：平成27年8月10日

工種・作業内容	日付	施工実績							施工予定														備考
		平成27年8月																					
		月3	火4	水5	木6	金7	土8	日9	月10	火11	水12	木13	金14	土15	日16	月17	火18	水19	木20	金21	土22	日23	
廃棄物土・有害物掘削工																							
① 仮置物撤去工	廃棄物土移動	廃棄物土移動							廃棄物土移動														
② 廃棄物土掘削工	A工区掘削	掘削							掘削														
③ 選別土仮置・盛土工	選別土移動	選別土仮置き							選別土仮置き														
廃棄物選別工																							
④ 選別処理工	一次選別(粗選別)	廃棄物土粗選別							廃棄物土粗選別														
	二次選別(機械選別)	運転							運転														

【工事施工予定位置図】

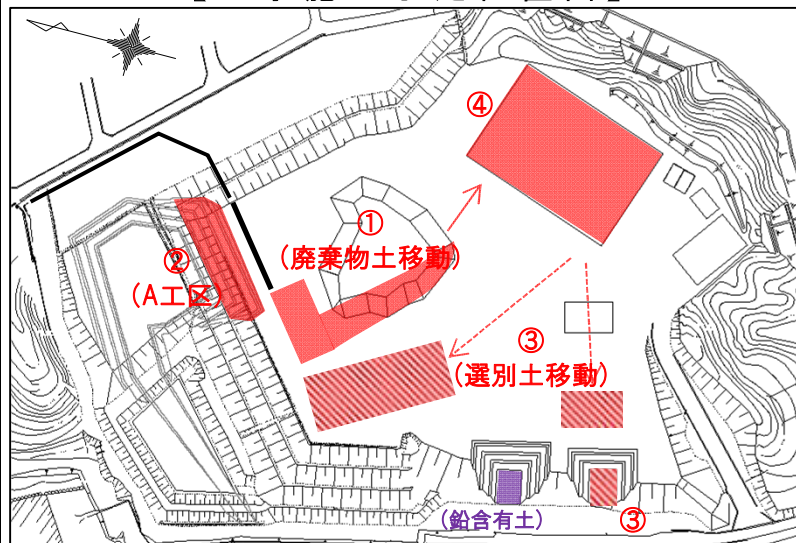

【工事施工状況写真】

撮影日：平成27年8月7日他



② 廃棄物土掘削工

A工区の掘削状況です。



③ 選別土仮置・盛土工

選別後、分析を行い問題のなかった選別土を場内に仮置きしています。



④ 選別処理工

自走式スクリーンで選別された50mmアンダー物が排出されている状況です。

【お知らせ】

・ 8月12日(水)～8月16日(日)の間は休工します。

休工中は場内を閉鎖し、1日に2回の巡回・点検を行います。万が一異状等を発見されましたら、お手数ですが下記の番号までご連絡ください。

[休工中の連絡先]

発注者：滋賀県 最終処分場特別対策室 090-1441-7108

受注者：鴻池・不動テトラ・八田建設JV (武村) 090-5034-6832

《騒音・振動・粉じん・臭気自動計測の週間結果報告》


(報告対象期間:7月31日~8月6日)

【概要】

二次対策工事による周辺環境への影響を調査するために、旧RD最終処分場と隣接する住宅地との境界に計測器を設置し、「騒音・振動・粉じん・臭気」を連続自動計測しています。

各項目の1週間分の計測結果をグラフにしました。
※網掛け部は休工の時間帯(休日および夜間)です。

【位置図】

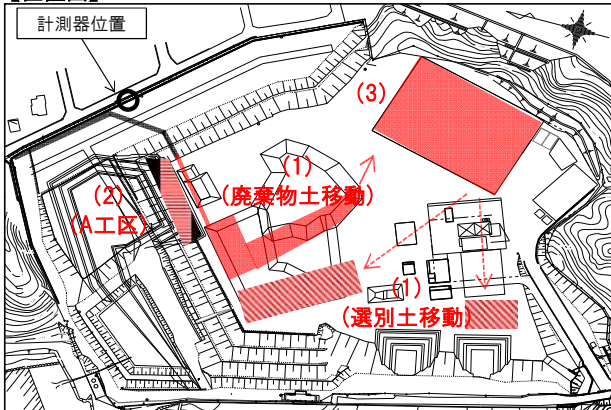

【測定値管理基準】

	騒音	振動	粉じん	臭気
第1管理値	基準値の90%	基準値の90%	基準値の90%	10(センサー値)
第2管理値	基準値	基準値	基準値	参考値
基準値	85dB 栗東市の特定建設作業(騒音)に係る規制基準	75dB 栗東市の特定建設作業(振動)に係る規制基準	0.2mg/m ³ 環境省『大気汚染に係る環境基準』の「環境上の条件・浮遊粒子状物質」記載基準	10(硫化水素臭などの異臭) 草津市「臭気指数規制基準 第1種地域 敷地境界線(第1号)」記載基準

第1管理値を超過した場合

騒音 振動 粉じん	作業を一旦中断し注意喚起した後、警戒しつつ作業を行います
臭気	作業を一旦中断し、現場の監督員が直接臭いを確認します


第2管理値を超過した場合

騒音 振動 粉じん	直ちに作業を中断し、周辺7自治会長に連絡し原因究明後、対策を講じ作業を再開します
臭気	臭いの確認により硫化水素臭などの異臭がした場合には、直ちに作業を中断し、周辺7自治会長に連絡し対策を講じたうえで作業を再開します

主な実施作業内容	平成27年8月						備考
	31 金	1 土	2 日	3 月	4 火	5 水	
廃棄物土・有害物掘削工			休 工				
(1)選別土仮置・盛土工 仮置土移動	仮置土移動			仮置土移動			
廃棄物土・有害物掘削工							
(2)廃棄物土掘削工 A工区	掘削・仮囲い	掘削・仮囲い		掘削			
廃棄物選別工							
(3)選別処理施設工	運転			運転			


【騒音】

(特になし)

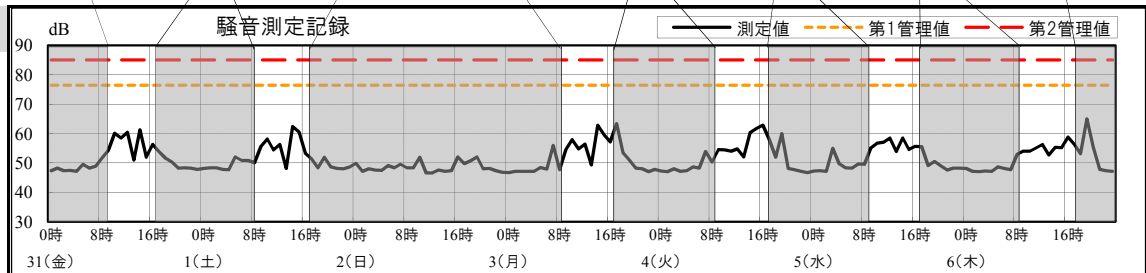


【振動】

(特になし)

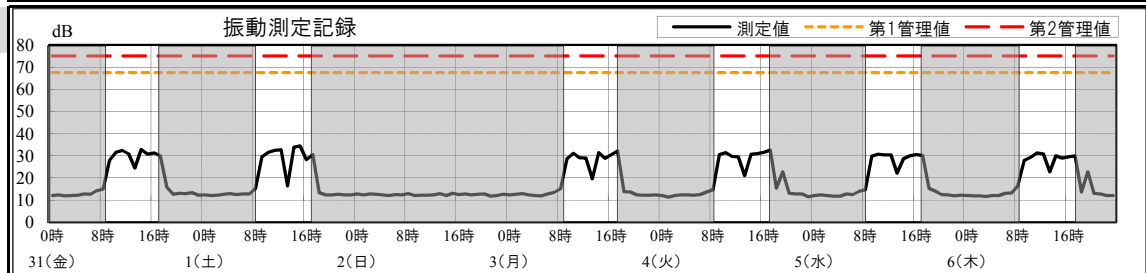

【粉じん】

(特になし)

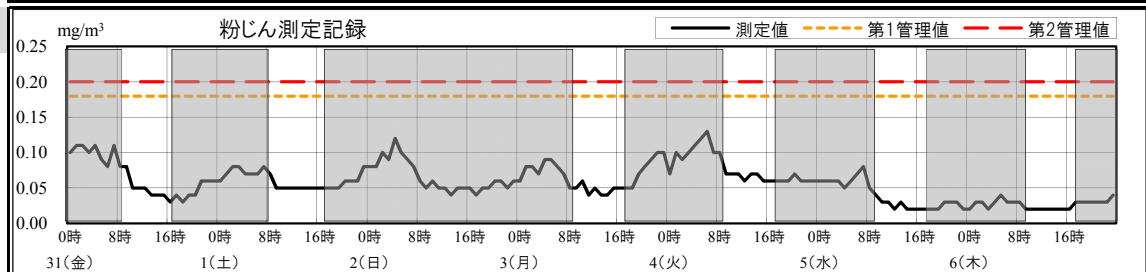

【臭気】

(特になし)

