


《旧RD最終処分場二次対策工事 工事情報 第76号 をお知らせいたします》

作成日：平成27年7月31日

日付	施工実績										施工予定										備考	
	平成27年7月					平成27年8月					平成27年8月					平成27年8月						
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土		日
工種・作業内容	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
廃棄物土・有害物掘削工																						
① 仮置物撤去工	廃棄物土移動					廃棄物土移動					廃棄物土移動					廃棄物土移動						
② 廃棄物土掘削工	A工区掘削					掘削					掘削					掘削						
③ 選別土仮置・盛土工	選別土移動					選別土仮置き					選別土仮置き					選別土仮置き						
④ 環境対策設備工	仮囲い設置					国道バイパス側設置																
廃棄物選別工																						
⑤ 選別処理工	一次選別(粗選別)					廃棄物土粗選別					廃棄物土粗選別					廃棄物土粗選別						
	二次選別(機械選別)					運転					運転					運転						

【工事施工予定位置図】

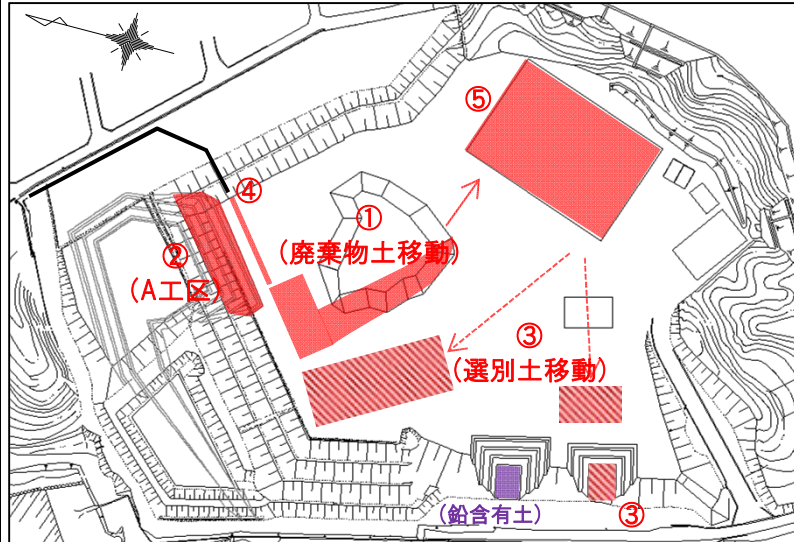

【工事施工状況写真】

撮影日：平成27年7月31日



① 仮置物撤去工
廃棄物土を掘削し、運搬しています



② 廃棄物土掘削工
A工区の掘削状況です。



④ 環境対策設備工
国道バイパス側の仮囲いを設置しています。

【お知らせ】

・ 8月12日(水)～8月16日(日)の間は休工します。

休工中は場内を閉鎖し、1日に2回の巡回・点検を行います。万が一異状等を発見されましたら、お手数ですが下記の番号までご連絡ください。

[休工中の連絡先]

発注者：滋賀県 最終処分場特別対策室 090-1441-7108

受注者：鴻池・不動テトラ・八田建設JV (武村) 090-5034-6832

《騒音・振動・粉じん・臭気自動計測の週間結果報告》


(報告対象期間:7月24日~7月30日)

【概要】

二次対策工事による周辺環境への影響を調査するために、旧RD最終処分場と隣接する住宅地との境界に計測器を設置し、「騒音・振動・粉じん・臭気」を連続自動計測しています。

各項目の1週間分の計測結果をグラフにしました。
※網掛け部は休工の時間帯(休日および夜間)です。

【位置図】

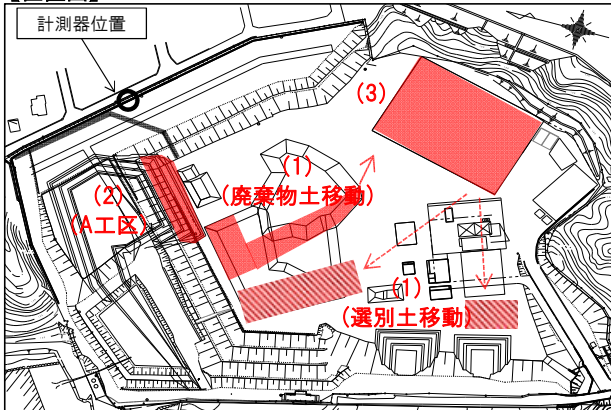

【測定値管理基準】

	騒音	振動	粉じん	臭気
第1管理値	基準値の90%	基準値の90%	基準値の90%	10(センサー値)
第2管理値	基準値	基準値	基準値	参考値
基準値	85dB 栗東市の特定建設作業(騒音)に係る規制基準	75dB 栗東市の特定建設作業(振動)に係る規制基準	0.2mg/m ³ 環境省『大気汚染に係る環境基準』の「環境上の条件・浮遊粒子状物質」記載基準	10(硫化水素臭などの異臭) 草津市「臭気指数規制基準 第1種地域 敷地境界線(第1号)」記載基準

第1管理値を超過した場合

騒音 振動 粉じん	作業を一旦中断し注意喚起した後、警戒しつつ作業を行います
臭気	作業を一旦中断し、現場の監督員が直接臭いを確認します


第2管理値を超過した場合

騒音 振動 粉じん	直ちに作業を中断し、周辺7自治会長に連絡し原因究明後、対策を講じ作業を再開します
臭気	臭いの確認により硫化水素臭などの異臭がした場合には、直ちに作業を中断し、周辺7自治会長に連絡し対策を講じたうえで作業を再開します

主な実施作業内容	平成27年7月							備考
	24 金	25 土	26 日	27 月	28 火	29 水	30 木	
廃棄物土・有害物掘削工			休工					
(1)選別土仮置・盛土工 仮置土移動		仮置土移動			仮置土移動			
廃棄物土・有害物掘削工								
(2)廃棄物土掘削工 A工区				掘削				
廃棄物選別工								
(3)選別処理施設工				運転				


【騒音】

(特になし)

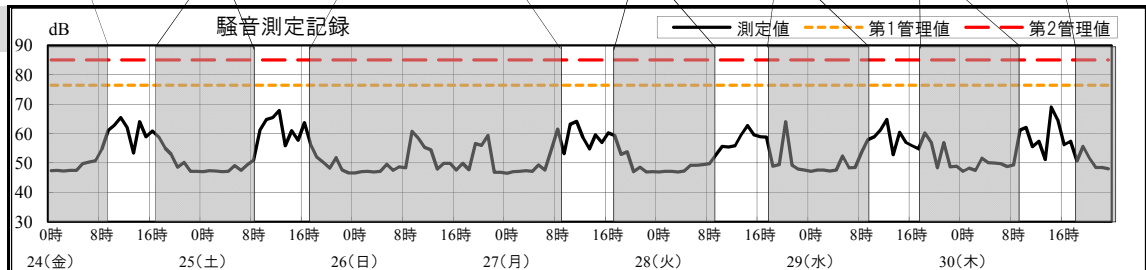


【振動】

(特になし)

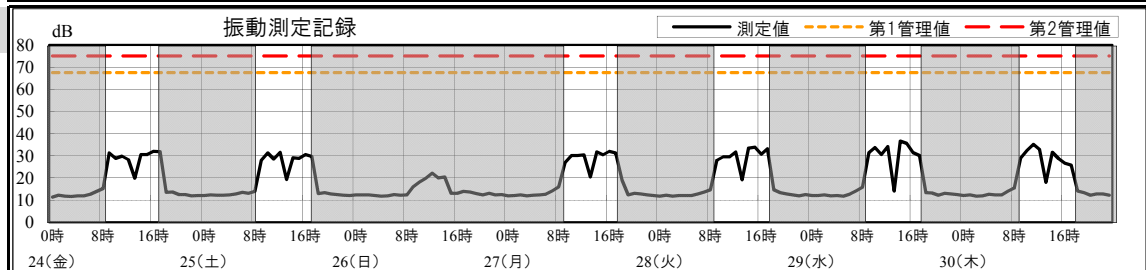

【粉じん】

(特になし)

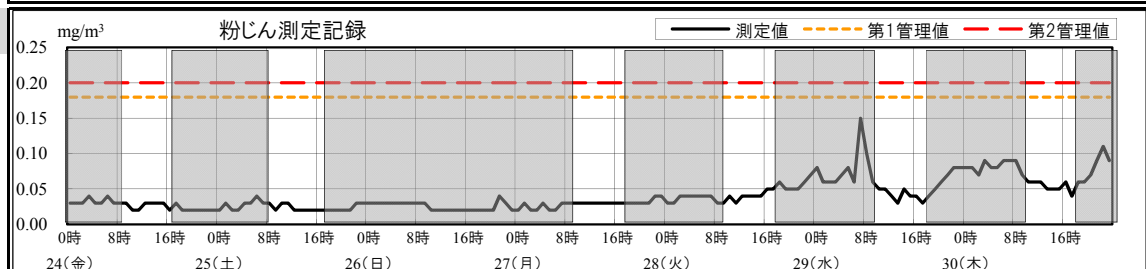

【臭気】

(特になし)

