


# 《旧RD最終処分場二次対策工事 工事情報 第40号 をお知らせいたします》

作成日：平成26年11月17日

日付	施工実績														施工予定														備考
	平成26年11月																												
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日								
工種・作業内容	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30								
廃棄物選別工																													
①選別処理施設工																													
基礎工 機械設置工																													
基礎部コンクリート打設																													
基礎部およびタンク走路コンクリート打設																													
集塵機・サイクロン																													
汚染地下水拡散防止対策工																													
②底面遮水工																													
事前調査ホーリング工																													
D・E工区 調査ホーリング																													
③鉛直遮水壁工																													
TRD工法																													
作業ヤード造成																													
TRD工																													
地盤改良																													
観測井戸閉塞																													
観測井戸撤去・閉塞																													
④仮設備工																													
フェンス設置																													
団地側フェンス撤去・設置																													
防音壁																													
防音シート設置(高さ6m)																													
防音シート設置・移動(高さ6m)																													

## 【工事施工予定位置図】

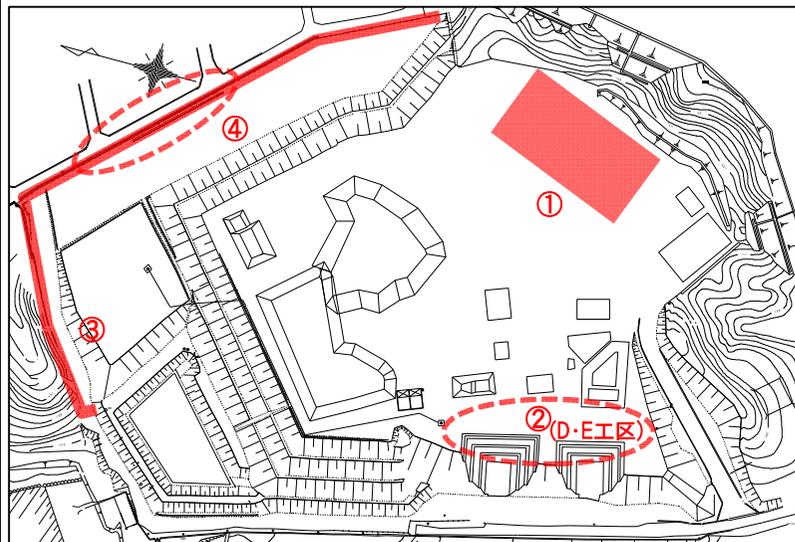

## 【工事施工状況写真】

撮影日：平成26年11月13日



① 選別処理施設工

選別ヤードのコンクリートを打設しています。



③ 鉛直遮水壁工

県No.9(新)観測井戸撤去・閉塞のためにボーリングを行っています。



④ 仮設備工

団地側フェンスの撤去・設置を行っています。

## 【お知らせ】

・ 11月27日(木)に第10回旧RD最終処分場問題連絡協議会を開催します。

# 《騒音・振動・粉じん・臭気自動計測の週間結果報告》


(報告対象期間: 11月7日～11月13日)

## 【概要】

二次対策工事による周辺環境への影響を調査するために、旧RD最終処分場と隣接する住宅地との境界に計測器を設置し、「騒音・振動・粉じん・臭気」を連続自動計測しています。

各項目の1週間分の計測結果をグラフにしました。  
※網掛け部は休工の時間帯(休日および夜間)です。

## 【位置図】

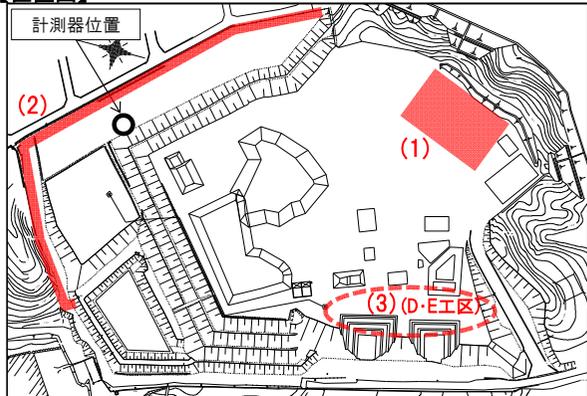

## 【測定値管理基準】

	騒音	振動	粉じん	臭気
第1管理値	基準値の90%	基準値の90%	基準値の90%	10(センサー値)
第2管理値	基準値	基準値	基準値	参考値
基準値	85dB 栗東市の特定建設作業(騒音)に係る規制基準	75dB 栗東市の特定建設作業(振動)に係る規制基準	0.2mg/m <sup>3</sup> 環境省『大気汚染に係る環境基準』の「環境上の条件・浮遊粒子状物質」記載基準	10(硫化水素臭などの異臭) 草津市「臭気指数規制基準 第1種地域 敷地境界線(第1号)」記載基準

## 第1管理値を超過した場合

騒音 振動 粉じん	作業を一旦中断し注意喚起した後、警戒しつつ作業を行います
臭気	作業を一旦中断し、現場の監督員が直接臭いを確認します


## 第2管理値を超過した場合

騒音 振動 粉じん	直ちに作業を中断し、周辺7自治会長に連絡し原因究明後、対策を講じ作業を再開します
臭気	臭いの確認により硫化水素臭などの異臭がした場合には、直ちに作業を中断し、周辺7自治会長に連絡し対策を講じたうえで作業を再開します

主な実施作業内容		平成26年11月						備考	
		7 金	8 土	9 日	10 月	11 火	12 水		13 木
廃棄物選別工									
(1)選別処理施設工	基礎工	基礎コンクリート打設					鉄筋組立	型枠	基礎コンクリート打設
汚染地下水拡散防止対策工									
(2)鉛直遮水壁工	TRD工法	試掘工					国道側施工ヤード造成 フェンス撤去・設置		
汚染地下水拡散防止対策工									
(3)底面遮水工	事前調査ボーリング	D・E工区ボーリング					D・E工区ボーリング		


## 【騒音】

(特になし)

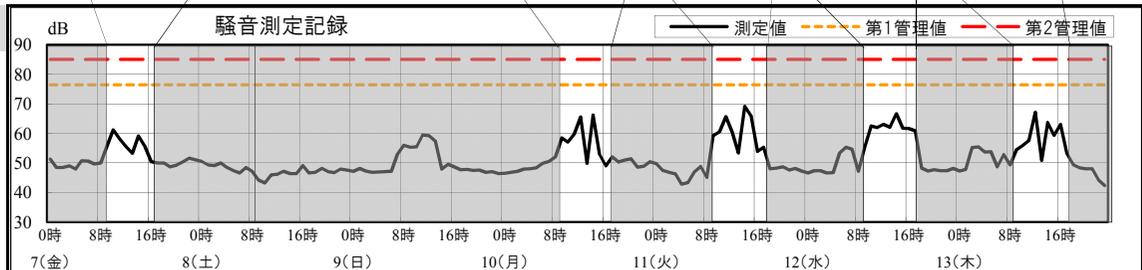


## 【振動】

(特になし)

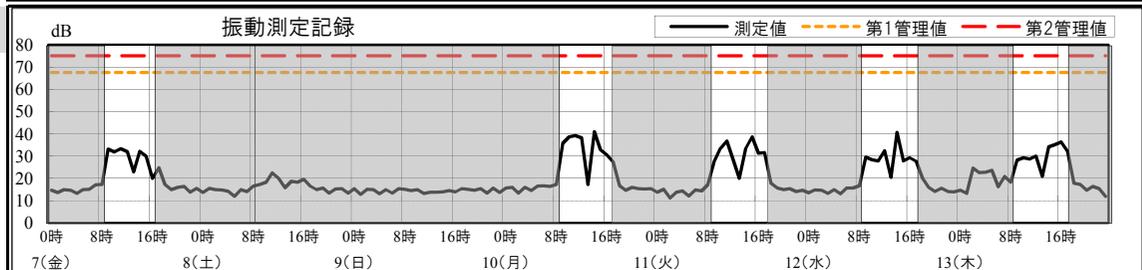

## 【粉じん】

(特になし)

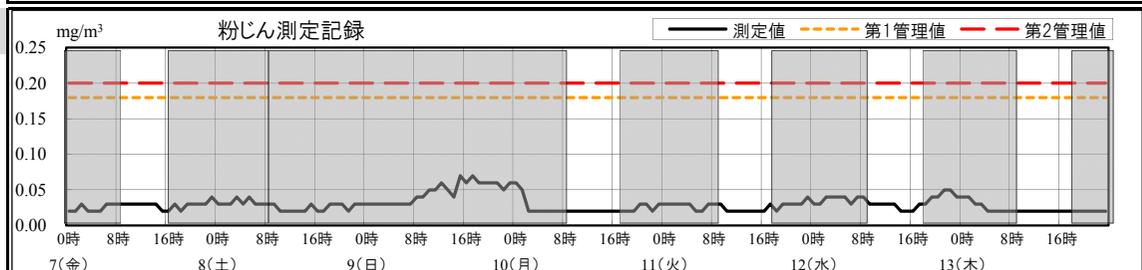

## 【臭気】

(特になし)

