


《IBRD最終処分場二次対策工事 工事情報 第26号 をお知らせいたします》

作成日：平成26年8月11日

日付	施工実績							施工予定														備考
	平成26年8月																					
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
工種・作業内容	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
廃棄物土・有害物掘削工																						
①有害物掘削除去工																						
有害物搬出																						
A-2区画埋戻し 一次対策部埋戻し																						
②矢板工																						
A-2区画引抜き																						
現場見学会																						
③矢板工																						
有害物搬出																						
A-2区画埋戻し 一次対策部埋戻し																						
A-2区画引抜き																						
現場見学会																						
③廃棄物選別工																						
準備工・基礎工																						
④雨水排水工																						
現場打水路																						
⑤仮設備工																						
仮キャッピング工																						
⑥浸透水処理施設設置工																						
処理設備設置																						
既設処理施設試運転・配管ラッキング																						

【工事施工予定位置図】

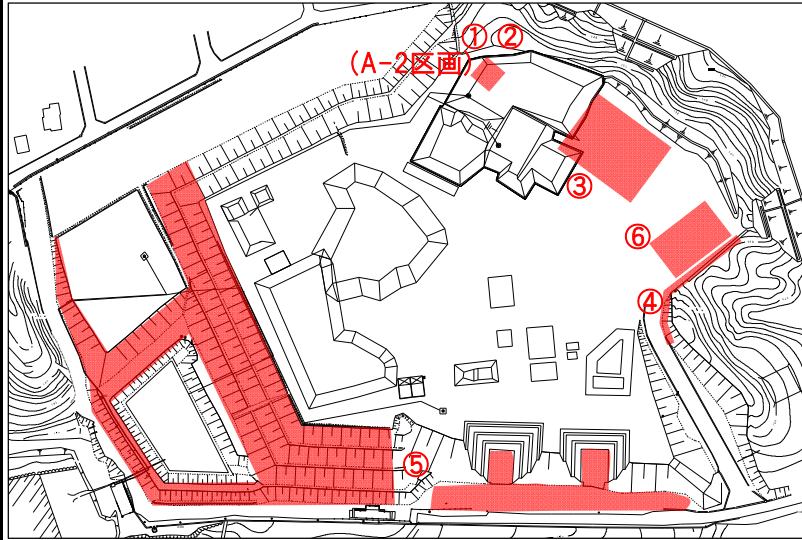

【工事施工状況写真】

撮影日：平成26年8月8日



①有害物掘削除去工

A-2区画の埋戻し状況です。  
ミニバックホウで敷均して、ローラーで転圧します。



①有害物掘削除去工

A-2区画に掘削した有害物を  
場外へ搬出しています。



⑤汚染地下水拡散防止対策工

半割コルゲート管設置中の状況です。

【お知らせ】

- ・①有害物掘削除去工のA-2区画について、“掘削状況”および“除去完了後”の現場見学会を開催しました。  
ご参加ありがとうございました。


# 《騒音・振動・粉じん・臭気自動計測の週間結果報告》

(報告対象期間:8月1日～8月7日)

## 【概要】

二次対策工事による周辺環境への影響を調査するために、IBRD最終処分場と隣接する住宅地との境界に計測器を設置し、「騒音・振動・粉じん・臭気」を連続自動計測しています。  
各項目の1週間分の計測結果をグラフにしました。  
※網掛け部は休工の時間帯(休日および夜間)です。

## 【位置図】

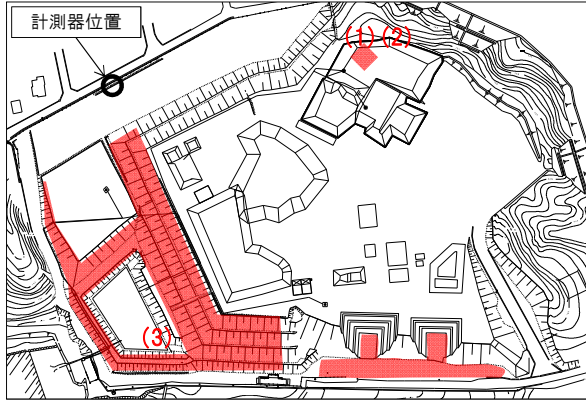

## 【測定値管理基準】

	騒音	振動	粉じん	臭気
第1管理値	基準値の90%	基準値の90%	基準値の90%	10(センサー値)
第2管理値	基準値	基準値	基準値	参考値
基準値	85dB 栗東市の特定建設作業(騒音)に係る規制基準	75dB 栗東市の特定建設作業(振動)に係る規制基準	0.2mg/m <sup>3</sup> 環境省『大気汚染に係る環境基準』の「環境上の条件・浮遊粒子状物質」記載基準	10(硫化水素臭などの異臭) 草津市「臭気指数規制基準 第1種地域 敷地境界線(第1号)」記載基準

## 第1管理値を超過した場合

騒音 振動 粉じん	作業を一旦中断し注意喚起した後、警戒しつつ作業を行います
臭気	作業を一旦中断し、現場の監督員が直接臭いを確認します


## 第2管理値を超過した場合

騒音 振動 粉じん	直ちに作業を中断し、周辺7自治会長に連絡し原因究明後、対策を講じ作業を再開します
臭気	臭いの確認により硫化水素臭などの異臭がした場合には、直ちに作業を中断し、周辺7自治会長に連絡し対策を講じたうえで作業を再開します

主な実施作業内容	平成26年8月							備考
	1 金	2 土	3 日	4 月	5 火	6 水	7 木	
廃棄物土・有害物掘削工			休工					
(1)有害物掘削除去工	A-2区画有害物搬出	有害物搬出			有害物搬出			
(2)有害物掘削除去工	A-2区画掘削、埋戻し	掘削			埋戻し		支保工撤去	埋戻し
汚染地下水拡散防止対策工								
(3)仮設備工	仮キャッピング工	ブルーシート設置		草刈り		半割コルゲート管設置		


## 【騒音】

(特になし)

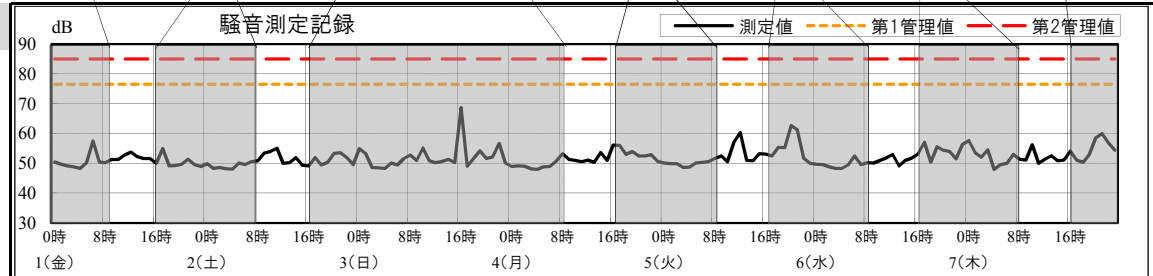


## 【振動】

(特になし)

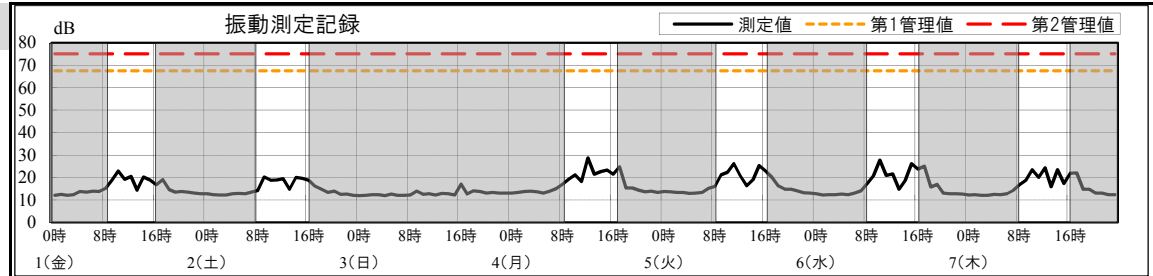

## 【粉じん】

(特になし)

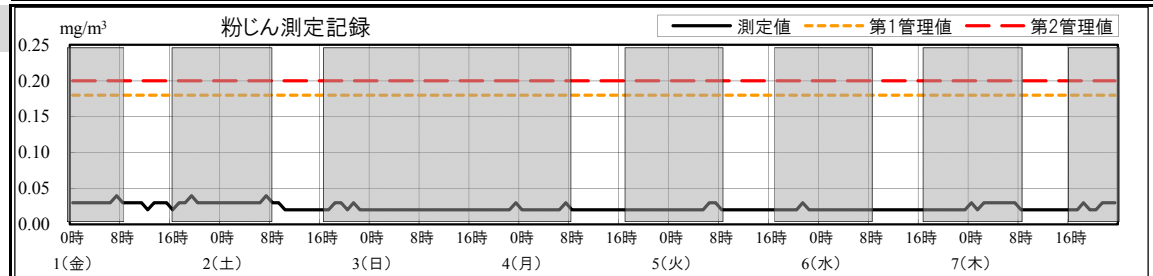

## 【臭気】

(特になし)

