

《旧RD最終処分場二次対策工事 工事情報 第19号 をお知らせいたします》

作成日：平成26年6月24日


日付	施工実績														施工予定														備考
	平成26年6月														平成26年7月														
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日								
工種・作業内容	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6								
廃棄物土・有害物掘削工																													
①有害物掘削除去工																													
A-3区画掘削																													
有害物土搬出																													
②矢板工																													
A-3区画打設																													
鋼矢板打設																													
重機搬出																													
汚染地下水拡散防止対策工																													
③仮設備工																													
浸透水揚水井戸工																													
仮キャッピング工																													
浸透水处理施設工																													
④浸透水处理施設設置工																													
処理設備設置																													
浸透水处理施設設置																													
⑤浸透水处理水放流工																													
放流管設置																													
市道部接続																													

現場見学会予定

【工事施工予定位置図】

【工事施工状況写真】

撮影日：平成26年6月18、20日

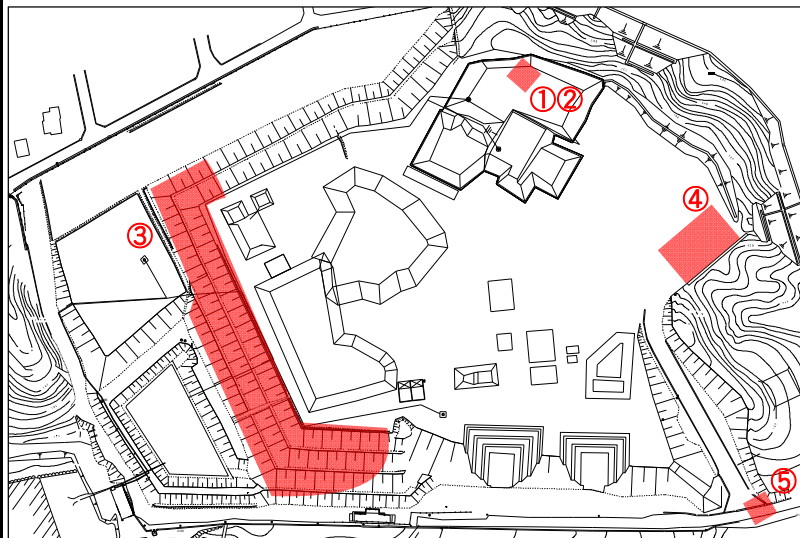

①有害物掘削除去工

A-3区画の鋼矢板打設を行っています。

①有害物掘削除去工

鋼矢板打設時の障害物(鉄板)を掘削除去した物です。

③仮キャッピング工

国道側の法面において除草を行っています。その後シートを敷設します。

【お知らせ】

①有害物掘削除去工のA-3区画およびB区画について、除去完了後の現場見学会を開催します。
日程は **7月3日(木)15時00分～** を予定しております。

※ 先週の工事情報第18号で、現場見学会の日程を 7月1日(火)としておりましたが、工程の都合により 7月3日(木)に変更します。ご迷惑おかけしまして申し訳ございません。


《騒音・振動・粉じん・臭気自動計測の週間結果報告》

報告対象期間:6月13日～6月19日

【概要】

二次対策工事による周辺環境への影響を調査するために、IBRD最終処分場と隣接する住宅地との境界に計測器を設置し、「騒音・振動・粉じん・臭気」を連続自動計測しています。
各項目の1週間分の計測結果をグラフにしました。
※網掛け部は休工の時間帯(休日および夜間)です。

【位置図】

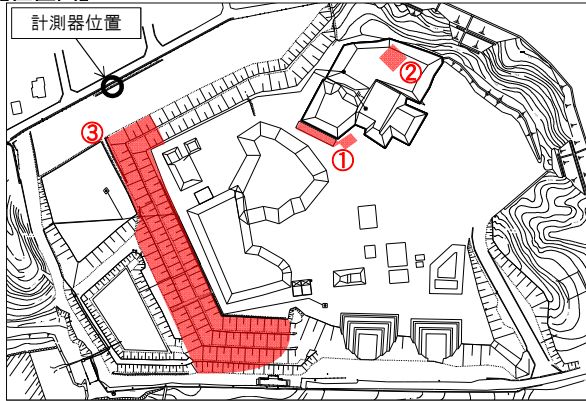

【測定値管理基準】

	騒音	振動	粉じん	臭気
第1管理値	基準値の90%	基準値の90%	基準値の90%	10(センサー値)
第2管理値	基準値	基準値	基準値	参考値
基準値	85dB 栗東市の特定建設作業(騒音)に係る規制基準	75dB 栗東市の特定建設作業(振動)に係る規制基準	0.2mg/m ³ 環境省『大気汚染に係る環境基準』の「環境上の条件・浮遊粒子状物質」記載基準	10(硫化水素臭などの異臭) 草津市「臭気指数規制基準 第1種地域 敷地境界線(第1号)」記載基準

第1管理値を超過した場合

騒音 振動 粉じん	作業を一旦中断し注意喚起した後、警戒しつつ作業を行います
臭気	作業を一旦中断し、現場の監督員が直接臭いを確認します


第2管理値を超過した場合

騒音 振動 粉じん	直ちに作業を中断し、周辺7自治会長に連絡し原因究明後、対策を講じ作業を再開します
臭気	臭いの確認により硫化水素臭などの異臭がした場合には、直ちに作業を中断し、周辺7自治会長に連絡し対策を講じたうえで作業を再開します

主な実施作業内容		平成26年6月						備考
		13 金	14 土	15 日	16 月	17 火	18 水	
廃棄物土・有害物掘削工								
①仮置き物撤去工	仮置き物撤去	仮置き物撤去	休工	休工	鋼矢板打設			
②矢板工	A-3区画矢板打設	鋼矢板打設						
汚染地下水拡散防止対策工								
③仮設備工	仮キャッピング工				除草・集積			


【騒音】

16日の値について、計測器のすぐ近くで、除草を行ったため、その作業音が影響したと思われる。

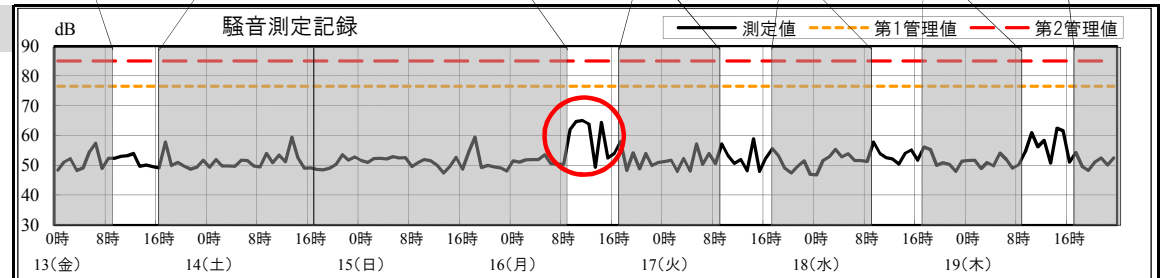


【振動】

(特になし)

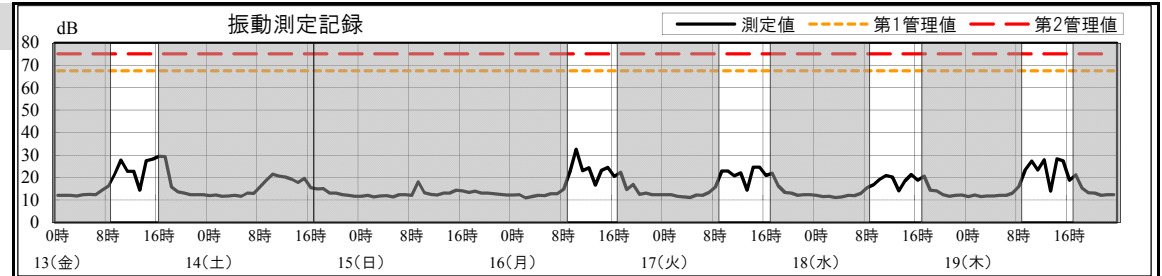

【粉じん】

(特になし)

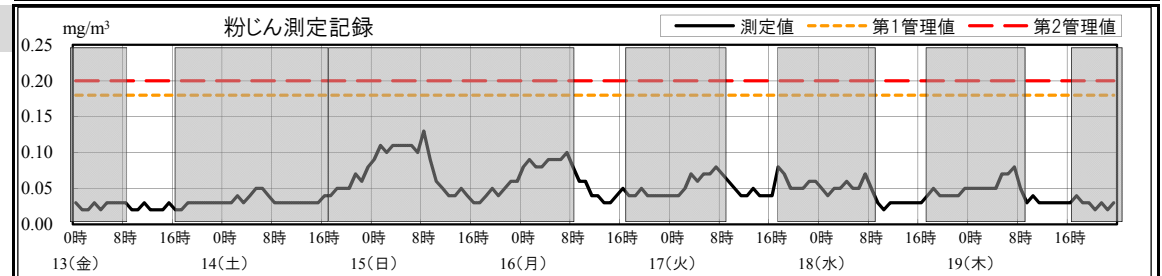

【臭気】

(特になし)

