

《旧RD最終処分場二次対策工事 工事情報 第9号 をお知らせいたします》


平成26年4月15日作成

日付		施工実績							施工予定														備考			
		平成26年4月																								
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日				
工種・作業内容		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
廃棄物土・有害物掘削工									休								休								休	
仮置き物撤去工	仮置き物撤去									仮置き物搬出																
矢板工	A区画矢板打設	機械進入路造成						機械		鋼矢板打設																
仮設備工	仮囲い設置							搬入										仮囲い防音シート(東側)								
汚染地下水拡散防止対策工										工								工								以後、継続して測定
仮設備工	浸透水揚水井戸工								外周工事用道路造成								井戸4.5搬入路設置									
仮設備工	周辺環境対策工	常時自動計測																								
浸透水处理施設工									基礎碎石敷・均しcon		養生・墨だし			鉄筋・型枠							con打設		鉄筋			
浸透水处理施設設置工	処理設備設置準備				基面整形																					
【お知らせ】																										
・ 仮置きしている廃棄物(有害物)を18日(金)より搬出します。																										
・ 「第7回旧RD最終処分場問題連絡協議会」を下記のとおり開催します。																										
日時:4月28日(月) 19時～																										
場所:栗東市コミュニティセンター治田東																										

【工事施工状況写真】

平成26年4月11日、15日撮影

写真撮影位置

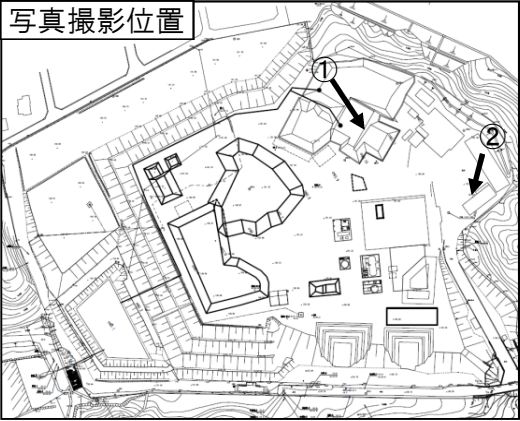

① 機械進入路造成完了状況




② 浸透水处理施設基盤整形状況



騒音・振動・粉じん・臭気自動計測の週間結果報告（4月4日～4月10日）

【位置図】

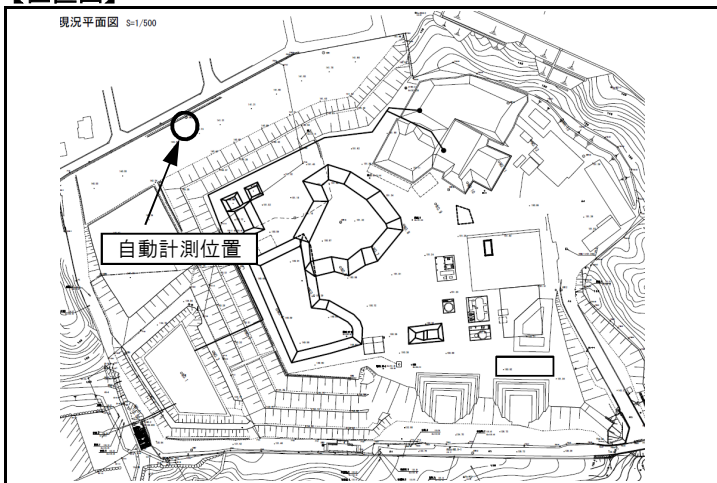

【測定値管理基準】

	騒音	振動	粉じん	臭気
第1管理値	基準値の90%	基準値の90%	基準値の90%	10(センサー値)
第2管理値	基準値	基準値	基準値	参考値
基準値	85dB 栗東市の特定建設作業（騒音）に係る規制基準	75dB 栗東市の特定建設作業（振動）に係る規制基準	0.2mg/m ³ 環境省『大気汚染に係る環境基準』の「環境上の条件・浮遊粒子状物質」記載基準	10(硫化水素臭などの異臭) 草津市「臭気指数規制基準 第1種地域敷地境界線(第1号)」記載基準

第1管理値を超過した場合

騒音・振動・粉じん	作業を一旦中断し注意喚起した後、警戒しつつ作業を行います
臭気	作業を一旦中断し、現場の監督員が直接臭いを確認します

第2管理値を超過した場合

騒音・振動・粉じん	直ちに作業を中断し、周辺7自治会長に連絡し原因究明後、対策を講じ作業を再開します
臭気	臭いの確認により硫化水素臭などの異臭がした場合には、直ちに作業を中断し、周辺7自治会長に連絡し対策を講じたうえで作業を再開します

■: 休工(休日および夜間)

