


# C工区 西側掘削状況②


(旧栗東町廃棄物埋立地由来の廃棄物混じり土の掘削)

・No.2+10～3+00付近

敷地境界からの掘削

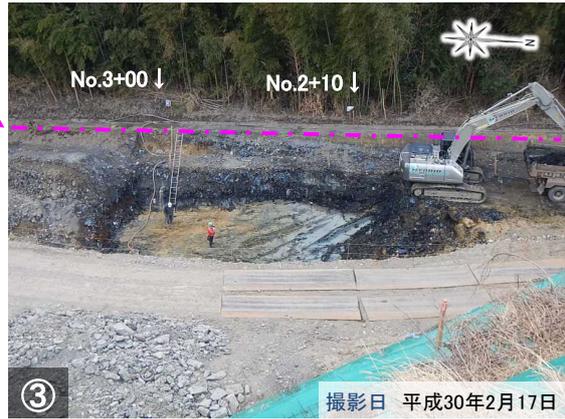

家庭系ごみ層

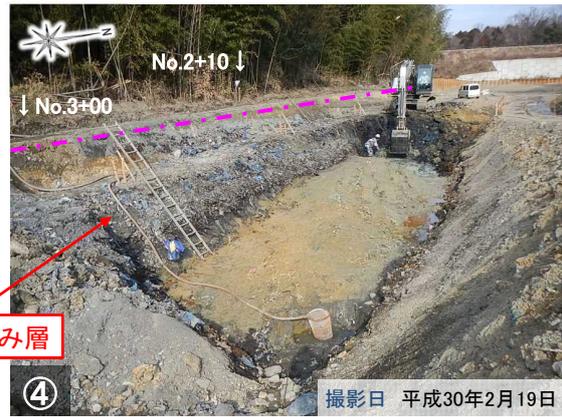

# C工区 西側掘削状況③

(旧栗東町廃棄物埋立地由来の廃棄物混じり土の掘削)



覆土層  
→残置

家庭系ごみ層  
→残置

## 写真

- ①掘削後の状況(No.2付近)
- ②家庭系ごみ層の近景

家庭系ごみ層  
→残置

家庭系ごみ層の主な内容  
・ビニール袋  
・びん  
・プラスチック類 等




## 施工状況

- ・鉛直遮水工施工箇所の掘削  
→地山を確認し掘り止め。

# C工区 西側掘削状況④



平面図

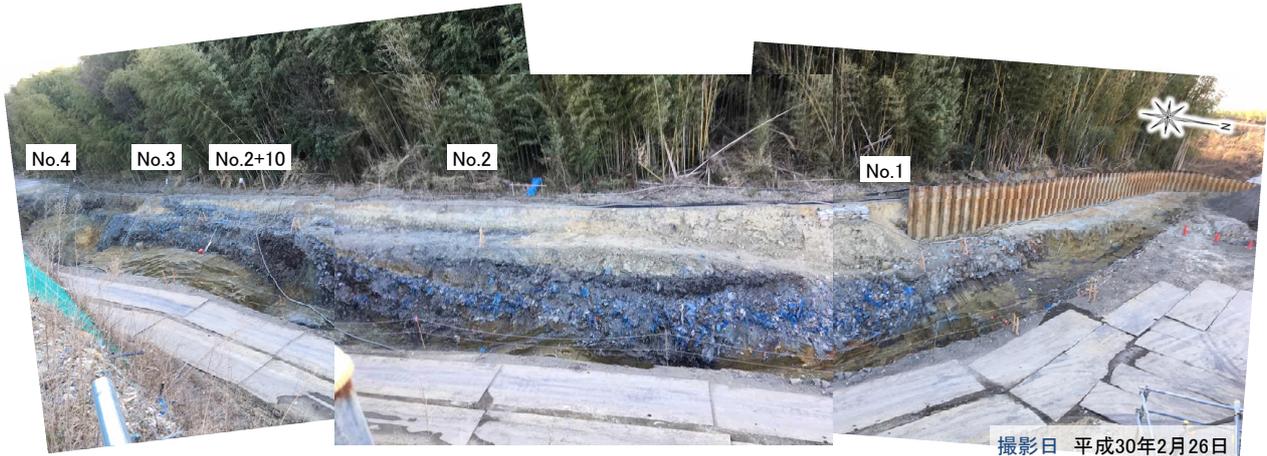

撮影日 平成30年2月26日

# 土質調査結果

平面図

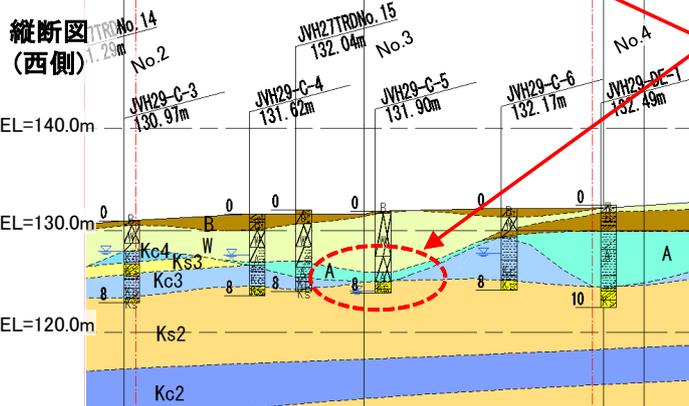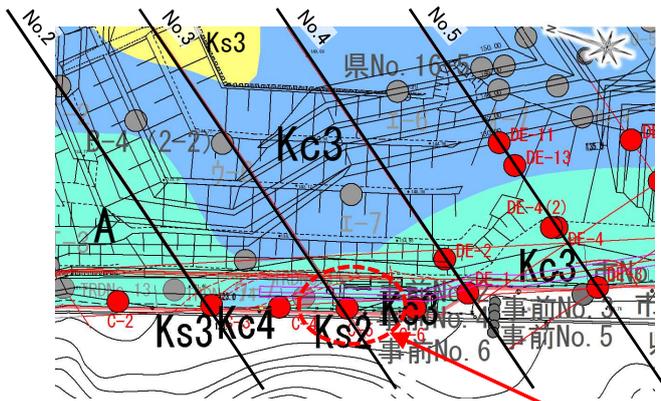


## 【結果】

●事前の土質調査により、以下の2点が判明。

- ①調査孔C-5で現地盤高(EL=131.9m)から約6m付近(EL=125.9m)まで家庭系ごみが埋め立てられていた。
- ②二次対策工事で実施する遮水工の外側に家庭系ごみが帯水層(沖積層、砂質層)と接している。

※既往資料、土質調査結果等に基づく想定地質であるため、実際とは異なる場合があります。

# 鉛直遮水工、側面遮水工の範囲

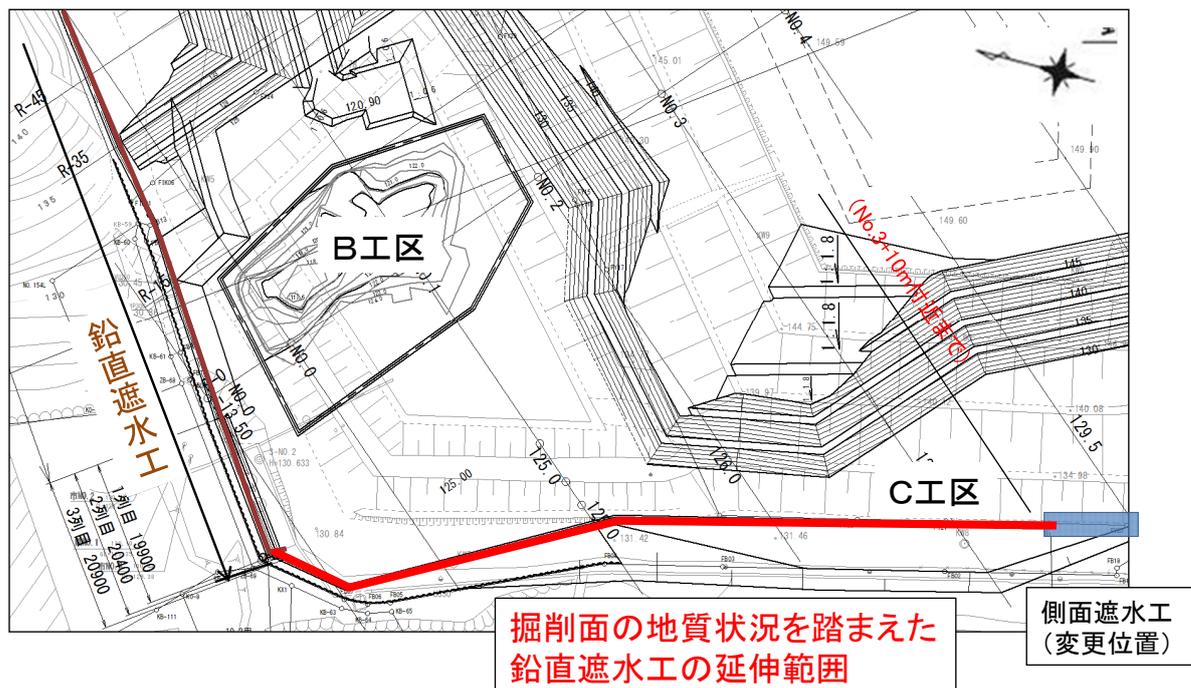

C工区付近概略平面図

10

## 現場を見学されるにあたって

### 服装

- ①防塵マスク
- ②ヘルメット
- ③軍手
- ④長靴等

### 移動手段

バスをご利用ください



### 注意事項

見学箇所は掘削法面に隣接しており、足元も悪いため**危険**です。指示に従い安全に行動していただきますようご協力お願いします。

11
