

《旧RD最終処分場二次対策工事 [工事情報 第282号](#) をお知らせいたします》


作成日：令和元年7月29日

工種・作業内容	日付	施工実績							施工予定											備考				
		令和元年7月							令和元年8月															
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木		金	土	日	
① 有害物掘削工	I区画 掘削			掘削																			場内整備・各種養生	休
	E区画 全旋回置換	全旋回掘削(一般部)資機材搬出							残置支障物撤去															
	F、G区画 埋戻 支保工解体	支保工解体 埋戻							支保工解体 埋戻															
	埋戻 支保工解体	四段目							三段目															
	選別土仮置・盛土工	D・E工区盛土							D・E工区盛土															
② 選別土仮置・盛土工	選別土仮置・埋戻し D・E工区盛土	D・E工区盛土							D・E工区盛土											工				
③ 選別処理工	一次選別(粗選別) 二次選別(機械選別)	粗選別 運転							粗選別 運転															
④ 底面・側面遮水工	D・E工区	底面遮水工							底面遮水工															
⑤ 洪水調整設備工	B工区	調整池堤体盛土							調整池堤体盛土															

【工事施工予定位置図】

【工事施工状況写真】

撮影日：令和元年7月25日

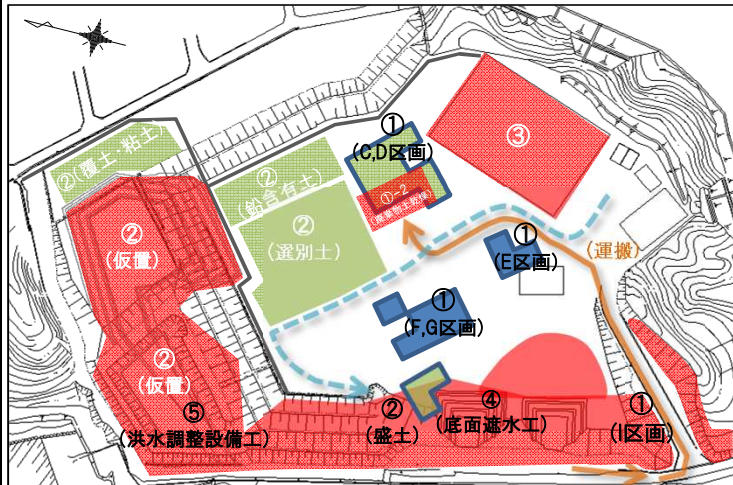

① 有害物掘削工
I区画の廃棄物土掘削を行っています。



① 有害物掘削工
FG区画の四段目支保工撤去を行っています。



④ 底面・側面遮水工
D・E工区底面遮水工を行っています。

【お知らせ】

・お盆期間中は、8/10(土)から18(日)まで休工します。

・第30回旧RD最終処分場問題連絡協議会を下記のとおり開催します。

日時：令和元年9月13日(金) 19時00分～

場所：栗東市コミュニティセンター治田東


《騒音・振動・粉じん・臭気自動計測の週間結果報告》

(報告対象期間:7月19日～7月25日)

【概要】

二次対策工事による周辺環境への影響を調査するために、旧RD最終処分場と隣接する住宅地との境界に計測器を設置し、「騒音・振動・粉じん・臭気」を連続自動計測しています。
各項目の1週間分の計測結果をグラフにしました。
※網掛け部は休工の時間帯(休日および夜間)です。

【位置図】

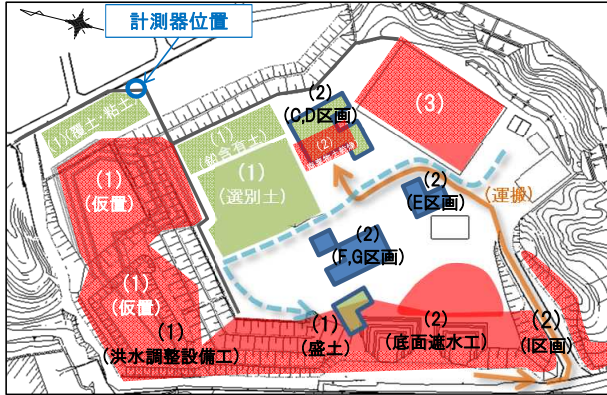

【測定値管理基準】

	騒音	振動	粉じん	臭気
第1管理値 (基準値の90%)	76dB	67dB	0.18mg/m ³	10(センサー値)
第2管理値 (基準値)	85dB	75dB	0.2mg/m ³	10
基準値	85dB 栗東市の特定建設作業(騒音)に係る規制基準	75dB 栗東市の特定建設作業(振動)に係る規制基準	0.2mg/m ³ 環境省「大気汚染に係る環境基準」の「環境上の条件・浮遊粒子状物質」記載基準	10(硫化水素臭などの異臭) 草津市「臭気指数規制基準 第1種地域 敷地境界線(第1号)」記載基準

第1管理値を超過した場合

騒音 振動 粉じん	作業を一旦中断し注意喚起した後、警戒しつつ作業を行います
臭気	作業を一旦中断し、現場の監督員が直接臭いを確認します


第2管理値を超過した場合

騒音 振動 粉じん	直ちに作業を中断し、周辺7自治会長に連絡し原因究明後、対策を講じ作業を再開します
臭気	臭いの確認により硫化水素臭などの異臭がした場合には、直ちに作業を中断し、周辺7自治会長に連絡し対策を講じたうえで作業を再開します

主な実施作業内容	令和元年7月							備考
	19 金	20 土	21 日	22 月	23 火	24 水	25 木	
廃棄物土・有害物掘削工			休 工					
(1)選別土仮置・盛土工 D・E工区埋戻					DE工区盛土			
廃棄物土・有害物掘削工								
(2)廃棄物土掘削工 D・E工区 E区画	E区画			E区画		I区画		
廃棄物選別工								
(3)選別処理施設工	運転			粗選別	運転			


【騒音】

(特になし)

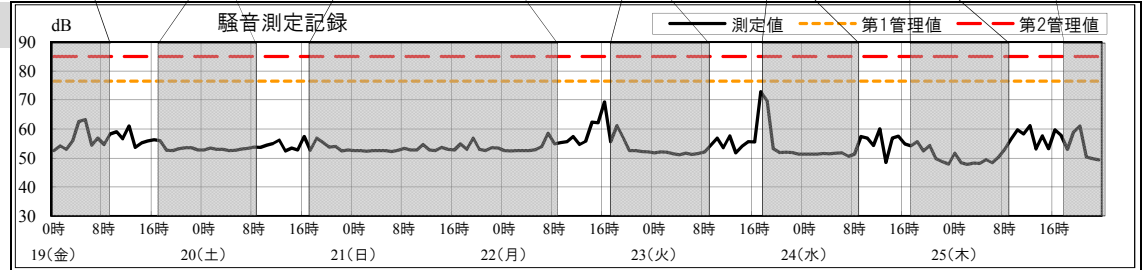


【振動】

(特になし)

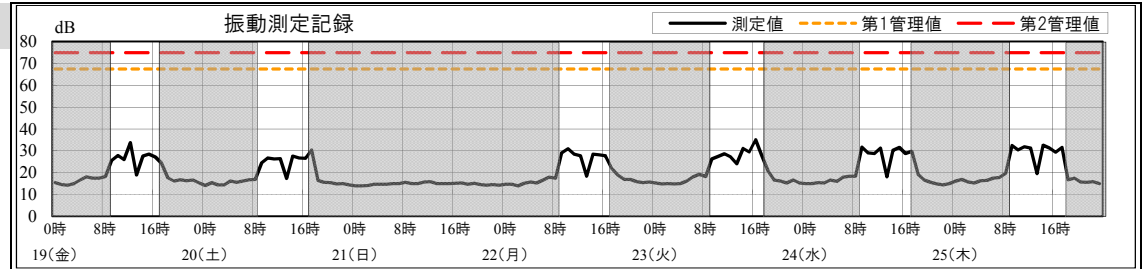

【粉じん】

(特になし)

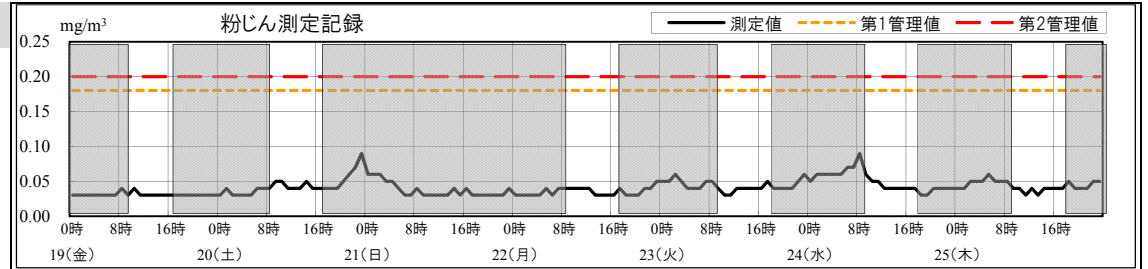

【臭気】

(特になし)

