


《旧RD最終処分場二次対策工事 工事情報 第306号 をお知らせいたします》

作成日：令和2年1月14日

工種・作業内容	日付	施工実績										施工予定										備考	
		令和2年1月										令和2年1月											
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土		日
		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
廃棄物土・有害物掘削工																							
① 有害物掘削工	I区画 アンカー撤去																						鋼矢板の引き抜きは、令和2年2月から実施予定です。
② 選別土仮置・盛土工	D・E工区盛土 A～E工区法面整形																						
廃棄物選別工																							
③ 選別処理工	選別建屋撤去																						選別建屋撤去は、令和2年2月から実施予定です。
汚染地下水拡散防止対策工																							
④ キャッピング工	覆土受入 DE工区法面覆土整形																						
⑤ 雨水排水工																							

【工事施工予定位置図】

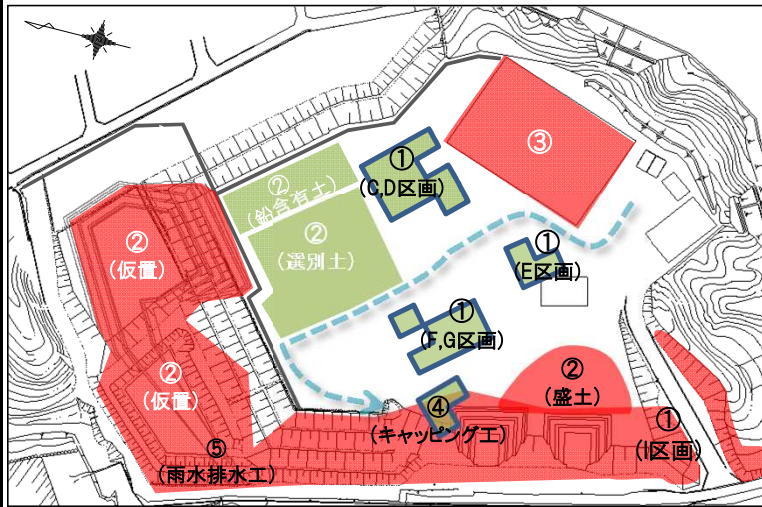

【工事施工状況写真】

撮影日：令和2年1月9日



② 選別土仮置・盛土工
DE工区の盛土を行っています。



④ キャッピング工
覆土の受け入れを行っています。



⑤ 雨水排水工
側溝の掘付を行っています。

【お知らせ】

・第32回旧RD最終処分場問題連絡協議会を下記のとおり開催します。

日時：令和2年2月13日(木) 19時00分～
場所：栗東市コミュニティセンター治田東

・自動計測(騒音、振動、粉じん、臭気)の中止について

北尾団地側に設置しております自動計測器につきまして、北尾団地側の整備に伴い、配線等が支障となるため、計測を中止し、撤去いたします。
撤去時期が1/17(金)予定であり、1/17以降の計測ができないため、工事情報の裏面の情報の掲載はありません。

《騒音・振動・粉じん・臭気自動計測の週間結果報告》


(報告対象期間:1月3日～1月9日)

【概要】

二次対策工事による周辺環境への影響を調査するために、IBRD最終処分場と隣接する住宅地との境界に計測器を設置し、「騒音・振動・粉じん・臭気」を連続自動計測しています。

各項目の1週間分の計測結果をグラフにしました。
※網掛け部は休工の時間帯(休日および夜間)です。

【位置図】

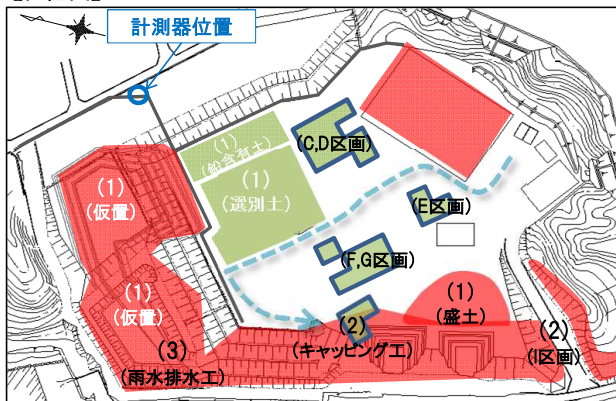

【測定値管理基準】

	騒音	振動	粉じん	臭気
第1管理値 (基準値の90%)	76dB	67dB	0.18mg/m ³	10(センサ-値)
第2管理値 (基準値)	85dB	75dB	0.2mg/m ³	10
基準値	85dB 栗東市の特定建設作業(騒音)に係る規制基準	75dB 栗東市の特定建設作業(振動)に係る規制基準	0.2mg/m ³ 環境省『大気汚染に係る環境基準』の「環境上の条件・浮遊粒子状物質」記載基準	10(硫化水素臭などの異臭) 草津市「臭気指数規制基準 第1種地域 敷地境界線(第1号)」記載基準

第1管理値を超過した場合

騒音 振動 粉じん	作業を一旦中断し注意喚起した後、警戒しつつ作業を行います
臭気	作業を一旦中断し、現場の監督員が直接臭いを確認します


第2管理値を超過した場合

騒音 振動 粉じん	直ちに作業を中断し、周辺7自治会長に連絡し原因究明後、対策を講じ作業を再開します
臭気	臭いの確認により硫化水素臭などの異臭がした場合には、直ちに作業を中断し、周辺7自治会長に連絡し対策を講じたうえで作業を再開します

主な実施作業内容	令和2年1月							備考
	3 金	4 土	5 日	6 月	7 火	8 水	9 木	
廃棄物土・有害物掘削工								
(1)選別土仮置・盛土工				盛土				
汚染地下水拡散防止対策工		休						
(2)キャッピング工		工		覆土受入				
汚染地下水拡散防止対策工								
(3)雨水排水工				雨水排水工				


【騒音】

(特になし)

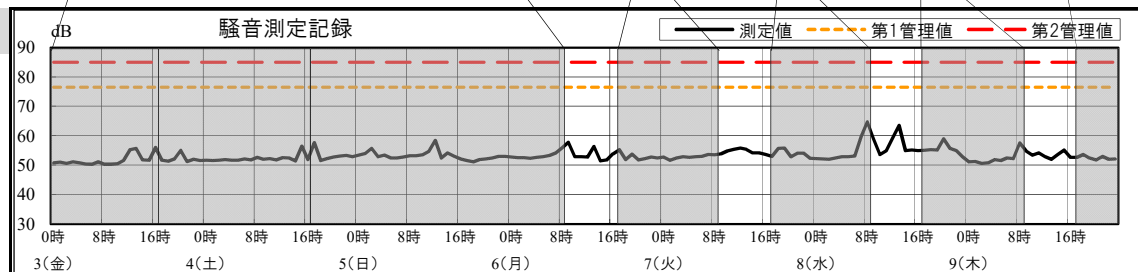


【振動】

(特になし)

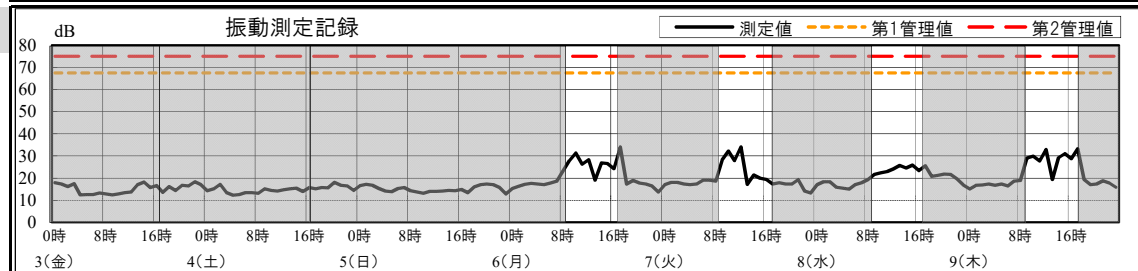

【粉じん】

(特になし)

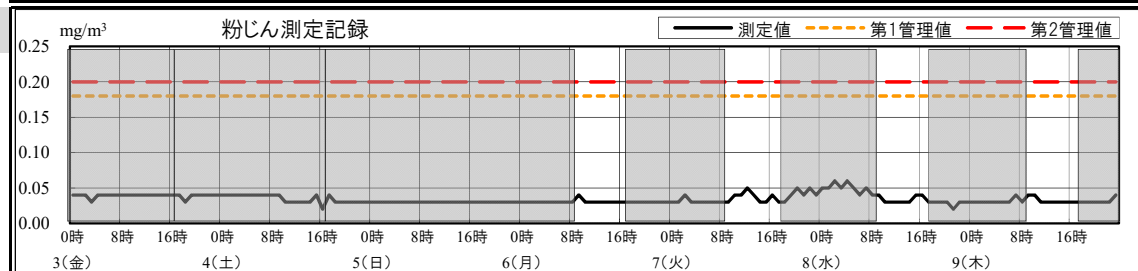

【臭気】

(特になし)

