


《旧RD最終処分場二次対策工事 工事情報 第312号 をお知らせいたします》

作成日：令和2年2月25日

日付	施工実績										施工予定										備考	
	令和2年2月										令和2年3月											
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土		日
工種・作業内容	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	1	2	3	4	5	6	7	8	
廃棄物土・有害物掘削工																						
① 有害物掘削工																						
I区画 鋼矢板引抜																						
② 選別土仮置・盛土工																						
E工区、I区画盛土 A~E工区法面整形																						
廃棄物選別工																						
③ 選別処理工																						
選別建屋撤去																						
汚染地下水拡散防止対策工																						
④ キャッピング工																						
覆土受入 ABCDE工区法面覆土整形																						
覆土搬入 BCDE工区法面覆土整形																						
ABC工区法面覆土整形																						
⑤ 雨水排水工																						
雨水排水工																						
雨水排水工																						

【工事施工予定位置図】

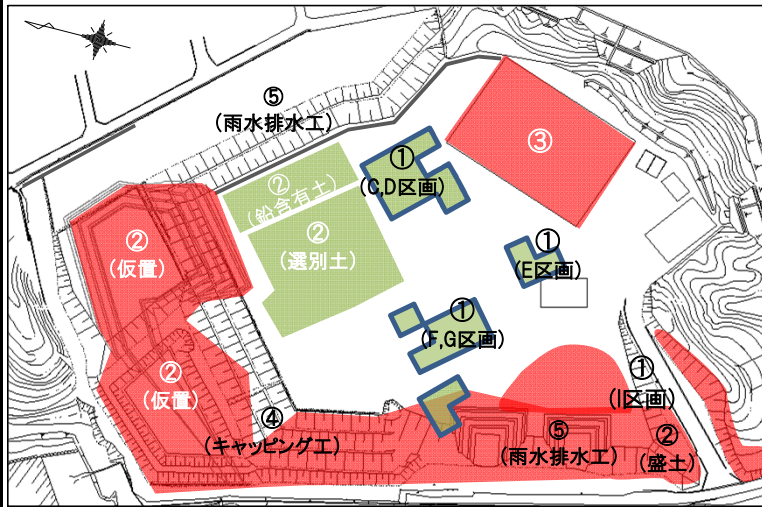

【工事施工状況写真】

撮影日：令和2年2月19日



③ 選別処理工
選別建屋の解体撤去を行っています。



④ キャッピング工
C工区法面覆土の整形を行っています。



⑤ 雨水排水工
DE工区2段目小段U字型側溝を設置しています。

【お知らせ】

◎御不明な点がございましたら、滋賀県最終処分場特別対策室(077-528-3670)までお問い合わせください。
◎裏面の騒音・振動・粉じん・臭気の計測結果は、自動計測器を撤去したため記載がありません。
