

《旧RD最終処分場二次対策工事 [工事情報 第317号](#) をお知らせいたします》


作成日：令和2年3月30日

日付	施工実績										施工予定										備考	
	令和2年3月										令和2年4月											
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土		日
工種・作業内容	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
廃棄物土・有害物掘削工																						
① 選別土仮置・盛土工	A~E工区法面整形 調整池法面整形		調整池整形																			
廃棄物選別工																						
② 選別処理工	選別建屋撤去		建屋仕切り矢板撤去 基礎コンクリート撤去																			
汚染地下水拡散防止対策工																						
③ 洪水調整設備工																						
④ キャッピング工	覆土受入 ABCDE工区法面覆土整形		機材搬入 セメント改良土工 キャブレション																			
⑤ 雨水排水工	BCDE工区法面覆土整形		覆土受入																			

【工事施工予定位置図】

【工事施工状況写真】

撮影日：令和2年3月25,26日

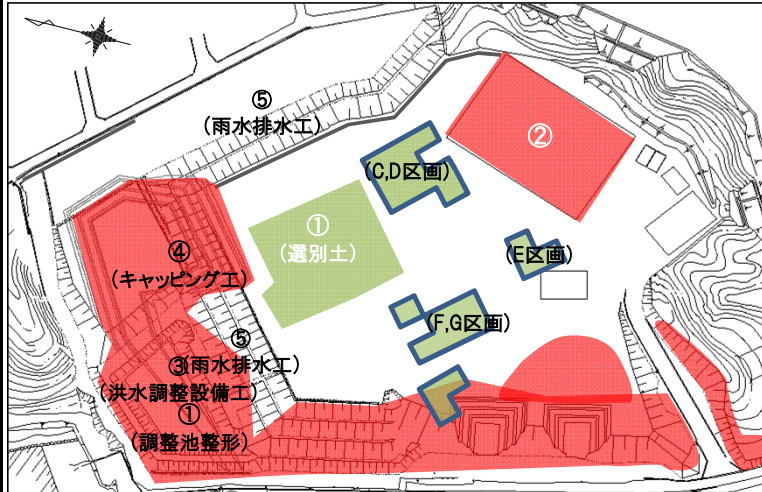

② 選別処理工

選別建屋基礎コンクリートの取壊し、仕切り矢板の撤去を行っています。



④ キャッピング工

B工区の法面覆土整形を行っています。



⑤ 雨水排水工

縦排水の張りコンクリートの打設をしています。

【お知らせ】

◎御不明な点がございましたら、滋賀県最終処分場特別対策室(077-528-3670)までお問い合わせください。
◎裏面の騒音・振動・粉じん・臭気の計測結果は、自動計測器を撤去したため記載がありません。
