


《旧RD最終処分場二次対策工事 [工事情報 第332号](#) をお知らせいたします》

作成日：令和2年7月20日

日付	工種・作業内容	施工実績							施工予定										備考				
		令和2年7月														8月							
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水		木	金	土	日
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	
	廃棄物土・有害物掘削工																						
	① 選別土仮置・盛土工 A～E工区法面整形 天端盛土整形																						
	汚染地下水拡散防止対策工																						
	② 洪水調整設備工 シート張り、張りコンクリート																						
	③ キャッピング工 覆土受入 水平部覆土整形 北尾団地側法面吹付工																						
		モルタル吹付							モルタル吹付														
	キャッピングシート設置								キャッピングシート設置														
	④ 雨水排水工								雨水排水工														
	浸透水処理施設工																						
	⑤ 浸透水処理施設工 浸透水導水排水設備																						

【工事施工予定位置図】

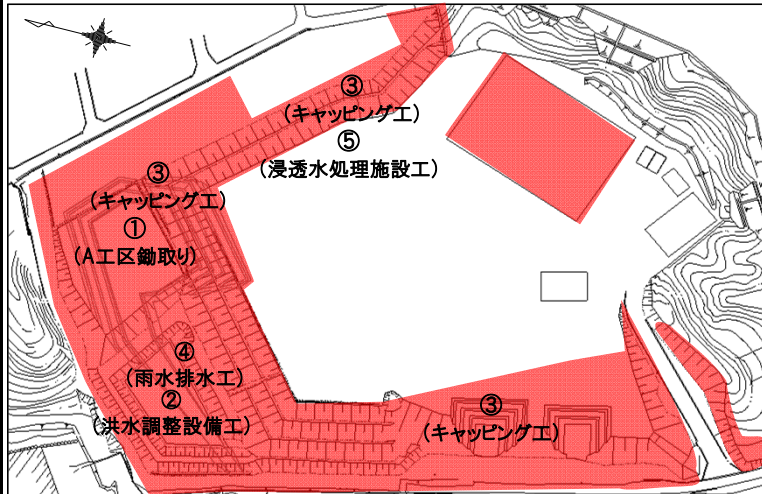

【工事施工状況写真】

撮影日：令和2年7月15、16日



③ キャッピング工
北尾団地側法面モルタル吹付を行っています。



③ キャッピング工
DE工区キャッピングシート設置状況です。



④ 雨水排水工
C工区U字型側溝を設置しています。

【お知らせ】

◎御不明な点がございましたら、滋賀県最終処分場特別対策室(077-528-3670)までお問い合わせください。
◎裏面の騒音・振動・粉じん・臭気の計測結果は、自動計測器を撤去したため記載がありません。
