


《旧RD最終処分場二次対策工事 工事情報 第35号 をお知らせいたします》

作成日：平成26年10月10日

| 日付<br>工種・作業内容 |  | 施工実績                                   |        |                                      |        |         |                                            |         |              |         |                                    | 施工予定    |                                            |              |         |         |                                    |         |                                            |         |         |         |  |  |  |  |  | 備考 |
|---------------|--|----------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|---------|--------------------------------------------|---------|--------------|---------|------------------------------------|---------|--------------------------------------------|--------------|---------|---------|------------------------------------|---------|--------------------------------------------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|----|
|               |  | 平成26年10月                               |        |                                      |        |         |                                            |         |              |         |                                    |         |                                            |              |         |         |                                    |         |                                            |         |         |         |  |  |  |  |  |    |
|               |  | 月<br>6                                 | 火<br>7 | 水<br>8                               | 木<br>9 | 金<br>10 | 土<br>11                                    | 日<br>12 | 月<br>13      | 火<br>14 | 水<br>15                            | 木<br>16 | 金<br>17                                    | 土<br>18      | 日<br>19 | 月<br>20 | 火<br>21                            | 水<br>22 | 木<br>23                                    | 金<br>24 | 土<br>25 | 日<br>26 |  |  |  |  |  |    |
| 廃棄物選別工        |  |                                        |        |                                      |        |         | 休<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>工 |         |              |         |                                    |         | 休<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>工 |              |         |         |                                    |         | 休<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>工 |         |         |         |  |  |  |  |  |    |
| ①選別処理施設工      |  | 基礎工                                    |        | H鋼打設、掘削・矢板設置                         |        |         |                                            |         | H鋼打設、掘削・矢板設置 |         |                                    |         |                                            | H鋼打設、掘削・矢板設置 |         |         |                                    |         |                                            |         |         |         |  |  |  |  |  |    |
|               |  |                                        |        |                                      |        |         |                                            |         |              |         |                                    |         |                                            |              |         |         |                                    |         |                                            |         |         |         |  |  |  |  |  |    |
| 汚染地下水拡散防止対策工  |  |                                        |        |                                      |        |         |                                            |         |              |         |                                    |         |                                            |              |         |         |                                    |         |                                            |         |         |         |  |  |  |  |  |    |
| ②底面遮水工        |  | 事前調査ホ <sup>*</sup> -リング <sup>*</sup> 工 |        | D・E工区                                |        |         |                                            |         |              |         | D・E工区                              |         |                                            | B工区          |         |         | B工区                                |         |                                            |         |         |         |  |  |  |  |  |    |
|               |  |                                        |        | 調査ホ <sup>*</sup> -リング <sup>*</sup>   |        |         |                                            |         |              |         | 調査ホ <sup>*</sup> -リング <sup>*</sup> |         |                                            |              |         |         | 調査ホ <sup>*</sup> -リング <sup>*</sup> |         |                                            |         |         |         |  |  |  |  |  |    |
| ③鉛直遮水壁工       |  | TRD工法                                  |        | 試料採取ホ <sup>*</sup> -リング <sup>*</sup> |        |         |                                            |         |              |         |                                    |         |                                            |              |         |         | 施工ヤード造成                            |         |                                            |         |         |         |  |  |  |  |  |    |
|               |  |                                        |        |                                      |        |         |                                            |         |              |         |                                    |         |                                            |              |         |         |                                    |         |                                            |         |         |         |  |  |  |  |  |    |
| ④仮設備工         |  | 工事用道路                                  |        | 工事用道路造成                              |        |         |                                            |         |              |         |                                    |         |                                            |              |         |         | 広場フェンス撤去 遊具移動                      |         |                                            |         |         |         |  |  |  |  |  |    |
|               |  |                                        |        |                                      |        |         |                                            |         |              |         |                                    |         |                                            |              |         |         |                                    |         |                                            |         |         |         |  |  |  |  |  |    |
| 浸透水処理施設工      |  |                                        |        |                                      |        |         |                                            |         |              |         |                                    |         |                                            |              |         |         |                                    |         |                                            |         |         |         |  |  |  |  |  |    |
| ⑤仮設濁水処理施設設置工  |  |                                        |        |                                      |        |         |                                            |         |              |         |                                    |         |                                            |              |         |         |                                    |         |                                            |         |         |         |  |  |  |  |  |    |

【工事施工予定位置図】

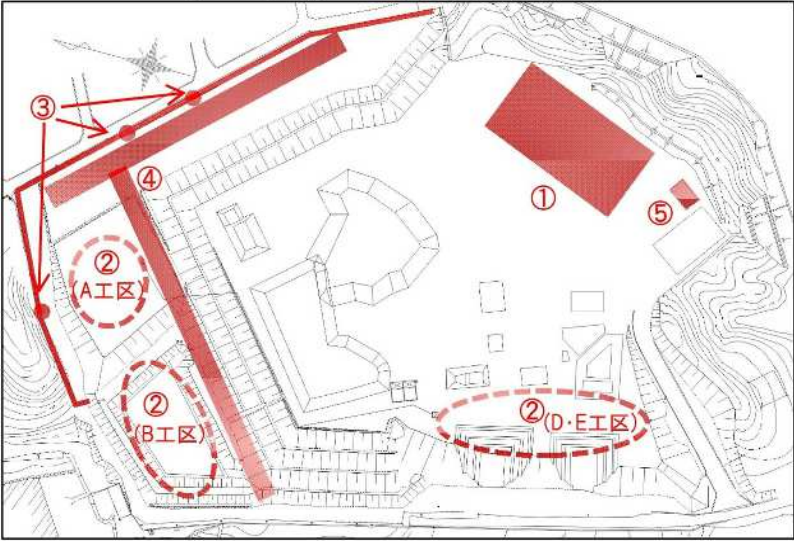

【工事施工状況写真】

撮影日：平成26年10月9日



①選別処理施設工

選別施設内の仕切りとなるH鋼を打設しています。



①選別処理施設工

掘削後矢板にて仕切りを設けます。



②底面遮水工

調査ボーリングを行っています。

【お知らせ】


# 《騒音・振動・粉じん・臭気自動計測の週間結果報告》

(報告対象期間:10月3日～10月9日)

## 【概要】

二次対策工事による周辺環境への影響を調査するために、旧RD最終処分場と隣接する住宅地との境界に計測器を設置し、「騒音・振動・粉じん・臭気」を連続自動計測しています。  
各項目の1週間分の計測結果をグラフにしました。  
※網掛け部は休工の時間帯(休日および夜間)です。

## 【位置図】

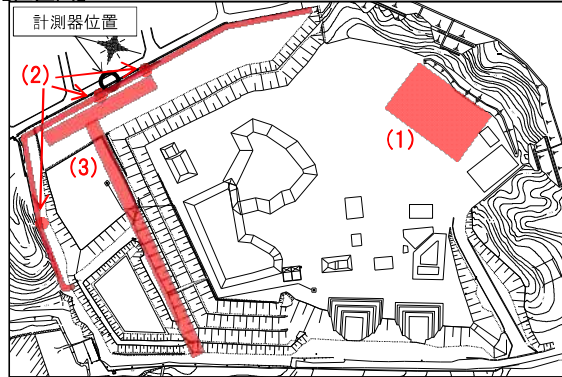

## 【測定値管理基準】

|       | 騒音                            | 振動                            | 粉じん                                                           | 臭気                                                   |
|-------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 第1管理値 | 基準値の90%                       | 基準値の90%                       | 基準値の90%                                                       | 10(センサー値)                                            |
| 第2管理値 | 基準値                           | 基準値                           | 基準値                                                           | 参考値                                                  |
| 基準値   | 85dB<br>栗東市の特定建設作業(騒音)に係る規制基準 | 75dB<br>栗東市の特定建設作業(振動)に係る規制基準 | 0.2mg/m <sup>3</sup><br>環境省『大気汚染に係る環境基準』の「環境上の条件・浮遊粒子状物質」記載基準 | 10(硫化水素臭などの異臭)<br>草津市「臭気指数規制基準 第1種地域 敷地境界線(第1号)」記載基準 |

## 第1管理値を超過した場合

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| 騒音<br>振動<br>粉じん | 作業を一旦中断し注意喚起した後、警戒しつつ作業を行います |
| 臭気              | 作業を一旦中断し、現場の監督員が直接臭いを確認します   |


## 第2管理値を超過した場合

|                 |                                                                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| 騒音<br>振動<br>粉じん | 直ちに作業を中断し、周辺7自治会長に連絡し原因究明後、対策を講じ作業を再開します                         |
| 臭気              | 臭いの確認により硫化水素臭などの異臭がした場合には、直ちに作業を中断し、周辺7自治会長に連絡し対策を講じたうえで作業を再開します |

| 主な実施作業内容     |       | 平成26年10月  |     |     |      |           |     | 備考  |
|--------------|-------|-----------|-----|-----|------|-----------|-----|-----|
|              |       | 3 金       | 4 土 | 5 日 | 6 月  | 7 火       | 8 水 | 9 木 |
| 廃棄物選別工       |       |           |     |     |      |           |     |     |
| (1)選別処理施設工   | 基礎工   | H鋼打設      |     |     | H鋼打設 |           |     |     |
| 汚染地下水拡散防止対策工 |       |           |     |     |      |           |     |     |
| (2)鉛直遮水壁工    | TRD工法 | 試料採取ボーリング |     |     |      | 試料採取ボーリング |     |     |
| 汚染地下水拡散防止対策工 |       |           |     |     |      |           |     |     |
| (3)仮設備工      | 工事用道路 | 工事用道路造成   |     |     |      | 工事用道路     |     |     |


## 【騒音】

9日について、計測値の表示板の周囲で防音シートの撤去を行った際の音が影響したものと考えます。

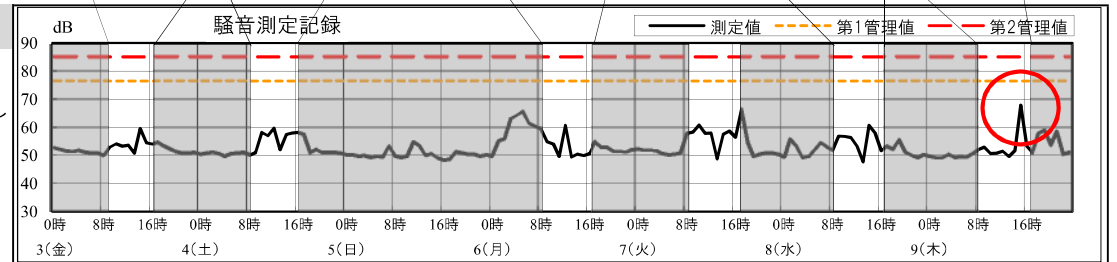


## 【振動】

(特になし)

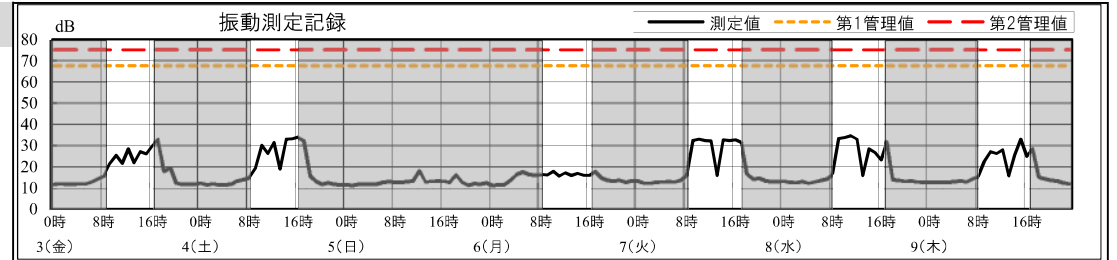

## 【粉じん】

(特になし)

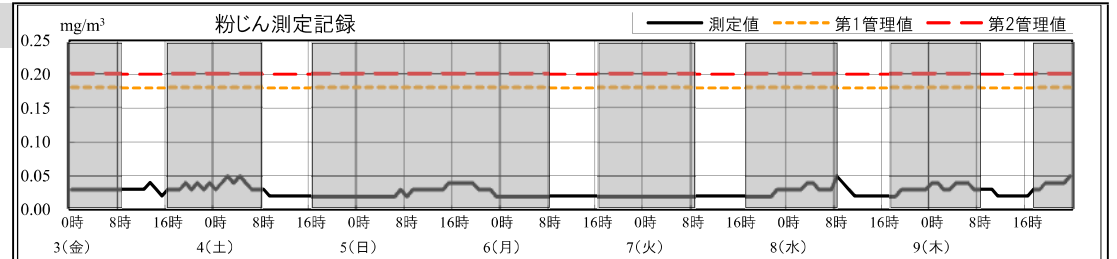

## 【臭気】

(特になし)

