

# 《旧RD最終処分場二次対策工事 工事情報 第106号 をお知らせいたします》

作成日：平成28年2月29日

| 日付          | 施工実績       |    |    |    |    |    |    |    | 施工予定      |   |   |   |   |   |   |   | 備考     |    |    |    |    |  |
|-------------|------------|----|----|----|----|----|----|----|-----------|---|---|---|---|---|---|---|--------|----|----|----|----|--|
|             | 平成28年2月    |    |    |    |    |    |    |    | 平成28年3月   |   |   |   |   |   |   |   |        |    |    |    |    |  |
|             | 月          | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 日  | 月  | 火         | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |   |   |        |    |    |    |    |  |
| 工種・作業内容     | 22         | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1         | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9      | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| 廃棄物土・有害物掘削工 |            |    |    |    |    |    |    |    |           |   |   |   |   |   |   |   |        |    |    |    |    |  |
| ① 廃棄物土掘削工   | A工区掘削      |    |    |    |    |    |    |    | 掘削        |   |   |   |   |   |   |   | 休<br>工 |    |    |    |    |  |
| ② 廃棄物土掘削工   | 仮沈砂池準備     |    |    |    |    |    |    |    | 仮沈砂池の掘削準備 |   |   |   |   |   |   |   |        |    |    |    |    |  |
| ③ 廃棄物土掘削工   | 沈砂池堰堤掘削準備  |    |    |    |    |    |    |    | 試料採取      |   |   |   |   |   |   |   |        |    |    |    |    |  |
| ④ 選別土仮置・盛土工 | 選別土移動      |    |    |    |    |    |    |    | 選別土仮置き    |   |   |   |   |   |   |   |        |    |    |    |    |  |
| 廃棄物選別工      |            |    |    |    |    |    |    |    |           |   |   |   |   |   |   |   |        |    |    |    |    |  |
| ⑤ 選別処理工     | 一次選別(粗選別)  |    |    |    |    |    |    |    | 廃棄物土粗選別   |   |   |   |   |   |   |   | 休<br>工 |    |    |    |    |  |
|             | 二次選別(機械選別) |    |    |    |    |    |    |    | 選別土粗選別    |   |   |   |   |   |   |   |        |    |    |    |    |  |
|             | 運転         |    |    |    |    |    |    |    | 運転        |   |   |   |   |   |   |   |        |    |    |    |    |  |

仮沈砂池はC工区近辺に設置予定です。  
※点線は施工期間が未確定です。

## 【工事施工予定位置図】



## 【工事施工状況写真】

撮影日：平成28年2月26日



① 廃棄物土掘削工

A工区の廃棄物土の掘削を行っています。



③ 廃棄物土掘削工

沈砂池堰堤部を掘削する前に、B工区の試掘を行っています。



⑤ 選別処理工

100~120mm物の選別を重機、人力併用で行っています。

## 【お知らせ】


# 《騒音・振動・粉じん・臭気自動計測の週間結果報告》

(報告対象期間:2月19日～2月25日)

## 【概要】

二次対策工事による周辺環境への影響を調査するために、IBRD最終処分場と隣接する住宅地との境界に計測器を設置し、「騒音・振動・粉じん・臭気」を連続自動計測しています。  
各項目の1週間分の計測結果をグラフにしました。  
※網掛け部は休工の時間帯(休日および夜間)です。

## 【位置図】

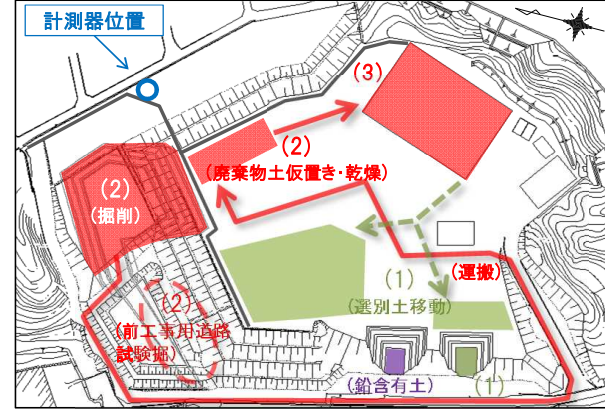

## 【測定値管理基準】

|                    | 騒音                            | 振動                            | 粉じん   | 臭気   |
|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|--|
| 第1管理値<br>(基準値の90%) | 76dB                          | 67dB                          | 0.18mg/m <sup>3</sup>   | 10(センサ-値)  |
| 第2管理値<br>(基準値)     | 85dB                          | 75dB                          | 0.2mg/m <sup>3</sup>  | 10   |
| 基準値                | 85dB<br>栗東市の特定建設作業(騒音)に係る規制基準 | 75dB<br>栗東市の特定建設作業(振動)に係る規制基準 | 0.2mg/m <sup>3</sup><br>環境省『大気汚染に係る環境基準』の「環境上の条件・浮遊粒子状物質」記載基準 | 10(硫化水素臭などの臭気)<br>草津市「臭気指数規制基準 第1種地域 敷地境界線(第1号)」記載基準 |

## 第1管理値を超過した場合

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| 騒音<br>振動<br>粉じん | 作業を一旦中断し注意喚起した後、警戒しつつ作業を行います |
| 臭気              | 作業を一旦中断し、現場の監督員が直接臭いを確認します   |


## 第2管理値を超過した場合

|                 |  |
|-----------------|--|
| 騒音<br>振動<br>粉じん | 直ちに作業を中断し、周辺7自治会長に連絡し原因究明後、対策を講じ作業を再開します                         |
| 臭気              | 臭いの確認により硫化水素臭などの異臭がした場合には、直ちに作業を中断し、周辺7自治会長に連絡し対策を講じたうえで作業を再開します |

| 主な実施作業内容     |       | 平成28年2月 |      |        |       |      |      | 備考 |
|--------------|-------|---------|------|--------|-------|------|------|----|
|              |       | 19 金    | 20 土 | 21 日   | 22 月  | 23 火 | 24 水 |    |
| 廃棄物土・有害物掘削工  |       |         |      | 休<br>工 |       |      |      |    |
| (1)選別土仮置・盛土工 | 選別土仮置 | 選別土仮置   |      |        | 選別土仮置 |      |      |    |
| 廃棄物土・有害物掘削工  |       |         |      |        |       |      |      |    |
| (2)廃棄物土掘削工   | A工区掘削 | 掘削      |      |        | 掘削    |      |      |    |
| 廃棄物選別工       |       |         |      |        |       |      |      |    |
| (3)選別処理施設工   |       |         | 運転   |        |       | 運転   |      |    |


## 【騒音】

(特になし)

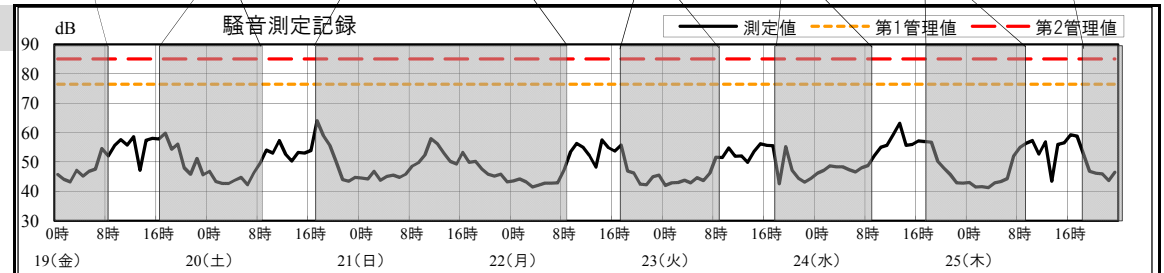


## 【振動】

(特になし)

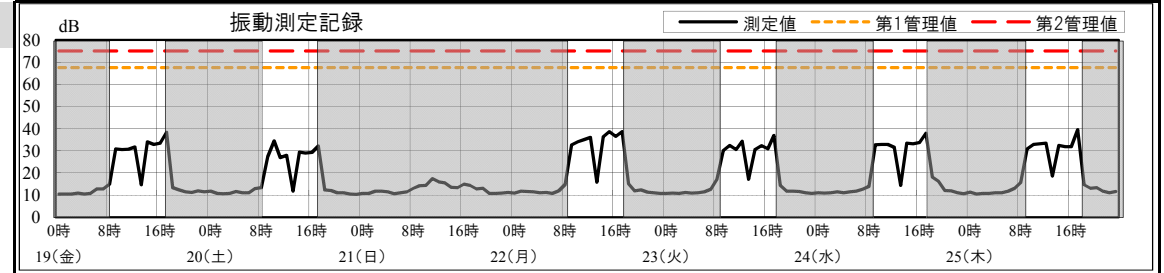

## 【粉じん】

(特になし)

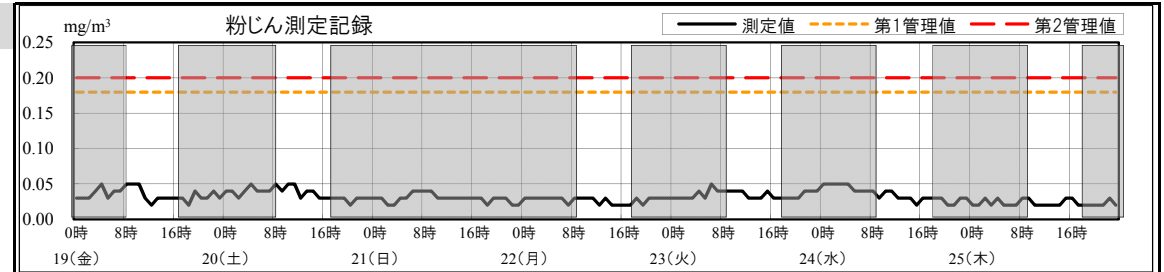

## 【臭気】

(特になし)

