


《旧RD最終処分場二次対策工事 工事情報 第195号 をお知らせいたします》

作成日：平成29年11月20日

日付	施工実績								施工予定												備考
	平成29年11月																平成29年12月				
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	
工種・作業内容	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3
廃棄物土・有害物掘削工																					
① 廃棄物土掘削工	①-1 C・D・E工区		C・D・E工区掘削						C・D・E工区掘削						C・D・E工区掘削						
	①-2 廃棄物土乾燥		廃棄物土乾燥						廃棄物土乾燥						廃棄物土乾燥						
② 有害物掘削工	H区画 H-2		機材搬出																		
③ 選別土仮置・盛土工	選別土仮置・埋戻し		B工区埋戻し						B工区埋戻し						B工区埋戻し						
④ 仮設備工	構造物撤去工 既設杭撤去		掘削→杭切断						掘削→杭切断						掘削→杭切断						
廃棄物選別工																					
⑤ 選別処理工	一次選別(粗選別) 二次選別(機械選別)		廃棄物土粗選別						廃棄物土粗選別						廃棄物土粗選別						
			運転						運転						運転						
汚染地下水拡散防止対策工																					
⑥ 底面排水工	C工区 プレスト管φ800		排水管設置																		
⑦ 浸透水貯留層工	B工区 再生材敷均		再生材敷均						再生材敷均						再生材敷均						

【工事施工予定位置図】

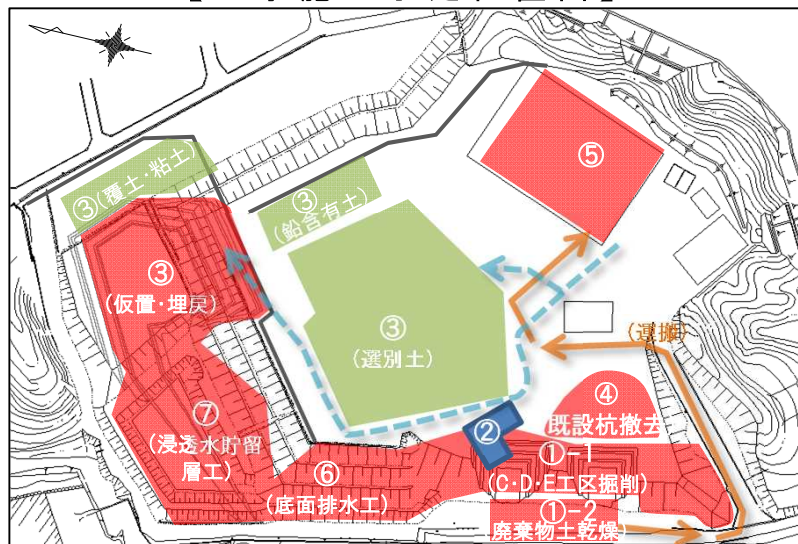

【工事施工状況写真】

撮影日：平成29年11月16日



①-1 C・D・E工区掘削
E工区を掘削しています。



⑥ 底面排水工
底面排水管を設置しています。



⑦ 浸透水貯留層工
浸透水貯留層の砕石でのフィルター材敷設が終了したところです。

【お知らせ】

・第22回旧RD最終処分場問題連絡協議会を下記のとおり開催します。
日時：平成29年11月24日(金) 19時00分～ 場所：栗東市コミュニティセンター 治田東

《騒音・振動・粉じん・臭気自動計測の週間結果報告》


(報告対象期間:11月10日～11月16日)

【概要】

二次対策工事による周辺環境への影響を調査するために、旧RD最終処分場と隣接する住宅地との境界に計測器を設置し、「騒音・振動・粉じん・臭気」を連続自動計測しています。
各項目の1週間分の計測結果をグラフにしました。
※網掛け部は休工の時間帯(休日および夜間)です。


主な実施作業内容	平成29年11月							備考
	10 金	11 土	12 日	13 月	14 火	15 水	16 木	
廃棄物土・有害物掘削工								
(1)選別土仮置・盛土工	A工区仮置 B工区埋戻							B工区埋戻し
廃棄物土・有害物掘削工								
(2)廃棄物土掘削工	C・D・E工区、H区画掘削							掘削
廃棄物選別工								
(3)選別処理施設工								運転

【位置図】

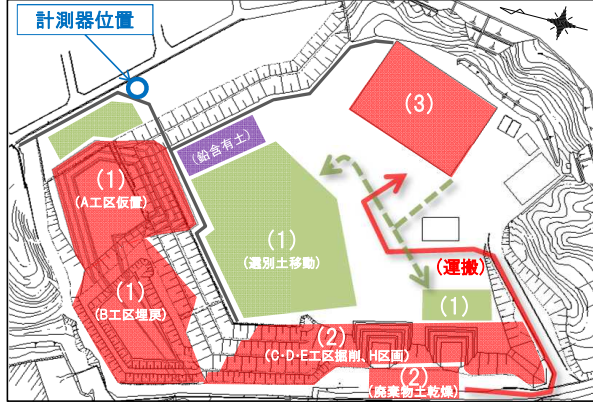


【騒音】

(特になし)

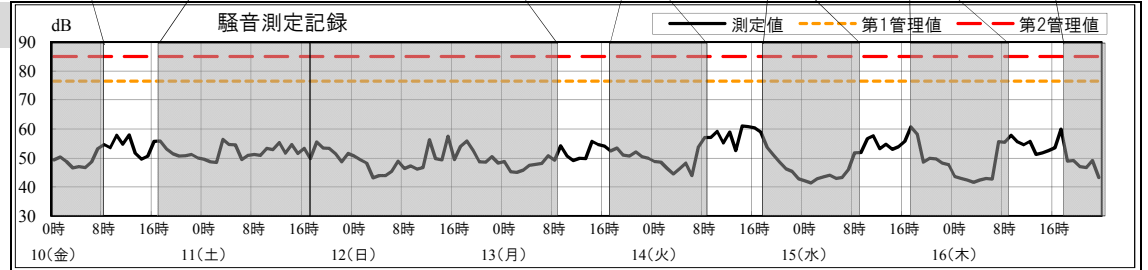

【振動】

(特になし)

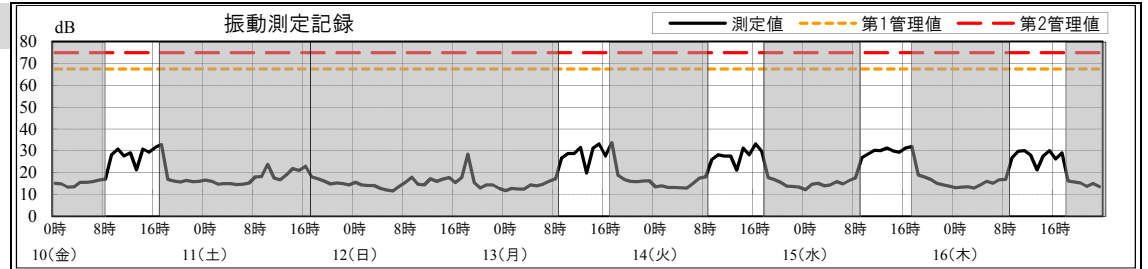


【測定値管理基準】

	騒音	振動	粉じん	臭気
第1管理値 (基準値の90%)	76dB	67dB	0.18mg/m ³	10(センサー値)
第2管理値 (基準値)	85dB	75dB	0.2mg/m ³	10
基準値	85dB 栗東市の特定建設作業(騒音)に係る規制基準	75dB 栗東市の特定建設作業(振動)に係る規制基準	0.2mg/m ³ 環境省「大気汚染に係る環境基準」の「環境上の条件・浮遊粒子状物質」記載基準	10(硫化水素臭などの異臭) 草津市「臭気指数規制基準 第1種地域 敷地境界線(第1号)」記載基準

【粉じん】

(特になし)

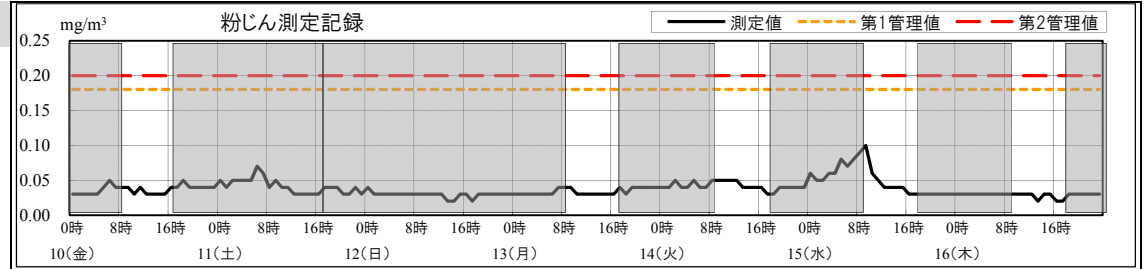


第1管理値を超過した場合

騒音 振動 粉じん	作業を一旦中断し注意喚起した後、警戒しつつ作業を行います
臭気	作業を一旦中断し、現場の監督員が直接臭いを確認します

【臭気】

(特になし)

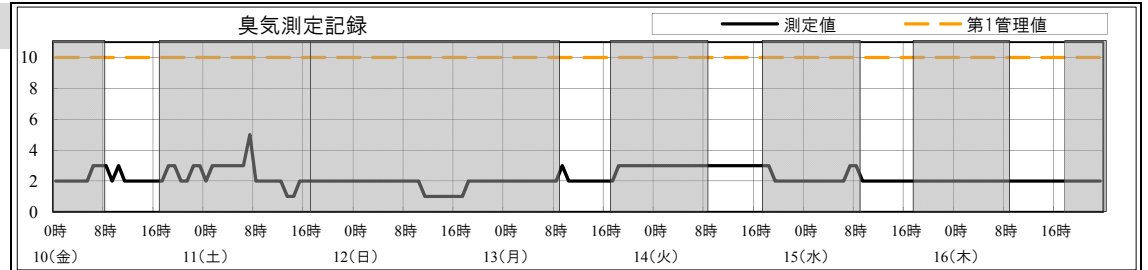

第2管理値を超過した場合

騒音 振動 粉じん	直ちに作業を中断し、周辺7自治会長に連絡し原因究明後、対策を講じ作業を再開します
臭気	臭いの確認により硫化水素臭などの異臭がした場合には、直ちに作業を中断し、周辺7自治会長に連絡し対策を講じたうえで作業を再開します
