《旧RD最終処分場二次対策工事　工事情報 第286号　をお知らせいたします》

作成日：令和元年8月26日

工種・作業内容		施工実績 令和元年8月 19(月)	20(火)	21(水)	22(木)	23(金)	24(土)	25(日)	施工予定 令和元年8月 26(月)	27(火)	28(水)	29(木)	30(金)	31(土)	令和元年9月 1(日)	2(月)	3(火)	4(水)	5(木)	6(金)	7(土)	8(日)	備考
廃棄物土・有害物掘削工																							
① 有害物掘削工	I区画　掘削 アンカー工		アンカー工			2段目掘削					アンカー工								3段目掘削				
	E区画 鋼矢板打設								鋼矢板接続、鋼矢板打設							鋼矢板打設							
	F、G区画 埋戻　支保工解体			埋戻		支保工解体 一段目					埋戻・整地					鋼矢板引抜							
② 選別土仮置・盛土工	選別土仮置・埋戻し D・E工区盛土	D・E工区埋戻し			D・E工区盛土				D・E工区盛土							D・E工区盛土							
廃棄物選別工																							
③ 選別処理工	一次選別(粗選別) 二次選別(機械選別)	運転				粗選別	運転		粗選別 運転							粗選別 運転							
汚染地下水拡散防止対策工																							
④ 底面・側面遮水工	D・E工区																						
⑤ 底面排水工	D・E工区 プレスト管φ800					排水管設置			排水管設置														

【工事施工予定位置図】

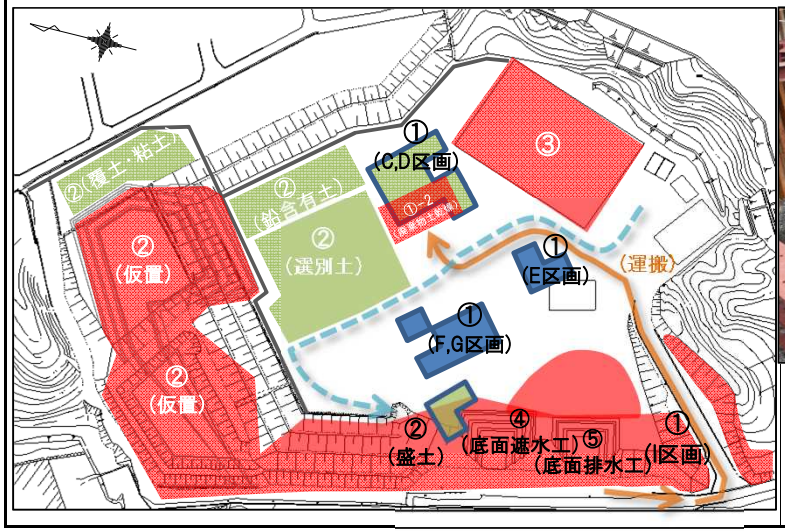

【工事施工状況写真】

撮影日：令和元年8月21日

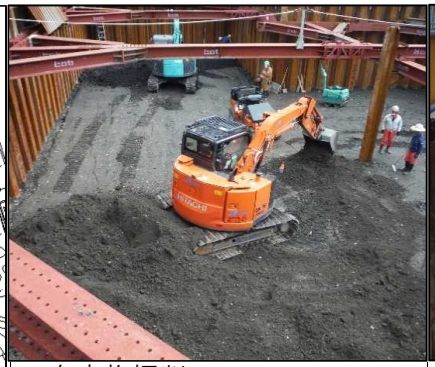

① 有害物掘削工

FG区画の埋戻しをしています。

① 有害物掘削工

I区画のアンカーを緊張しています。

② 選別土仮置・盛土工

D・E工区を埋め戻しています。

【お知らせ】

・第30回旧RD最終処分場問題連絡協議会を下記のとおり開催します。

日時：令和元年9月13日(金)　19時00分～

場所：栗東市コミュニティセンター治田東

◎御不明な点がございましたら、滋賀県最終処分場特別対策室(077-528-3670)までお問い合わせください。

《騒音・振動・粉じん・臭気自動計測の週間結果報告》

（報告対象期間：8月16日 ～ 8月22日）

【概要】

二次対策工事による周辺環境への影響を調査するために、旧RD最終処分場と隣接する住宅地との境界に計測器を設置し、「騒音・振動・粉じん・臭気」を連続自動計測しています。

各項目の1週間分の計測結果をグラフにしました。

※網掛け部は休工の時間帯(休日および夜間)です。

主な実施作業内容		令和元年8月 16 金	17 土	18 日	19 月	20 火	21 水	22 木	備考
廃棄物土・有害物掘削工									
(1)選別土仮置・盛土工	D・E工区埋戻				埋戻				
廃棄物土・有害物掘削工									
(2)廃棄物土掘削工	E工区 F・G・E・I区画				E工区掘削	FG区画埋戻			
廃棄物選別工									
(3)選別処理施設工					運転				

休工

【位置図】

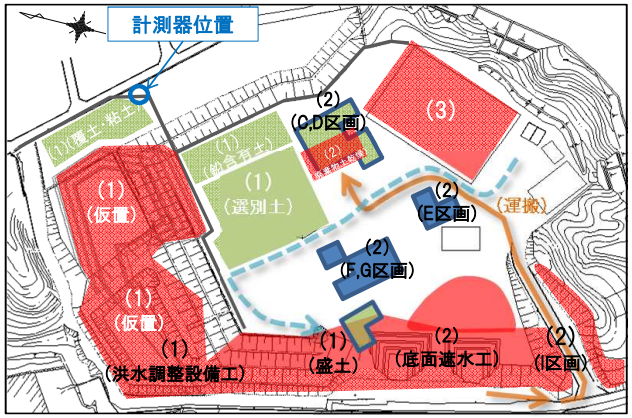

【測定値管理基準】

	騒 音	振 動	粉じん	臭 気
第1管理値（基準値の90%）	76dB	67dB	0.18mg/m3	10(センサー値)
第2管理値（基準値）	85dB	75dB	0.2mg/m3	10
基準値	85dB 栗東市の特定建設作業(騒音)に係る規制基準	75dB 栗東市の特定建設作業(振動)に係る規制基準	0.2mg/m^3 環境省『大気の汚染に係る環境基準』の「環境上の条件・浮遊粒子状物質」記載基準	10(硫化水素臭などの異臭) 草津市「臭気指数規制基準　第1種地域　敷地境界線(第1号)」記載基準

第1管理値を超過した場合

騒音 振動 粉じん	作業を一旦中断し注意喚起した後、警戒しつつ作業を行います
臭気	作業を一旦中断し、現場の監督員が直接臭いを確認します

第2管理値を超過した場合

騒音 振動 粉じん	直ちに作業を中断し、周辺7自治会長に連絡し原因究明後、対策を講じ作業を再開します
臭気	臭いの確認により硫化水素臭などの異臭がした場合には、直ちに作業を中断し、周辺7自治会長に連絡し対策を講じたうえで作業を再開します

【騒 音】

（特になし）

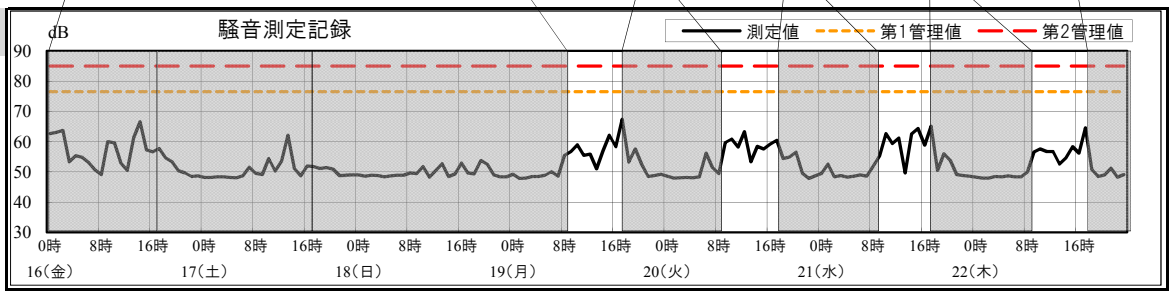

【振 動】

（特になし）

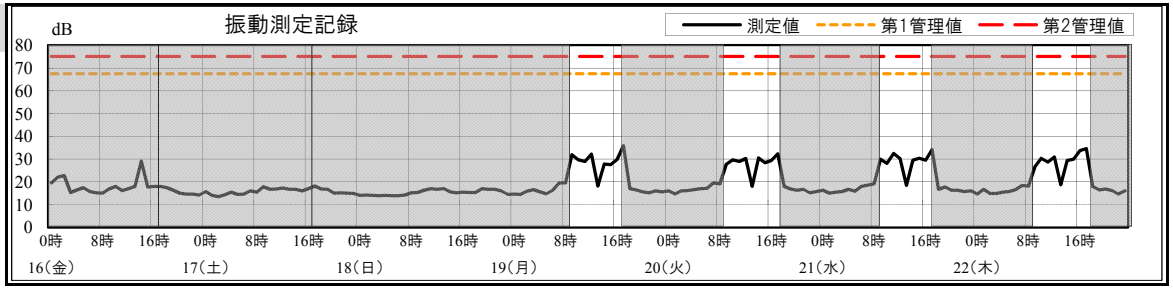

【粉じん】

（特になし）

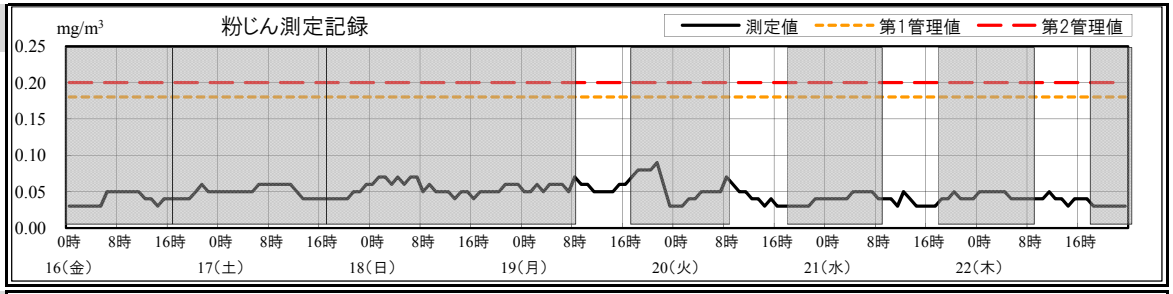

【臭 気】
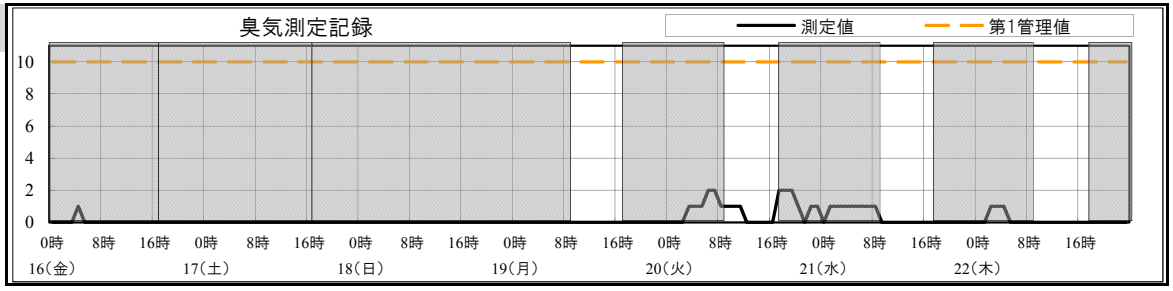
（特になし）
